

INFORME DE GESTIÓN

ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ZORAIDA ORTIZ GOMEZ

PRIMER TRIMESTRE 2016
Enero 01 - Marzo 31



INFORME DE GESTION

Durante el primer trimestre de 2016, la Secretaria de Infraestructura ha realizado revisión de cumplimiento en calidad de obra y continuó con la ejecución de obras civiles, en las áreas de inversión, conservación, y mantenimiento de su competencia, tales como: Obras Comunitarias, Obras Rurales, Urbanas, Parque y Zonas Verdes, Alumbrado Público y Mega Proyectos, los cuales tienen como fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el primer trimestre de 2016.


1. PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE

1.1. SUBPROGRAMA: ESCENARIOS PARA LA GENTE

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
29 de 2016	AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SALA 2016 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.020.601.988,44	19 de Abril de 2016	18 de Octubre de 2016

Estado: Avance de Obra: 30%

En cumplimiento a este contrato este despacho adelanto los trámites a la licencia de construcción, la adjudicación tanto de la obra y la interventoría, además de revisión de los diseños iniciales de la propuesta correspondientes a la parte eléctrica de video y sonido ajustándolo a los requerimientos tecnológicos que exige la FIFA.

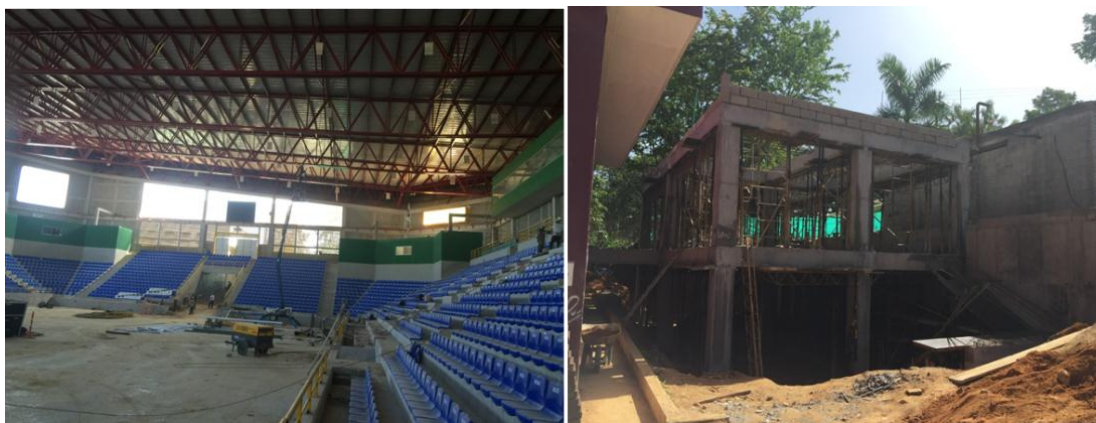

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
497 de 2015	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA	\$ 999.999.654	27 de Noviembre de 2015	26 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% -Liquidado

Canchas Sintéticas: Barrio Bucaramanga, se realizó tratamiento superficial con aplicación de arena para evitar emposamiento y Se ordenó repintar la estructura metálica del cerramiento del parque infantil.

En los Barrios, Granjas de Provenza Parte Alta, Hamacas y María Paz. las obras consistían en la aplicación de un acabado sintético al piso de las canchas y están concluidas a satisfacción.

Parques Infantiles Gimnasios: Barrió Antonia Santos, obra que incluyo la instalación de unos juegos infantiles y gimnasio metálico al aire libre. Obra concluida y recibida a satisfacción.

Barrió Santander. Parque infantil y muro de contención y mejoramiento del cerramiento existente. Se ordenó el repintado del cerramiento y el tensionamiento de la malla y puerta de acceso al parque.

Remodelación Cancha de Fútbol: Barrio Porvenir; Cerramiento: construcción nueva del cerramiento total de la cancha, se mejoró el tensionamiento del portón de acceso que por su peso podría presentar a futuro un riesgo de deformación, *Pisos:* restitución y nivelación de la arena de acabado en la cancha de fútbol.

Cunetas: se construyeron para el control de las aguas de escorrentía que deterioraban la cancha en época de invierno.

Barrió Tejar Norte. Cerramiento: Arreglo de puertas de acceso a la cancha.

Pisos: se fundieron piso en concreto de la cancha que inicialmente estaba en tierra. Se demolieron adicionalmente unas placas con fisuramiento estructural y fueron restituidas previos al recibo de obra.






Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
348 de 2015	REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.334.549.334,82	02 de septiembre de 2015	11 de marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% ejecutado- en proceso de liquidación.

Edificación de dos niveles con batería de baños para público, cabinas de transmisión, vestieres, remodelación de gradería, mejoramiento del sistema hidráulico y eléctrico.

Observaciones: durante el recibo de la obra se ordenó el mejoramiento de las ventilaciones de los baños públicos, con la apertura de vanos en los muros que dan a los corredores. Se aumentó el tamaño y numero de los orificios de captación de las tapas cunetas perimetrales de la pista. En el espacio destinado a la bodega se abrió también un vano para reventilación. Se mejoró el acceso al cuarto de máquinas. se marcaron dilataciones de los concretos nuevos con los existentes en las áreas de acceso por la rampa y graderías.



2. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

2.1. SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
158 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE PILOTES EN EL BARRIO RINCÓN DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.518.048.726,69	16 de Octubre de 2015	15 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Se construyeron tres muros de contención longitud 105 metros lineales. Convenio interadministrativo No. 228 de 2013 Municipio de Bucaramanga - Departamento de Prosperidad social-DPS



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
467 de 2015	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO.	\$ 800.000.000	06 de noviembre de 2015	06 de febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% ejecutado – En proceso de liquidación

La pantalla en concreto reforzado de 3000 psi de tensión activa con espesor de 25 centímetros tiene una altura de 3.0 metros, y longitud de 50 metros.

Observaciones: Se ordenó el recubrimiento en concreto de los cables de tensionamiento, para evitar algún accidente.



Se conformó el talud en el costado occidental en la pata del muro y se construyó canal para la recolección de las aguas de esorrentía.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
483 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 9.063.912.416,09 Adicional \$ 2.500.000.000 Valor total \$ 11.563.912.416,09	23 de noviembre de 2015	22 de Julio de 2016

Estado: la obra financiada con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está concluida. – la obra ejecutada con recursos de la Alcaldía de Bucaramanga esta ejecuta en un 95%, y debe concluirse el 22 de Julio del 2016.



BARRIO PABLO VI





BARRIO EL FONCFE

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
485 de 2015	CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO I.E GUSTAVO COTE URIBE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 397.195.188	12 de noviembre de 2015	11 de enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%. En proceso de Liquidación

Observaciones: en el recibo de la obra se ordenó el mejoramiento en el acabado de los concretos a la vista de los elementos estructurales.

Longitud de muro de cerramiento 350 metros lineales.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
407 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRÍTICO UBICADO EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 11.425.760.663,1	14 de Diciembre de 2015	13 de Septiembre de 2016



Estado: Avance de obra: 50% - Convenio interadministrativo No. 355 de 2015 Municipio de Bucaramanga - Departamento de Prosperidad Social-DPS



3. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA

3.1. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
397 de 2015	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 386.255.059,54	10 de Noviembre de 2015	SUSPENDIDO 14/12/2015

Estado: Porcentaje de Ejecución 25%, actualmente se encuentra suspendido por definir arreglo plazoleta, los senderos peatonales internos y externos.

Se ha logrado redefinir las obras a ejecutar en el contrato en precio y cantidad debido a las necesidades actuales del parque dándole prioridad a los senderos peatonales internos, espacio público externo y plazoleta.

Se han realizado jornadas de limpieza a parques y zonas verdes dentro del programa maratón de aseo, labor que la Administración Municipal está desarrollando con la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB y la Policía Nacional.

A continuación se relacionan los parques y vías e instituciones que se les ha realizado mantenimiento en sus zonas.



COMUNA	DIRECCION
Comuna 1	Zonas verdes Barrio Café Madrid
Comuna 2	Vía Matanza Entrada por la Virgen Esperanza II
Comuna 3	Parque San Francisco
Comuna 5	Vía Calle 45 Parque la Joya
Comuna 9	Zona verde B. San Martín Zona verde B. San Pedro
Comuna 11	Paralela Estación Metrolínea Provenza
Comuna 12	Parque San Pio Vía Carrera 36 con Calle 56, detrás del Colegio la presentación. Parque Leones Parque la loma Parque y Polideportivo Pan de Azúcar Parque Conucos
Comuna 13	Parque Niños Parque Bolívar Escuela Normal Superior Separador Avda. la Rosita
Comuna 14	Sendero Morrórico
Comuna 15	Parque Centenario Parque García Rovira Zona Verde Carrera 10 con Calle 35 y 34 Calle 35 Parque Santander Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento Separador Quebrada Seca
Comuna 17	Prados del mutis Parque B. Mutis

A continuación, el registro fotográfico de algunos sitios que fueron intervenidos:

Comuna 1:

- **Zonas verdes Barrio Café Madrid**





Comuna 2:

- **Vía Matanza Entrada por la Virgen**



- **Esperanza II**



Comuna 3:

- **Parque San Francisco**



Comuna 5:

- **Vía Calle 45**



Comuna 15

- **Parque Centenario**





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
361 de 2015	OBRAS DE ADECUACIÓN PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 619.700.966,5	08 de septiembre de 2015	En ejecución y tramite de ampliación del plazo

Estado: Avance de Obra: 80%.



4. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS

4.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
403 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES Y VIAS PEATONALES EN SECTORES DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 395.823.497,55	20 de Octubre de 2015	28 de Enero de 2016

Estado: 100% ejecutado – Recibo de Obra -En proceso de Liquidación

Se logró recuperar los andenes y vías peatonales en 12 sectores que presentaban una afectación en el espacio público dando una mayor seguridad a los peatones que por allí se desplazan, así como una mejor presentación de la ciudad

Sectores Intervenido: Provenza, Diamante II, Fontana, Coaviconsas, Porvenir, El Sol I y II, Cabecera, Iglesia San Pio, Cabecera, Carrera 38 con Calle 48, Pan de Azúcar, Buenos Ares y Mejoras Publicas.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES Y VIAS PEATONALES EN SECTORES DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 499.074.057,39	20 de Octubre de 2015	28 de Enero de 2016

Estado: 100% ejecutado - Recibo de obra - En proceso de Liquidación

Se logró recuperar los andenes y vías peatonales en 15 sectores vulnerables en el norte y noroccidente de la ciudad que presentaban un deterioro del espacio público dando una mayor seguridad a los peatones que por allí se desplazan.



Sectores Intervenido: Transición I, II, III y IV, San Cristóbal Norte, Los Ángeles, Villa Helena II, Pio XII, Gaitán, La Gloria, San Francisco, 23 De Junio, 12 De Octubre, La Universidad, La Feria, * Don Bosco, y Quinta Estrella.




No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
375 de 2015	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE USO PEATONAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECTOR CENTRO.	\$ 4.496.001.754,5	14 de Septiembre de 2015	27 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 85%,

Se realizó mejoramiento de andenes sobre la calle 36 entre la carrera 12 y 26 en los dos costados.

Se adicionó el plazo de terminación en 45 días en razón a las dificultades de ejecución por las conciliaciones necesarias con los propietarios de los locales.

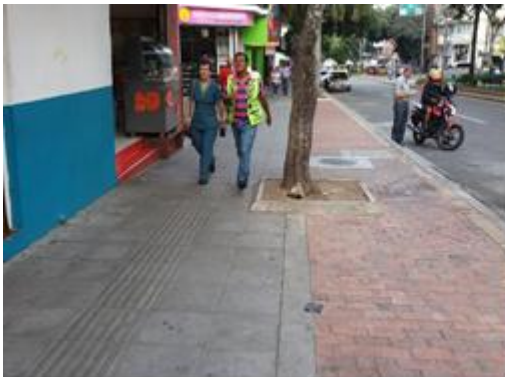

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
429 de 2015	REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO CALLE 33 ENTRE CRA 18 Y 19 Y CARRERA 19 ENTRE CALLES 33 Y 35 DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 799.803.429,75	16 de Diciembre de 2015	SUSPENDIDO 16/02/2016

Estado: Avance de Obra: 20%, actualmente se encuentra suspendido hasta tanto se defina el perfil vial del sector a intervenir

Se han logrado algunos avances para redefinir el perfil vial con la secretaria de planeación, del sector sobre la carrera 19 y la calle 33 haciéndolo más amigables con el peatón y con el medio ambiente con el fin de lograr una recuperación del sector creando un hito cultural en la ciudad.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
479 de 2015	CONSTRUCCION DE ANDENES Y MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACION MALLA VIAL BARRIO VEGAS DE MORRORRICO.	\$ 379.997.253,22	17 de Noviembre de 2015	26 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Área de 326 mt² de pavimento rígido recuperado vía con su respectivos andenes, baranda perimetral y muro de contención de longitud 30 metros aproximadamente.

Se ordenó cambiar una grada por una rampa en el costado noroccidental.





No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
532 de 2015	RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS POR ACCION POPULAR Y DEMAS ACCIONES DISPUESTA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 582.030.201,46	21/12/2015	14/07/2016

Estado: Avance de Obra: 50%, (Inversión)

Se ha recuperado espacio público en el Barrio San Francisco, Diamante II, Provenza, San Pio, Calle 36, Carrera 44, se han cumplido 17 de 37 acciones populares.



BARRIÓ PRADOS DEL MUTIS
 ANTES



BARRIÓ PRADOS DEL MUTIS
 DESPUES





BARRIO MANZANARES
 ANTES



BARRIO MANZANARES
 DESPUES

5. PROGRAMA: BUCARAMANGA AGIL Y SEGURA

5.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
482 de 2015	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO SECTOR ENTRADA BARRIO VEGAS DE MORRORICO COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 63.552.894,3	10 de Noviembre de 2015	10 de Abril de 2016

Estado: 100% ejecutado – Recibo de Obra

Se logró recuperar el pavimento rígido en los sitios más críticos de la vía uno de los sectores vulnerables de la ciudad y que además beneficia a sectores rurales que por allí se desplazan a la ciudad.

Sector Intervenido: Barrió Vegas de Morrорico - Intervenido 300 M² de Vía.



5.2 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL RURAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
435 de 2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO I DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 603.694.485	27 de Octubre de 2015	9 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%, Liquidado.

Observaciones: en el Barrio Portal de los Ángeles se ordenó demolición y restitución de dos losas del pavimento rígido por fisuras encontradas.

Se tramito con EMPAS los permisos de entrega provisional del alcantarillado combinado por la falta de obras de infraestructura en el sector



PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES



PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO EL NOGAL

MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO

La Secretaria de Infraestructura, realizó mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural ejecutando diferentes actividades con la Maquinaria Adscrita a este Despacho.

A continuación algunos sectores intervenidos.

Barrió Rincón de La Paz, Asentamiento - (17 de enero, 12 de febrero de 2016)





Vereda Rosa Blanca – Limpiando derrumbes – (Feb 25 a 26 de 2016)



Se realizó apiques en el colegio Villas de San Ignacio – (Marzo 01 de 2016)



Limpeza cuneta y derrumbes Calle 45 (Cárcel de Mujeres - Quinta Estrella y Norte vía Babarúa – (Abril 5,6 y 7 de abril de 2016)





Vía terminal - plaza campesina - (Abril 8,11 y 12 de 2016)



Así mismo se realizó un inventario de Vías Rurales del Municipio, con el fin de tener claridad del estado actual para poder hacer las respectivas intervenciones.

CORREGIMIENTOS	Longitud de Vía	Afirmado (ml)	Placa Huella (ml)	Alcantarilla (und)	Box (und)	Muro (und)	Batea (und)	Puente (und)
Corregimiento N°1	72.980,00	62.606,00	10.374,00	158,00	8,00	29,00	11,00	5,00
Corregimiento N°2	38.070,00	31.710,00	6.360,00	139,00	1,00	27,00	13,00	1,00
Corregimiento N°3	31.110,00	14.255,00	16.855,00	62,00	4,00	28,00	9,00	0,00
Total	142.160,00	108.571,00	33.589,00	359,00	13,00	84,00	33,00	6,00

5.3 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL



CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE LA CARRERA 27 CON AVENIDA QUEBRADASECA

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	09 de septiembre de 2016

Estado: Avance de obra del 60%



CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
022 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 45.317.679.804,61	28 de Febrero de 2015	25 de Junio de 2016

Estado: En ejecución, Avance de Obra: 97%, Puentes: 100%

Se aprobó un plazo adicional de dos (02) meses, los locales se utilizaran como oficinas satélites del Inderbu, Imebu, instituto de cultura





OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO PUERTA DEL SOL

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
331 DE 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000 Valor Total \$ 13.158.263.339,5	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
Convenio	AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 112.358.375.673 Adicional 1. \$ 27.289.075.315 Valor Total \$ 139.647.450.988	Avance de Obra: 45%

Actualmente se tienen 37 frentes de trabajo y aproximadamente 520 empleados en ejecución de la obra, a continuación las principales obras ejecutadas en los frentes de trabajo.



PARQUE DE LAS HORMIGAS:



Construcción del muro de contención entre abscisas k0+180 a k0+400, se construyo 220 metros.

Se ha instalado Mezcla Densa en Caliente MDC-2 modificado entre abscisas K0+130 a K0+340 y se ha Instalado concreto MR-45 entre las abscisas K0+120 a K0+300 del eje No. 1 (Autopista Norte-Sur).

PARQUE DE LAS HORMIGAS:



Se ha construido el Espacio Publico mediante loseta prefabricada en aproximadamente 250 metros



TALUD CONUCOS:



Construcción del muro de contención entre las abscisas K0+190 y K0+390 y pantalla anclada entre abscisas K0+120 y K0+190, se perforaron 42 anclajes y se trabajó aproximadamente 50 metros de espacio público.

PUENTE CARRERA 33:



Armado de acero de refuerzo de tablero de puente norte.



Suministro e instalación de concreto Clase c (4000 psi) en tablero de puente norte.



PUENTE SUR CARRERA 33:



Implósión de Puente existente.

Muro en Tierra Armada :



Construcción de muro en tierra armada entre las abscisas K0+590 a K0+710 del eje No 2 (Autopista sur – norte).



Oreja a barrio Nueva Granada:



Se realizó la pavimentación de Mezcla Densa en Caliente MDC-2 Modificado entre las abscisas K0+700 y K0+810 de la oreja de nueva Granada.



Construcción de espacio publico en ambos andenes de la oreja de nueva granada.

NUEVO VIADUCTO:



Estado actual de la construcción del viaducto la unión.



SECTOR NORTE MOTORESTE (eje 23 y 24)



El eje 23 (frente a CAI) se ha pavimentado entre abscisas K0+380 y K0+455. El eje 24 (detrás de CAI) se ha pavimentado entre abscisas k0+263 y K0+273. Se viene adelantando espacio público en los ejes 23 y 24.

MOTORESTE

La demolición de la autopista en este sector, ya se realizó y se viene adelantando la conformación de subrasante para los carriles exclusivos.



ESTACION METROLINEA - DIAMANTE II:



Se viene adelantando la construcción de la cimentación de la Estación de Metrolinea – Diamante II.

PUENTE PEATONAL- DIAMANTE II:



Se viene adelantando la construcción de la cimentación del Puente Peatonal – Diamante II.





6. PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

6.1. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS AMIGABLES

MODERNIZACION Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Contra to No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
216 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SANTANDER.	\$ 297.625.460,00	22 de Junio de 2015	23 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% Ejecutado - En proceso de liquidación, la obra se finalizó satisfactoriamente





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
382 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS BARRIOS CANDILES Y SAN MIGUEL.	\$ 1.013.717.958	29 de Septiembre de 2015	12 de Enero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% Ejecutado – En proceso de liquidación, la obra se finalizó satisfactoriamente



CONSTRUCCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LED EN BARRIOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
327 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID.	\$ 1.060.331.680	03 de Septiembre de 2015	02 de Febrero de 2016




Estado: Avance de Obra: 100% Ejecutado – En proceso de liquidación -Se finalizó la obra satisfactoriamente



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
371 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA.	\$ 553.821.633	11 Septiembre de 2015	Abril 11 de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% Ejecutado – En proceso de liquidación -Se finalizó la obra satisfactoriamente

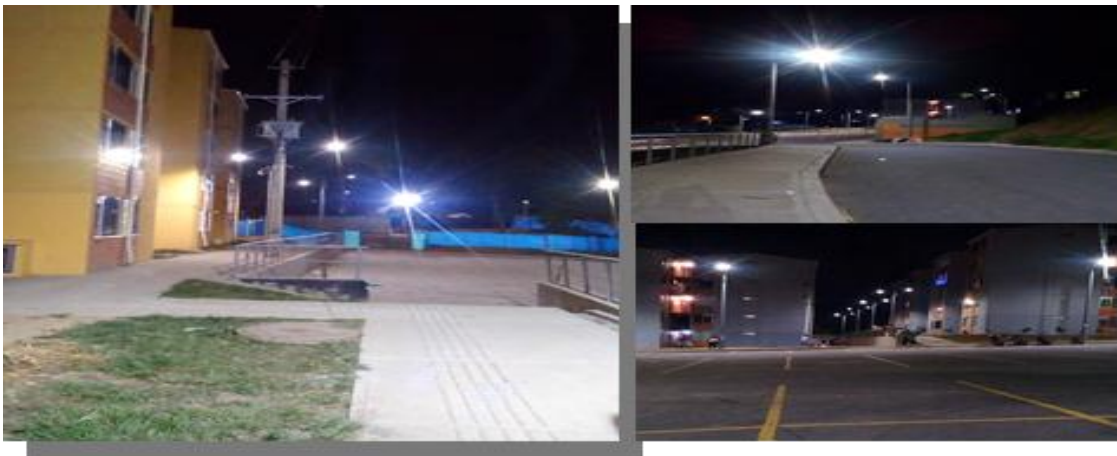

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	PROMEDIO TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)
Enero	733	648	1
Febrero	998	869	1
Marzo	666	465	4
TOTAL	2397	1982	3



SERVICIOS PÚBLICOS VEREDALES (POZOS SÉPTICOS)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
409 de 2015	CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 798.226.887,9	28 de Octubre de 2015	12 de Mayo de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%. – En proceso de liquidación

En cumplimiento de este contrato se instalaron 130 pozos en los tres corregimientos.

7. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA

7.1. SUBPROGRAMA: OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
313 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE REDES PLUVIALES Y SISTEMA DE COLECTORES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 695.520.214,96	21 de Septiembre de 2015	13 de Febrero de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%. En proceso de liquidación

Se construyó redes de alcantarillado, cunetas de manejo de aguas lluvias, pavimentación



acceso vía principal.

Se ordenó arreglar las losas de cubierta del tanque de almacenamiento de agua.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
439 DE 2015	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA - FASE I.	\$ 999.739.024	16 de Diciembre de 2015	14 de Abril de 2016

Estado: Avance de Obra: 100%. – Obra supervisada por el EMPAS. En proceso de liquidación.

Se restituyeron huellas vehiculares construidas por la comunidad que fueron demolidas como consecuencia del trazado de las redes de alcantarillado.



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
476 DE 2015	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.809.991.124,62	Avance de Obra: 30%

Se han realizado trabajos en los siguientes Barrios:

- Campo Hermoso y Quinta Estrella – recuperación de andenes.
- Villa de Prado – Reposición de Pavimento.
- Pablo VI – Pisos y cielo raso en el Colegio Nuestra Señora del Pilar.
- Barrió Guayacanes- mejoramiento de vías peatonales.
- Venado de Oro – Construcción vía peatonal.

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
143 de 2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE SEDE B	\$ 1.869.951.084,94	07 de Julio de 2014	14 dic 2015

Estado: Avance de Obra: 100%, se realizó recibo de obra, pendiente liquidar

Se logró detallar y subsanar las deficiencias en los acabados de las obras para entregarlas al servicio de la comunidad estudiantil en las mejores condiciones.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
296 de 2015	ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 536.273.840,97	07 de Septiembre de 2015	07 de Diciembre de 2015

Estado: Avance de Obra: 35% - Suspendido

Está pendiente la aprobación del ICBF para intervenir los hogares infantiles del Trencito y Domingo Sabio.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
402 de 2015	CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE I MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.284.719.430,63	23 de Noviembre de 2015	22 de Marzo de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

El proyecto se contempló en dos etapas una primera consiste en la construcción de dos niveles y la segunda etapa el nivel tercero y una placa de terraza.

Por un error en el presupuesto el monto calculado para darle acabados en el primer nivel los costos de la estructura superaron en un alto porcentaje lo previsto y no fue posible cumplir el objeto total de la primera fase.





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2015	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS A DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y DISEÑOS DE CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 878.995.800	13 de Diciembre de 2015	12 de Julio de 2016

El Contrato contempla la intervención de los siguientes Centros de Salud: Barrios Bucaramanga, Campo Hermoso, Gaitán, La Joya, La Libertad, Kennedy, San Rafael, nuestra señora del Rosario, Girardot, Antonia santos y la Unidad Materno Infantil Santa Teresita.

Seis de los Centros de Salud ya fueron presentados ante el Ministerio de la Protección Social y las observaciones hechas por esta entidad fueron atendidas, y serán devueltos para su aprobación por parte del Ministerio.

Estos centros de Salud Son: San Rafael, Campo Hermoso, Kennedy, Bucaramanga, Girardot y Rosario.

Los demás están en el proceso de legalización por parte del consultor ante el Ministerio y la curaduría correspondiente.





Contrato No.	objeto	Valor	Estado	
556 de 2015	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237.74	Por iniciar	Contratado


Contrato No.	objeto	Valor	Estado
En Legalización	INTERVENTORIA DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 104.999.928.80	Se encuentra adjudicado y en proceso de legalización de la Minuta.

El Contrato contempla la intervención de los siguientes Salones comunales de los Barrios: Norte Bajo, Porvenir, Kennedy, Provenza, La Feria, el Roció, Pan de Azúcar bajo, Esperanza II, Regadero Norte, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Santander.


Se realizó estudio para la modernización de fachadas, proyectos que se han ido desarrollando en ocho de Salones Comunales que lo ameritan por el estado de deterioro en que están.




SALON COMUNAL BARRIO SAN CRISTOBAL

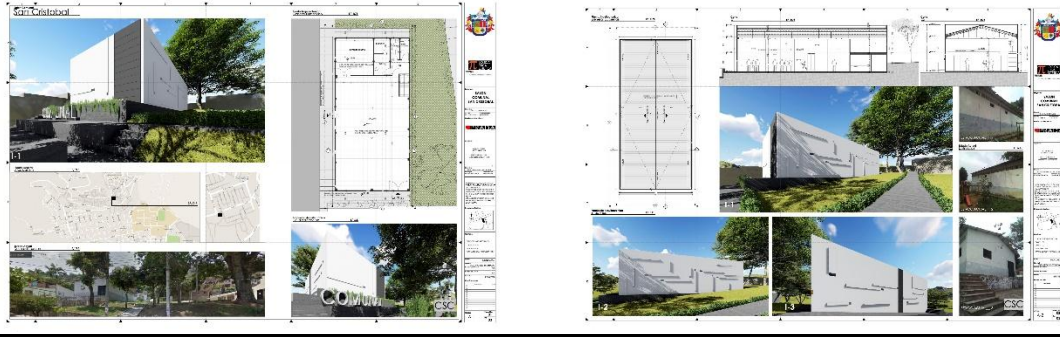


SALON COMUNAL LA ESPERANZA II

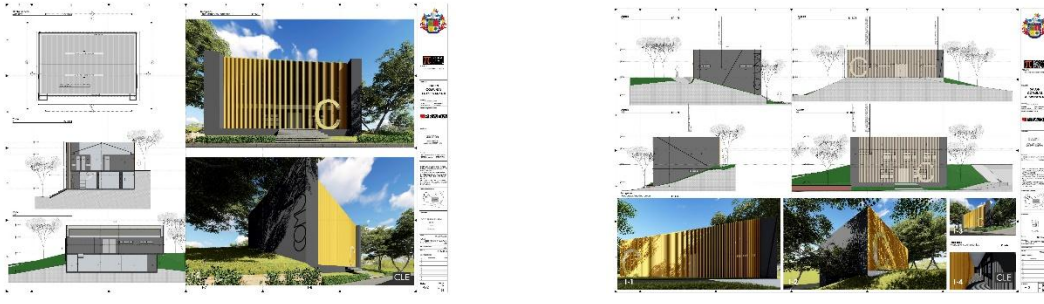

SALON COMUNAL BARRIO LA FERIA

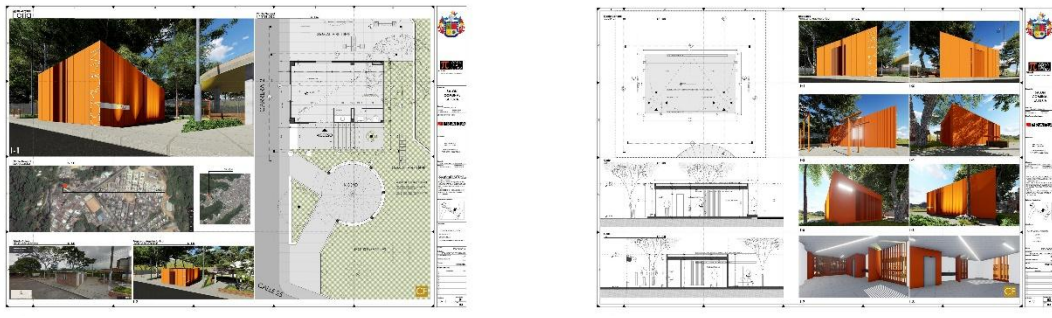

SALON COMUNAL BARRIO PROVENZA

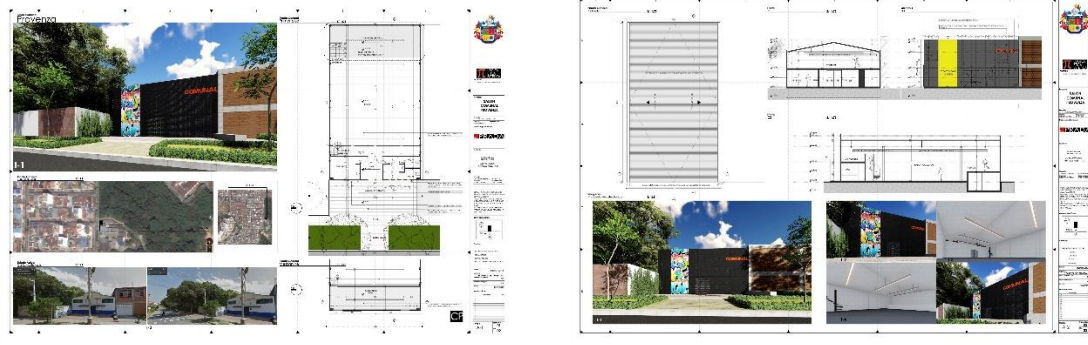

SALON COMUNAL CIUDAD BOLIVAR



9. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Enero a Mayo de 2016, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la siguiente manera:

ACCIONES POPULARES:

Sentencias a favor	5
Sentencias en contra	1



PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2012-0098	9 Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2014-0189	5° Administrativo.	A FAVOR	Sentencia a favor (terminó con Pacto)	Archivado
2015-0090	4° Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	En apelación
2013-0220	7° Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2010-0406	6° Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2013-0288	1° Administrativo	EN CONTRA	Se condenó al Municipio	En apelación
2014-0183	11 Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2011-0035	T.A.S.	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2015-0118	9° Administrativo	EN CONTRA	Se condenó al Municipio	En apelación
2013-0330	14 Administrativo	EN CONTRA	Se condenó al Municipio	En apelación

ACCIONES DE TUTELA:

Durante el periodo mencionado se recibieron diez (12) demandas de tutela, las cuales se tramitaron en su totalidad y fueron falladas como se señala a continuación:

Sentencias a favor **10**
 Sentencias en contra **0**
 Pendientes de fallo **2**

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	DECISION	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2016-0024	10 Civil del Cto.	Luz Helena Jaimes	SENTENCIA A FAVOR	Se negó el amparo constitucional	Archivado
2016-0129	24 Civil Municipal	Hilario Anaya	SENTENCIA A FAVOR	Denegada por improcedente	Archivado
2016-0050	3° Penal Municipal F.C.	Nelson Castellanos	SENTENCIA A FAVOR	Se declaró improcedente	Archivado



2016-0075	16 Penal Mpal. con F.C.G	Ana Milena Granados	SENTENCIA A FAVOR	Se declaró improcedente	Archivado
2016-0292	Tribunal Superior del Dto. Judicial	Nelson Gil Ardila	SENTENCIA A FAVOR	Se negó por improcedente	Archivado
2016-0258	3° Civil Municipal	Defensoría del Pueblo	SENTENCIA A FAVOR	Se negó la accion	Archivado
2016-0025	6° Penal del Cto con Func de Con.	Giovanny Reyes Silva	SENTENCIA A FAVOR	Revocó el Articulo 2° donde condenaba al Mpio	Archivado
2016-0197	3° Civil Mpal.	Lucila Restrepo	SENTENCIA A FAVOR INF.	Se condenó al DADEP	Archivado
2016-0056	1° Civil Mpal. de Ejecucion Sent.	Carlos A. Villamizar	SENTENCIA A FAVOR	Carencia actual de objeto	Archivado
2016-0060	5° Penal Mpal. con Funcion C.	Yolanda Sanchez C.	SENTENCIA A FAVOR	Se declaró Improcedente	Archivado
2016-0056	10 Penal Municipal FCG	Ludwing Mantilla C.	Se encuentra al Despacho	Pendiente de Fallo	---
2016-0102	5° Penal Mpal. con Funcion C.	Mariela Cuadros	Se encuentra al Despacho	Pendiente de Fallo	Archivado

En la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura igualmente se adelantaron las siguientes funciones relacionadas con la defensa judicial del Municipio:

- Procesos vigentes a cargo de la secretaria de infraestructura: **150**
- - Procesos de Infraestructura, pendientes de cumplimiento **74**
 - Procesos a cargo de otras dependencias, donde se ha solicitado
- A la Secretaria de infraestructura dar cumplimiento al fallo. **179**
- De los procesos a cargo de otras dependencias, se obtuvo el Cumplimiento por parte del propietario del inmueble en: **25**
- ✓ **Trece (13)** procesos de Acciones Populares. Se logró el archivo de estos procesos
- ✓ **Nueve (9)** Demandas nuevas contestadas durante el periodo.



- ✓ **Doce (12)** diligencias de audiencia en los Juzgados
- ✓ **Siete (7)** tramites de pago a los actores Populares
- ✓ **Veintiuna (21) Reuniones.** Se asistió en representación de la Sec. Infraestructura
- ✓ **Diez (10) Comités.** Asistencia a citación para Comité de Conciliación.

Otras funciones

- **Seiscientos sesenta y ocho (668)** Trámites relacionados con:
 - Proyecto de Actos Administrativos,
 - Respuesta a incidentes de desacato en procesos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Planeación
 - Otras respuestas relacionadas con las funciones que cumple esta Oficina
- Se prestó asesoría al personal de la Secretaría de Infraestructura, Planeación, Espacio Público, Inspecciones Civiles y otras. en un promedio de diez **(10)** veces al mes.
- Atención a funcionarios de la Personería de Bucaramanga, en promedio de cinco **(5)** veces al mes.

10. RELACION PROCESOS QUE SE ADELANTAN A LA FECHA

No.	No. PROCESO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	SI-LP-030-2015	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.744.161.921,00	A la Espera de la Asignación de Interventoría por parte de FONADE.
2	SI-LP-029-2015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL SECTOR DEL BARRIO BUCARAMANGA – COCACOLA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.608.423.841,00	A la Espera de la Asignación de Interventoría por parte del DPS.



3	SI-LP--028-2015	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237,74	A la espera de la contratación de la Interventoría para elaborar el Acta de Inicio.
4	SI-CM-021-2015	INTERVENTORÍA A LA OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 104.999.999,98	En Proceso de Legalización de Minuta.
5	SI-CMC-038-2015	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL EN VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 483 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 64.000.000,00	El contrato tiene acta de Inicio del 26 de Abril de 2016
6	SI-LP-026-2015	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.727.512,64	A la espera de la contratación de la Interventoría para elaborar el Acta de Inicio.
7	SI-CM-002-2016	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 88.392.000,00	Está publicado en el SECOP en etapa de Observaciones al Proyecto de Pliego.

Igualmente la Secretaria de Infraestructura logro dar respuesta los diferentes oficios y/o derechos de petición de la comunidad de la siguiente manera:

Oficios recibidos: 1602
Respuestas: 1373

Así mismo se relacionaron 170 solicitudes de la Comunidad en cuadro de necesidades correspondientes a malla vial, andenes, puentes peatonales, parques y zonas verdes, obra comunitaria (Gimnasios al aire libre y Juegos Infantiles) y salones comunales.

