



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA

# Informe de gestión

Segundo trimestre  
2024



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA

[www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)


   Alcaldía de Bucaramanga

## INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el segundo trimestre del año, en el cual ha continuado ejecutando y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución, así mismo la información correspondiente a las acciones adelantadas en cada uno de los diferentes grupos; mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento urbano de la ciudad, estudios y diseños de infraestructura, mejoramiento del espacio público, alumbrado público urbano y rural, malla vial urbana y rural, agua potable y saneamiento básico, obras de mitigación y plan de acción frente a contratos sin liquidación, igualmente el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

### 1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de junio de 2024 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 268.111.624.455,43 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 23.355.223.235,6, equivalente al **8,70%** de ejecución.

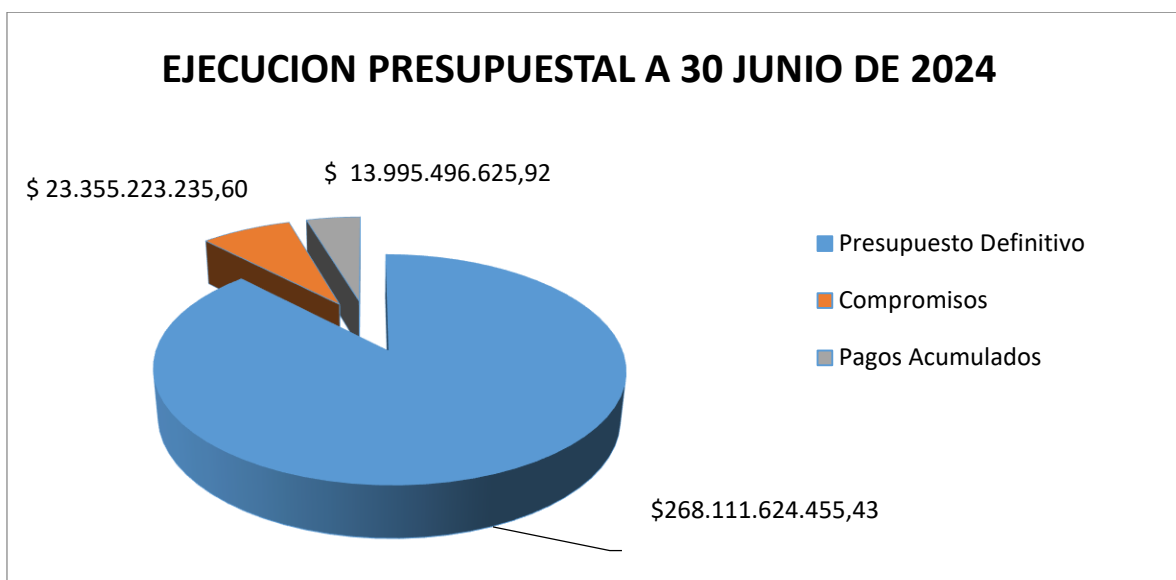

Durante este trimestre fueron adicionados los recursos de balance mediante Decreto No. 0165 del 30 de mayo de 2024, así mismo el proceso de armonización presupuestal mediante Decreto No. 0184 del 24 de junio de 2024, créditos y contracréditos, quedando como presupuesto definitivo el valor de \$ 268.111.624.455,43

### 2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La secretaria de infraestructura continúa ejecutando los siguientes contratos, cuyo ordenador de gasto es la Secretaria de Educación.

**CONTRATO DE OBRA No. 307 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023  
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTE 1.”**

VALOR INICIAL:	\$ 1.047.230.005
VALOR TOTAL:	\$ 1.047.230.005
PLAZO INICIAL:	UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL 1:	UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL 2:	UN MES (1)
PLAZO TOTAL:	(4) MESES
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	72%
ESTADO CONTRATO:	EN SUSPENSIÓN

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en suspensión con un avance del 72%, (adjunto registro fotográfico).

**IE EL PAULON**



Se realizó la adecuación de la zona del arenero izquierdo, donde retira la arena existente la cual se encontraba contaminada por excremento de gatos hasta encontrar sub rasante, se suministró y compacto sub base granular; se aplica solado de limpieza en concreto, placa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada de refuerzo. Se instala shockpad en el área de intervención y grama tipo tenis.

Ejecución: 100%



## IE VIJAGUAL SEDE F



Se realiza la intervención en el área de la cancha, baterías de baño y fachada de la escuela.

Se excava para viga de cimentación de muro de cerramiento, se demuele zona de la cancha que estaba en mal estado, se realiza construcción de muro de cerramiento y viga de cimentación en concreto reforzado en el área de la cancha. Se realiza construcción de placa en concreto reforzado para placa de cancha. Construcción de cerramiento en malla eslabonada sobre el muro, suministro de estructuras de arcos, pintura de líneas de demarcación a la cancha múltiple.

Cambio de enchape en baterías de baños, suministro de sanitarios y dispensadores de papel; desmonte de teja y cambio de cubierta y estructura de techo por cubierta king roof en baterías de baño; cambio de cableado principal de la escuela y suministro de luminarias en baños; construcción de ventanas y puertas en baños

Escafilada, estuco y pintura a fachada de la escuela.

Ejecución: 100%

## IE CAFÉ MADRID







Desmante de teja existente y cambio por cubierta en panel doble tendido tipo sándwich a 4 salones, limpieza de canal; mantenimiento y pintura de estructura de techo; suministro de luminarias, tomas y redes eléctrica a 2 salones.  
Ejecución: 100%

### IE CLUB UNION SEDE E





Intervención de baterías sanitarias del primer piso: Baño niños ,baño niñas, baño discapacitados cuarto de aseo donde se realizó la demolición de enchapes y piso; cambio de tubería sanitaria e hidráulica; construcción de muros divisorios y de fachada; suministro de enchapes en piso y pared , construcción de mesón de lavamanos en granito pulido y construcción de lava traperos; suministro de grifería , sanitarios ,orinales, dispensadores de jabón y papel en los baños ; suministro de divisiones en solido fenólico en baño de niñas niños; suministro de red eléctrica , luminarias y sensores de movimientos; suministro de sanitario , barras de seguridad y lavamanos ADA para baño de discapacitados ; suministro de puertas y ventanas para los baños, suministro de espejo biselado.

Intervención en lavamanos externo en el primer piso, se realizó la demolición y suministro de enchape de pared, cambio de grifería de lavamanos, suministro de iluminación y espejo biselado.

Intervención de baños de salones del piso 2 cambio de piso, sanitarios, construcción de lavamanos y suministro de dispensadores de jabón, papel higiénico y espejo.

Ejecución: 100%

### IE SALESIANO SEDE C








Demolición de pisos, excavación, suministro de base, placa de concreto reforzada, enchape de salones y pasillos, pintura de salones y pasillos  
Ejecución: 100%

### IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B



Demolición de piso en concreto, excavación y suministro de sub base, y asfalto MDC-10, suministro de capa nivelante, y pintura, construcción de cárcamo para desagüe de agua lluvia, suministro de arcos de mini futbol.  
Ejecución: 100%

### IE SAN FRANCISCO DE ASIS

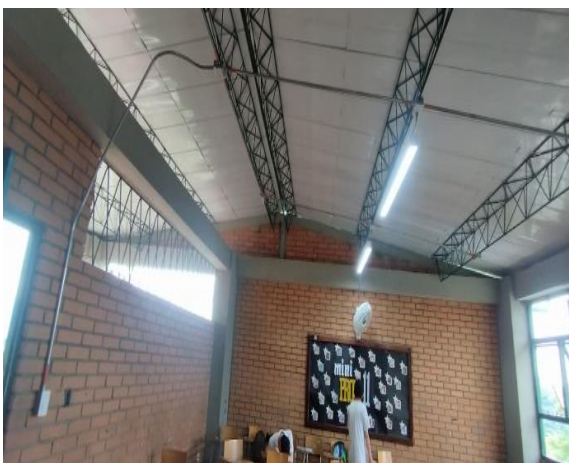





Desmonte de redes eléctricas, Suministro de redes eléctricas, tomas e iluminación en 5 salones del 3 piso, suministro de tablero eléctrico y totalizador.

Ejecución: 100%

### IE COMUNEROS



Descapote excavación y suministro de base granular, construcción de placa en concreto reforzado, suministro de mesas tipo picnic para el área intervenida.

Ejecución: 100%

#### OBSERVACIONES:

- 1. Institución educativa de Santander Sede F:** El alcance del proyecto contratado que era realizar la adecuación de baterías sanitarias para niños y niñas, no fue aceptado por la rectora de la institución educativa bajo el alcance contratado, existe actas de reunión en la cual la rectora manifiesta no estar de acuerdo con el alcance de las actividades y solicita se realicen cambios en diseños y especificaciones técnicas. Cambios que no son posible realizar dado la configuración estructural de la institución.

Como alternativa de intervención la rectora solicita se realice el proyecto de respaldo, el cual consiste en realizar la adecuación de la cancha de la sede, actualmente la secretaria de educación se encuentra realizando el proceso respectivo para la aprobación y cambio de intervención.



*Ilustración 1. Zona de la cancha de la institución a adecuar*

- 2. Institución educativa Santo Ángel sede A:** No ha sido posible iniciar actividades dado que en la institución educativa se evidencian grietas y asentamientos en el suelo. Se realizó visita con especialistas por parte del Municipio de Bucaramanga y se determinó que se hace necesario realizar estudio del suelo para determinar las causas del asentamiento. Dado que el estudio no está contemplado en el alcance del contrato a un no se ha podido iniciar actividades.



*Ilustración 2. Asentamientos y grietas en el área a construir la cafetería contemplada en el alcance del contrato*

Se realizó visita conjunta con funcionarios de la secretaria de educación, secretaria de infraestructura y rector de la institución, donde se determinó adecuar una infraestructura existente para la cafetería, esta alternativa ya cuenta con la aprobación del consejo directivo de la institución.

Sin embargo, la secretaria de educación se encuentra en proceso de aprobación y definición de viabilidad de la alternativa propuesta y aceptada por el consejo directivo de la instrucción.





Ilustración 3. Infraestructura existente proyectada para adecuación de tienda escolar.

3. **Institución Educativa Damaso Zapata-Sede C:** No ha sido posible dar inicio a las actividades dado que, una vez socializado el proyecto, el Sr. Rector de la Institución Educativa solicitó un ajuste al proyecto y cambiar el área de intervención, razón por la cual se hace necesario reajuste al diseño por parte del Municipio de Bucaramanga. Adicionalmente el día 19 de marzo de 2024 se realizó visita por parte de ingenieros estructurales y geotecnistas por parte del Municipio de Bucaramanga en aras de evaluar los asentamientos y grietas en el muro de cerramiento de IE, con el objeto de evaluar la pertinencia de realizar la intervención en la institución.

Como conclusión del estudio realizado por los profesionales de apoyo de la secretaria de infraestructura, se concluye que es pertinente realizar estudios de vulnerabilidad sísmica especializados, antes de realizar algún tipo de intervención en la cubierta. Razón por la cual a la fecha no se cuenta con la viabilidad técnica para realizar intervención alguna en esta institución.

Se han realizado reuniones con el rector de la institución con el objeto de realizar cambio de destinación de los recursos a otra sede y otro proyecto, encontrándose por el momento la secretaria de educación en el proceso de revisión de propuestas por parte del rector de la institución y en proceso de viabilizar y aprobar la alternativa propuesta.






**CONTRATO DE OBRA No. 308 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES**  
**EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTE 2.”**

VALOR INICIAL:	\$ 1.419.087.074
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 219.615.660
VALOR TOTAL:	\$ 1.638.702.734
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y 15 DIAS
PLAZO ADICIONAL 1:	UN (01) MES Y 15 DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2:	15 DÍAS
PLAZO ADICIONAL 3:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES + 15 DÍAS
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	100 %
ESTADO CONTRATO:	EN LIQUIDACIÓN

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en proceso de liquidación con un avance del 100 %, (adjunto registro fotográfico).

**IE POLITECNICO CEDE A CIUDADELA REAL DE MINAS CALLE DE LOS ESTUDIANTES**

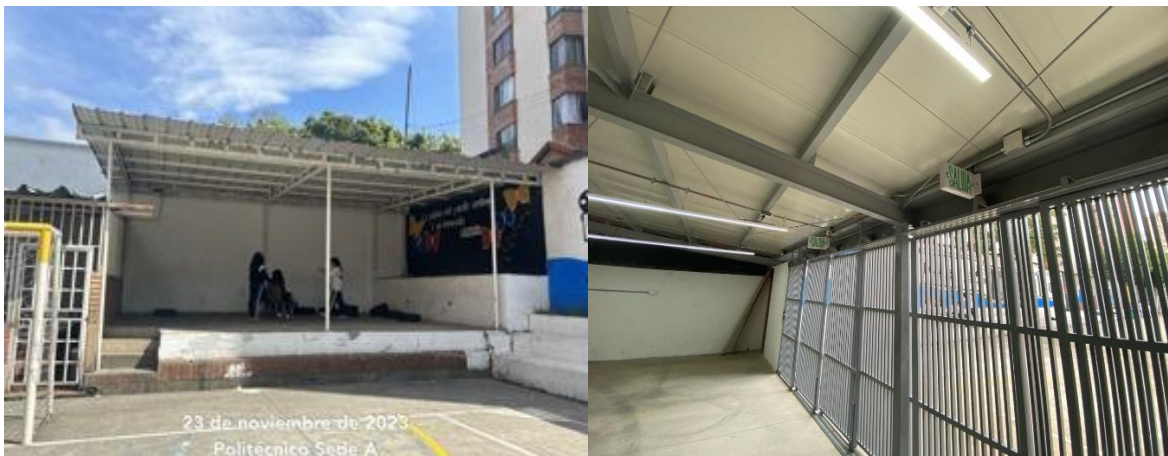

Se realiza adecuación de cafetería  
 Se demolió una especie de tarima y se construyó una caseta de comedor escalar realizando vigas de cimentación, zapatas en concreto, relleno, piso en concreto pulido, estructura metálica, cubierta y teja tipo sándwich, portón metálico y la red eléctrica interna con salidas de lámparas.  
 Ejecución: 100%

**IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, ESTORAQUES**



Se demolió una huella que había para ir a los salones de preescolar, se adecuó el lugar construyendo un parque infantil en grama sintética y un camino en adoquín, también se dejó un pasillo en grama natural y se hizo un canal con tapas rejilla en concreto prefabricado.  
Ejecución: 100.

**IE JOSE CELESTINO MUTIS**



Se demolió el mortero de la placa del colegio, se fundió mortero impermeabilizado y se impermeabilizó toda el área de la placa.  
Ejecución: 90%

**IE SANTA MARIA GORETTI SEDE A**





Se demolió mortero de dos placas de la institución, se fundió mortero impermeabilizado y se impermeabilizó las placas del ala norte y sur, además se escafilo el estuco y pintura, arreglando la placa, se volvió a estucar y a pintar toda el área afectada.  
Ejecución: 100%

### IE VICENTENARIO SEDE B



Desmonte de 25 rejas y ventanas, mantenimiento y pintura a las rejas para posterior instalación, también se instalaron 25 ventanas de correderas y 3 ventanas en celosía.  
Ejecución: 100%

### IE NORMAL SUPERIOR



Mantenimiento y pintura de piso en madera zapan e:2mm incluye limpieza manual, resane y laminado de grietas de tablas separadas, suministro e instalación de madera para reemplazo de piso deteriorado, control de plagas por inmunizado manual, pulida y renovación total de pintura de madera existente y piso en general, suministro y aplicación de pintura general y aplicación de pintura base agua alto tráfico, dos capas  
Ejecución: 80%



### IE IMEN SEDE E DIVINO SALVADOR



Se cambió la cubierta de 5 salones por teja tipo sándwich, se suministró e instaló estructura metálica para esta cubierta, se cambió fachaleta de socalo en esta institución, se demolió e instaló piso en tablón para los 5 salones y se instalaron los puntos eléctricos de luz, ventiladores y video beam en todos los 5 salones.  
Ejecución: 100%

### IE JOSE MARIA ESTEVEZ BARRIO SAN MIGUEL



Se cambió parte de la teja del multi - aula de esta institución, se instaló tablón de piso, se construyeron unos muros en mamposterías, se cambió el portón metálico del aula y se instaló el piso en madera de la tarima de esta aula.  
Ejecución: 100%

### IE MEDALLA MILAGROSA BARRIO PORVENIR



Se realizó todo el cambio de la red eléctrica, voz y datos del aula de informática; también se cambió el cielo raso de esta aula.  
Ejecución: 100%

### IE NACIONAL DE COMERCIO SEDE A



Se realizó toda la red eléctrica y el suministro e instalación de 6 aires acondicionados para la auditoria de esta Institución  
Ejecución: 100%



## IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE B



Se instaló piso en madera del salón de danzas 1 de esta institución, se suministró e instaló barra de ballet, Espejo en los laterales del salón y 4 muebles en madera en forma de guarda ropa.

Ejecución: 100%

Así mismo el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura continúa ejecutando el contrato interadministrativo con FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, mediante el contrato:

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 166 de 2023:** SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR FISCAL INICIAL	: \$ 79.668.991.613,00
VALORES ADICIONALES	: \$ 5.095.591.608,00
VALOR TOTAL	: \$ 84.764.583.221,00
PLAZO INICIAL	: VEINTE (20) MESES
FECHA DE INICIO	: 12 DE JULIO DE 2023

En comunicación enviada por el Sr. Alcalde JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTINEZ a FINDETER, el día 23 de febrero de 2024, se solicitó la suspensión de las convocatorias para la ejecución de las obras de las IE objeto de dicho Convenio Interadministrativo.

FINDETER emite un Acta de Cancelación el día 26 de febrero de 2024.

Por lo anterior nos encontramos a la espera, de un nuevo pronunciamiento por parte de FINDETER.

### 3. EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022:** “CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”



VALOR INICIAL:	\$ 9.097.194.874,05
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 529.406.212,98
VALOR TOTAL:	\$ 9.626.601.087,03
PLAZO INICIAL:	10 MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	4 DIAS
PLAZO ADICIONAL 2:	15 DIAS
PLAZO ADICIONAL 3:	1 MES
PLAZO TOTAL:	11 MESES Y 19 DIAS
SUSPENSION 1	DESDE EL 22/12/2023 HASTA TA EL 21/01/2024 POR 1 MES
PRORROGA 1 A SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 22/01/2023 HASTA EL 21/02/2024 POR 1 MES
PRORROGA 2 A SUSPENSIÓN 2	DESDE EL 22/02/2023 HASTA EL 03/03/2024 POR 11 DIAS
PRORROGA 3 A SUSPENSIÓN 2	DESDE EL 04/03/2023 HASTA EL 17/04/2024 POR 45 DIAS
SUSPENSION 2	DESDE EL 24/05/2024 AL 23/06/2024 POR 1 MES
PRORROGA 1 A SUSPENSION 2	24/06/2024 AL 08/07/2024
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 JULIO 2024 PENDIENTE POR CONFIRMAR SEGÚN AVANCE A PARTIR DEL 9 JULIO 2024 Y ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO.
PORCENTAJE AVANCE:	87,20%
ESTADO CONTRATO:	Suspendido desde el 23/05/2024

**ESTADO DEL CONTRATO:** A corte del 30 de junio de 2024 el acumulado programado corresponde a 87,15% equivalente a \$8.389.582.847,35 vs un acumulado ejecutado de 87,20% correspondiente a \$8.394.396.147,89., (adjunto registro fotográfico).



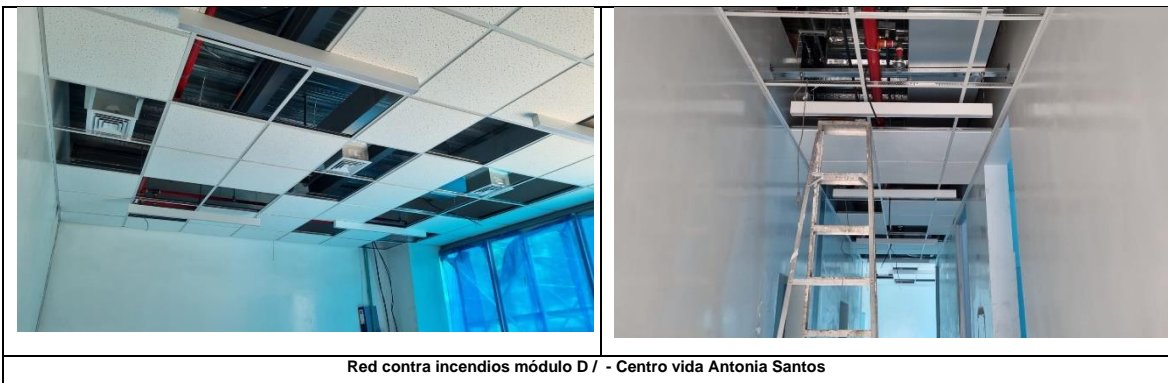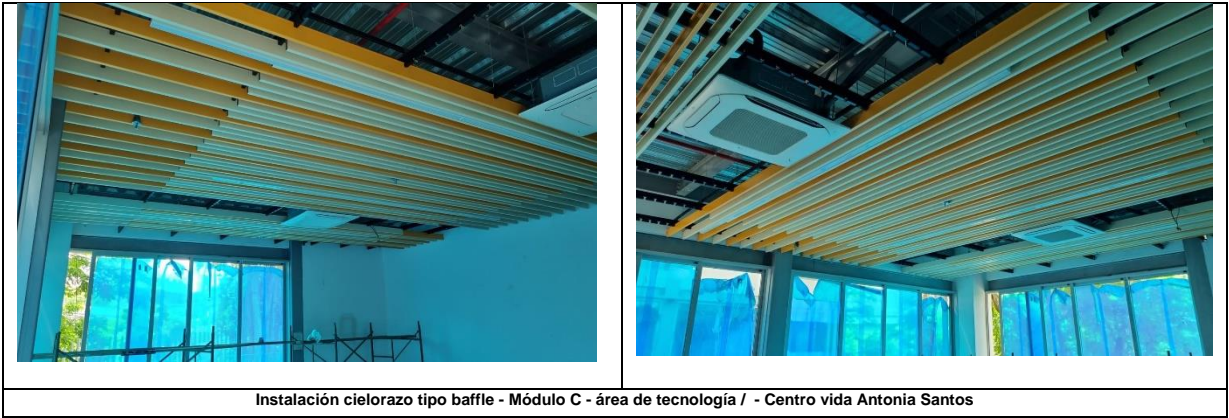



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 316 DE FECHA 15 de noviembre de 2023:**  
**“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

VALOR INICIAL	: \$380.844.085,18
VALOR ANTICIPO	: \$114.253.225,55
ADICIONAL 1 EN VALOR	: \$172.725.229,80
VALOR TOTAL	: \$553.569.314,98
PLAZO INICIAL	: 1 mes y 15 días
PLAZO ADICIONAL N°1	: 45 días
PLAZO ADICIONAL N°2	: 2 meses
PLAZO TOTAL	: 3 meses y 60 días
FECHA DE INICIO	: 26 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	: 27 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO N°1	: 15 DE ENERO 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	: 11 DE ABRIL 2024
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N°2	: 30 DE ABRIL 2024
ACTA DE REINICIO N°2	: 16 DE MAYO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 15 DE JULIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO	: EN EJECUCIÓN
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	: 89,54%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución con un 89,54% de avance, con aproximadamente más de un 90% de las actividades contratadas finalizadas, entre ellas las que más destacan son el cerramiento tipo “U” en tubo galvanizado sobre el separador existente sobre la carrera 15 entre la calle 33 y Quebradaseca, así mismo otras actividades con gran incidencia como lo es la demarcación vial, señalización horizontal y zona verde sobre el separador. Actualmente, se esta llevando acabo el reemplazo y mantenimiento de bolardos en los vados peatonales ubicados sobre el costado oriental y occidental de la carrera 15






**Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado**



**Cerramiento en U con tubería galvanizada**



**Suministro e instalación de bolardos en hierro fundido tipo MBo20a**

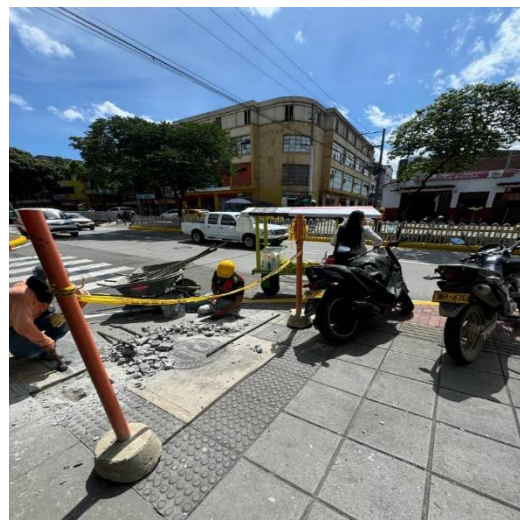





**CONTRATO DE OBRA 184 DEL 12 DE JULIO 2023 -: CONSORCIO LA VICTORIA II “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”**

Valor del contrato:	\$ 12.918.441.253,19
Plazo Inicial	Seis (6) meses.
Fecha de Inicio:	08 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	07 de febrero 2024
Porcentaje avance:	7%
Estado actual contrato:	SUSPENDIDO


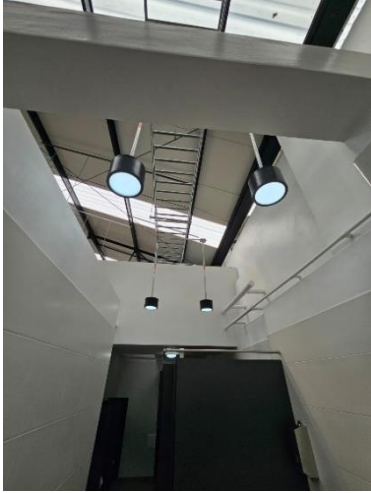


**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra suspendido, toda vez que, desde el equipo de infraestructura se está realizando actualización del proyecto con el fin de mitigar el riesgo sobre el talud. También que no se cuenta con la aprobación de los diseños hidráulicos y sanitarios radicados a las entidades AMB y EMPAS para el trámite de actualización.

**CONTRATO DE OBRA 426 de 2022 -: CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC “ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1”.**

Valor del contrato:	\$7.185.094.791,00
Valor Anticipo:	\$2.071.308.457,80
Plazo inicial:	Ocho (08) meses
Plazo Adicional 1:	Dos (02) meses
Plazo Adicional 2:	Quince (15) días
Plazo Adicional 3:	Ocho (08) días
Plazo Total:	Diez (10) meses y veintitrés (23) días
Fecha de inicio:	01 de junio de 2023
Fecha de terminación:	30 de enero de 2024
Nueva Fecha de terminación:	N/A
Estado del Contrato:	SUSPENDIDO
Porcentaje avance:	82%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato de obra se encuentra **SUSPENDIDO** y a la fecha se ha realizado la entrega de los **BAÑOS**. El contratista a la fecha ha hecho el cambio total de la cubierta, ha hecho trabajos de friso y pintura en la fachada por 3 de las 4 caras de la plaza de mercado, y frisos en la fachada de la Cra 13. También se encontraba realizando instalación de la bandeja portacables al interior de la plaza.

A la fecha la zona de restaurantes se encuentra en un 90% de avance.

	
<p><b>Imagen: Entrada a la zona de Baños, Terminada y entregada a la comunidad</b></p>	<p><b>Imagen: Zona de baños, sector Hombres, Terminada y entregada a la comunidad.</b></p>
	
<p><b>Imagen: Instalación de bandeja portacables al interior de la plaza de mercado.</b></p>	<p><b>Imagen: Avance en frizado por la Carrera 13</b></p>

**CONTRATO DE OBRA 445 de 2022 - : CONSORCIO PLAZAS JGV 2022 “ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2”.**

Valor del contrato:	\$ 4.212.966.188,00
Valor Anticipo:	\$1.214.051.365,10
Plazo inicial:	Seis (06) meses
Plazo Adicional No 1:	Quince (15) días
Plazo Adicional No 2:	Un (01) mes y Quince (15) días
Plazo Adicional No 3:	Dos (02) meses
Plazo Adicional No 4:	Quince (15) días
Plazo Adicional No 5:	Ocho (08) días
Plazo Total:	Diez (10) meses y veintitrés (23) días
Fecha de inicio:	01 de junio de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2023
Nueva Fecha de terminación:	N/A



Estado del Contrato: **SUSPENDIDO**  
 Porcentaje avance: **97%**

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra suspendido y a la fecha se ha realizado desmonte de la cubierta existente, instalación de nueva estructura y cubierta, adecuación de locales de comerciantes, demolición de pisos existentes, fundida de placa de contrapiso en la plaza, retiro de tubería hidrosanitaria existente e instalación de nueva tubería, instalación de cajas de inspección. El contratista de obra se encontraba realizando la adecuación del cuarto de basuras.

	
<p>Imagen: Estructura y cubierta instalada</p>	<p>Imagen: Vista interior al cuarto de basuras</p>
	
<p>Imagen: Cubierta instalada y pisos fundidos.</p>	<p>Imagen: Placa de contra piso fundida y piso rayado. En funcionamiento.</p>

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.313 DEL 2022: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

Se suscribió el Convenio Interadministrativo con el Área Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar el mantenimiento de los parques y áreas verdes pertenecientes al espacio público del Municipio de Bucaramanga.

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES  
 VALOR INICIAL: \$4.212.665.314,47  
 FECHA INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2022  
 FECHA TERMINACION INICIAL: 11 DE AGOSTO DE 2023  
 FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 11 DE JULIO DE 2024

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN.

Se firmó otrosí con valor de **MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (1.940.992.350,93)** el día 10 de agosto del 2023, para continuar realizando las actividades correspondientes al mantenimiento de los parques y conservación de la cobertura vegetal. De acuerdo con el balance del Convenio se realizó prórroga en plazo en la vigencia 2024, por 4 meses a partir del mes de marzo, para ejecución en los meses de marzo, abril, mayo, junio y parte del mes de julio de 2024.

**NUEVO VALOR FISCAL:** SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 6.312.038.332,27) MONEDA CORRIENTE.

**NUEVO PLAZO:** 19 MESES.

**ESTADO DEL CONTRATO:** Durante la ejecución del Convenio se ha realizado la atención de 225 parques, 140 zonas verdes, 23 separadores, 13 glorietas y 7 ciclo rutas, que requieren el corte de césped o maleza, actividades de barrido de zonas verdes, arreglo de jardines, entre otras actividades, buscando atender las 17 Comunas del municipio de Bucaramanga. Para el trimestre se han atendido solicitudes allegadas por la ciudadanía a través de PQRS, se ha brindado apoyo en jornadas de limpieza y lavado de áreas actividades desarrolladas en el parque de las Cigarras, parque Romero, parque Girardot, parque Centenario, parque Morrórico, parque de las Mojarras, parque lineal Bavaria II, área deportiva Tiburones, cancha Cosmos, sector Balconcitos II, apoyo y acompañamiento en jornadas de siembra de plántulas y/o arboles llevadas a cabo en el parque de las Palmas, parque de los Niños, predios del Café Madrid, zonas verdes del barrio Manzanares, bahía de la carrera 33 entre calle 44 y calle 45 entre otros.

<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	
Actividades de deshierbe	
 <p>Parque Centenario</p>	 <p>Parque García Rovira – alrededores Gobernación de Santander</p>
 <p>23 may. 2024 07:26:43 5462 Carrera 21 Bucaramanga Santander iPablo César Duarte</p> <p>Separador Carrera 21</p>	 <p>29 abr. 2024 1:22:00 p. m. Andrés Mauricio Sorrilla</p> <p>Separador Carrera 36</p>
Actividad de barrido en zonas verdes	





Parque de la Vida



Parque Carlos Virviescas



Parque Bosques del Cacique



Parque Bruno Batello

Actividades de poda de césped



Poda de césped zona verde Barrio Esperanza



Poda césped Inmaculada fase 1

Apoyo en actividades de siembra / jornadas de limpieza



Jornada de siembra de árboles zona verde Manzanares



Jornada de limpieza y lavado de áreas Parque de las Cigarras



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 292 DE FECHA 03 de noviembre de 2023:**  
**“ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”**

VALOR INICIAL	\$2.193.042.076,00
VALOR ANTICIPO	\$657.912.622,80
PLAZO INICIAL	1 MES Y 15 DIAS
PLAZO FINAL	3 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	19 DE ENERO DE 2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	22 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)
FECHA SUSPENSION 2	5 DE FEBRERO DE 2024 A LA FECHA
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	1%


**ESTADO DEL CONTRATO:** Dentro de las intervenciones planificadas se incluyen la adecuación del espacio público, la adecuación de las dos canchas múltiples y la cancha de voleibol, cerramientos perimetrales, instalación de mobiliario urbano, mejoras en el alumbrado público, así como la creación de zonas verdes y áreas de esparcimiento para beneficio de la comunidad local.

Debido a la mala planeación del proyecto antes de a la licitación adjudicada en noviembre de 2023. La administración actual se encuentra ajustando los diseños y presupuestos del proyecto en conjunto con el contratista y la interventoría. Lo anterior con el fin de hacer la mejor intervención en el parque con los recursos adjudicados.

**Diseño propuesto**





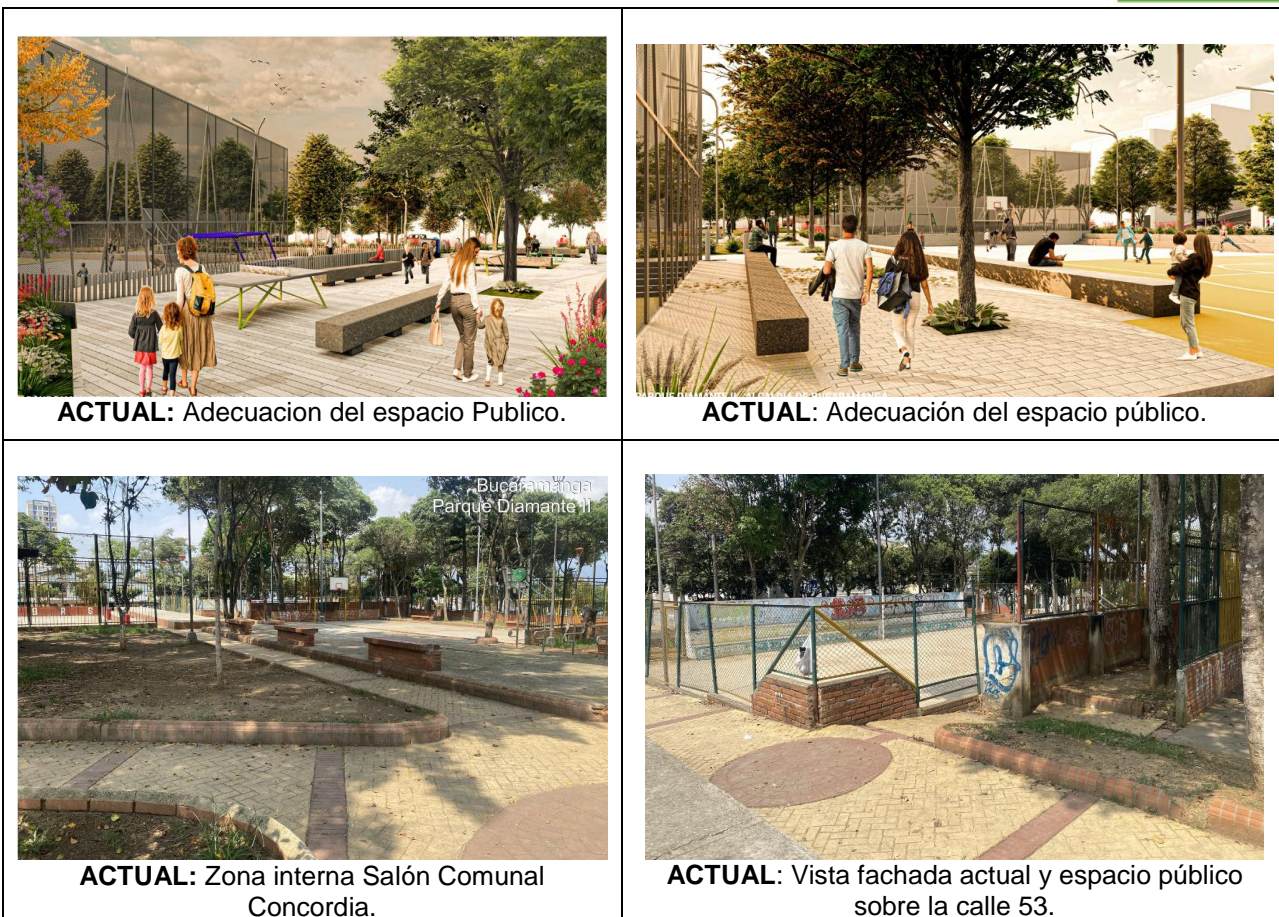

**CONTRATO DE OBRA No. 38 de 2022: “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO No. 1.” COLORADOS**

VALOR INICIAL	: \$479.947.142
ADICIONAL 1 EN VALOR	: \$96.968.284
ADICIONAL 2 EN VALOR	: \$76.591.183
ADICIONAL 3 EN VALOR	: \$66.414.104
VALOR TOTAL	: \$719.920.713
PLAZO INICIAL	: 2 meses
PLAZO ADICIONAL N°1	: 1 mes
PLAZO ADICIONAL N°2	: 3 meses
PLAZO ADICIONAL N°3	: 10 días
PLAZO ADICIONAL N°4	: 3 días
PLAZO ADICIONAL N°5	: 28 días
PLAZO ADICIONAL N°6	: 3 meses
PLAZO ADICIONAL N°7	: 40 días
PLAZO TOTAL	: 11 meses y 21 días
FECHA DE INICIO	: 28 de marzo de 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	: 23/06/2022
ACTA DE REINICIO N°1	: 28/08/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	: 15/12/2022

ACTA DE REINICIO N°2	: 14/03/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	: 12/04/2023
ACTA DE REINICIO N°3	: 25/07/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°4	: 23/10/2023
ACTA DE REINICIO N°4	: 14/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°5	: 22/12/2023
ESTADO DEL CONTRATO	: SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	: 50%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra suspendido con un 50% de avance físico aproximado, a la fecha la administración municipal se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para la contratación de la Interventoría y proceder a reactivar las actividades constructivas para lograr su finalización y posterior entrega a la comunidad. Cabe resaltar que a su vez se adelanta la gestión jurídica contra la Interventoría inicial del contrato, toda vez que se observó un posible incumplimiento en sus obligaciones contractuales.

**Registro fotográfico: Interior del salón comunal**



**Registro fotográfico: Fachada**





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 409 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 2.**

VALOR INICIAL:	\$ 7.647.383.592,45
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA INICIAL:	10 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSION No.01:	04 DE OCTUBRE DE 2023 (10 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.01:	14 DE OCTUBRE DE 2023 (9 DIAS)
RENICIO No.01:	23 DE OCTUBRE DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO No.01:	24 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION No.02:	PRORROGA No.01: DOS (02) MESES
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.02:	23 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)
AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No.02:	06 DE FEBRERO DE 2024 (28 DIAS)
REINICIO No.02:	05 DE MARZO DE 2024 (86 DIAS)
ADICIONAL EN PLAZO No.02:	29 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL:	29 DE MAYO DE 2024
PLAZO FINAL:	PRORROGA No.02: DOS (02) MESES
ESTADO DEL CONTRATO:	08 DE AGOSTO DE 2024
PORCENTAJE DE AVANCE:	DIEZ (10) MESES
	EN EJECUCION
	35%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempla la intervención de los escenarios deportivos Brisas del Mutis el cual actualmente tiene el 40% de avance de ejecución, Plazuela Real el cual cuenta con el 30% de avance de ejecución, Ciudad Bolívar 90% de avance de ejecución, La Salle 15% de avance de ejecución y La Floresta con un 90% de avance de ejecución. El proyecto contempla la construcción de espacios públicos, la instalación de mobiliario urbano, adecuación de canchas múltiples, la implementación de cerramientos, la instalación de gimnasios biosaludables, el mejoramiento del alumbrado público, así como la creación de zonas de esparcimiento y áreas verdes.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 410 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3.**

VALOR INICIAL:	\$ 6.417.027.723,27
ADICIONAL No.01:	\$ 1.340.000.000,00
ADICIONAL No.02:	\$ 624.362.094,84
VALOR TOTAL:	\$ 8.381.389.838,11
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA INICIAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSION No.01:	18 DE AGOSTO DE 2023 (30 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.01:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (30 DIAS)
AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No.01:	19 DE OCTUBRE DE 2023 (10 DIAS)
AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No.01:	29 DE OCTUBRE DE 2023 (16 DIAS)
REINICIO No.01:	15 DE NOVIEMBRE 2023
ADICIONAL No.01 EN VALOR Y PLAZO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023 PRORROGA No.01: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS. VALOR: \$ 1.340.000.000,00
SUSPENSION No.02:	05 DE FEBRERO DE 2024 (30 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.02:	05 DE MARZO DE 2024 (5 DIAS)
REINICIO No.02:	12 DE MARZO DE 2024
ADICION No.02 EN PLAZO:	26 DE ABRIL DE 2024 PRORROGA No.02: SIETE (07) DIAS
SUSPENSION No.03:	18 DE MARZO DE 2024 (30 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.03:	18 DE ABRIL DE 2024 (8 DIAS)
REINICIO No.03:	26 DE ABRIL DE 2024



ADICION No.03 EN VALOR Y PLAZO

26 DE ABRIL DE 2024  
PRORROGA No.03:  
CUARENTA Y CINCO (45)  
DIAS

SUSPENSION No.04:

VALOR: \$ 624.362.094,84  
07 DE JUNIO DE 2024 (7 DIAS)

AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.04:  
REINICIO No.04

14 DE JUNIO DE 2024 (6 DIAS)

19 DE JUNIO DE 2024

19 DE JUNIO DE 2024

ADICIONAL No.04 EN PLAZO:

PRORROGA No.04: TREINTA  
(30) DIAS

FECHA FINAL:

22 DE JULIO DE 2024

PLAZO FINAL:

ONCE (11) MESES Y SIETE  
(07)

ESTADO DEL CONTRATO:

EN EJECUCION

PORCENTAJE DE AVANCE:

90%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempla la intervención del escenario deportivos Diamante I, Canchas de Trivenza – Provenza los cuales se lograron culminar y ser entregados a la disposición de la comunidad y finalmente el escenario deportivo pendiente es Patinódromo de Provenza, el cual actualmente presenta un avance de ejecución del 90%. Dentro de las intervenciones planificadas se incluyen la adecuación del espacio público, la adecuación de canchas múltiples, pista de patinaje, cerramientos perimetrales, instalación de mobiliario urbano, mejoras en el alumbrado público, así como la creación de zonas verdes y áreas de esparcimiento para beneficio de la comunidad local.

### REGISTRO FOTOGRAFICO




Frente - Diamante I



Frente – Canchas Trivenza (Provenza)



Frente – Patinódromo de Provenza

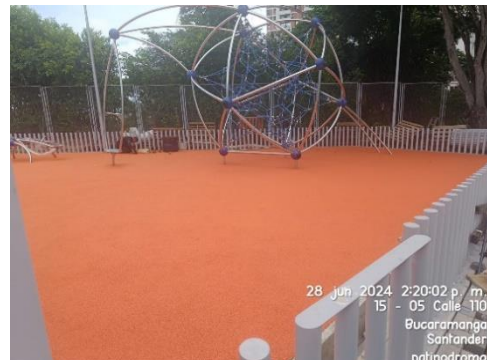



Frente – Patinódromo de Provenza



**CONTRATO DE OBRA No. 333 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**“ADECUACION DEL SALON COMUNAL RINCON DE LA PAZ DE LA COMUNA**  
**NO. 5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”**

VALOR INICIAL : \$ 368.226.958,00  
 ANTICIPO : \$ 110.468.087,40  
 FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2023  
 PLAZO INICIAL : 45 días.  
 FECHA DE TERM INICIAL: 28 de enero de 2024  
 FECHA REINICIO : 16 de abril de 2024  
 NUEVA FECHA TERMI : 17 de mayo de 2024  
 PRORROGA 1 : 17 de mayo de 2024  
 SUSPENSION 2 : 28 de junio de 2024  
 % EJECUCION : 40%  
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en suspensión con un avance del **40%**, (adjunto registro fotográfico).

ANTES	DESPUES
	
<p>Se realizó la viga aérea para instalar la placa fácil</p>	
<p>ANTES</p>	<p>DESPUES</p>





Se realizó la canaleta en la plazoleta de acceso, con el fin de recoger el agua cuando llueve.

**ANTES**

**DESPUES**



Se instalan los muros de mampostería H-10 para el baño del primer piso.

**ANTES**

**DESPUES**



Se aplicó estuco en cada una de las paredes que fueron frisadas, menos en el baño de discapacitado ya que este se va a enchapar.

**4. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCUTRA**

**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 280 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”**

VALOR INICIAL	: \$267.377.530,00
VALOR ANTICIPO	: \$210.256.340,00
PLAZO INICIAL	: 1 MES Y 45 DIAS
FECHA DE INICIO	: 08 de Noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACION	: 31 de Diciembre de 2023
SUSPENSION 1	: 26 de diciembre de 2023
SUSPENSION 2	: 10 de mayo de 2024
AMPLIACION 1 SUSPENSION 2	: 26 de mayo de 2024
AMPLIACION 2 SUSPENSION 2	: 11 de junio de 2024
AMPLIACION 3 SUSPENSION 2	: 27 de junio de 2024
ESTADO DEL CONTRATO	: SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	: 80%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato ejecutó las actividades de levantamiento topográfico, caracterización geológica y geomorfológica, y exploración y caracterización geotécnica a partir de perforaciones, apiques y ensayos geofísicos, análisis hidrológico, análisis de vulnerabilidad, amenaza y riesgo. A partir de esta información se proponen las medidas de mitigación para abordar los posibles riesgos de los elementos expuestos del barrio Altos del Kennedy y un presupuesto estimado del costo de estas medidas.

A la fecha de este informe el contrato se encuentra suspendido en atención a que el contratista está atendiendo las observaciones realizadas por la entidad al informe final de la consultoría.



**Perforación de sondeo**

**Apique**





Toma de apique

Toma de apique

## RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

### CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3985-2023

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975”, en el municipio de Bucaramanga, Santander”.

El proyecto contempla la realización de los estudios técnicos para la restauración del Coliseo peralta, BIC del Ambito nacional que contempla el desarrollo de actividades de investigación constructiva y tipológica que contenga la evolución constructiva del inmueble debidamente graficada, levantamiento arquitectónico y topográfico de la estructura, Estudios técnicos que contempla el análisis de humedades, estado estructura de maderas, redes existentes: eléctricas e hidrosanitarias, estudio geotécnico, estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica, y diseño del proyecto de la intervención de restauración con el desarrollo de actividades de diseño redes eléctricas, voz y datos, hidrosanitarias y de seguridad, proyecto arquitectónico funcional y reforzamiento estructural y el presupuesto programación de las obras de intervención.

VALOR INICIAL : \$800.000.000  
 VALOR ADICION : \$ 35.000.000  
 FECHA DE INICIO : 19 de julio de 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 31 de diciembre del 2024

Para el desarrollo del Convenio se realizaron los siguientes contratos derivados:

### CONTRATO DE OBRA No. 253 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO PERALRA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

VALOR INICIAL : \$ 625.069.999  
 VALOR FRENTE 1 : \$ 625.069.999  
 VALOR APORTE MIN CULTURA : \$ 500.000.000  
 PLAZO : 5 Meses  
 FECHA DE INICIO : 23 de octubre de 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 22 de enero de 2024  
 FECHA DE TERM. : 02 de junio de 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO  
 PORCENTAJE AVANCE FISICO : 64%

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 252 DE FECHA 29 de septiembre de 2023**  
**“INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”**

VALOR INICIAL	:	\$174.358.800
VALOR ADICIONAL	:	\$ 35.000.000
VALOR FRENTE 2	:	<b>\$209.358.800</b>
VALOR ANTICIPO	:	\$ 83.745.520
PLAZO	:	5meses
FECHA DE INICIO	:	23 de octubre de 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	22 de enero de 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	02 de junio de 2024
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	:	:64%
PORCENTAJE AVANCE FINANCIARO	:	: 40%

**ESTADO DEL CONTRATO:** Dentro de las obligaciones contractuales de la consultoría se encuentra la gestión con la entidad del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, para la revisión del proyecto de intervención del Coliseo Peralta, documento necesario para la aprobación de la licencia de construcción ante la curaduría urbana. Dicha radicación se efectuó el 28 de mayo de 2024, cuando se realizó el cargue del proyecto de intervención del Coliseo Peralta mediante la plataforma S.I.P.A., ante la entidad del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, y se efectuó la apertura e inscripción del proyecto de restauración del Coliseo Peralta para el proceso de revisión del proyecto, con registro de radicación No. MC20234E2024. Una vez recibido el registro de radicación por la entidad mencionada, se requiere generar una suspensión del contrato 253, ya que los tiempos de pronunciamiento de un tercero no pueden ser imputables al contratista para la revisión del proyecto previo a la radicación ante la curaduría. Además, se ha radicado la evidencia de la radicación en la plataforma SIPA. Igualmente, el 28 de mayo de 2024, se radicó el proyecto de intervención ante la Secretaría de Planeación para su revisión y aprobación por parte de dicha entidad.

## 5. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 163 DE 2022:** “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO MALLA INCAL NIT: 901606477-1 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$31.221.573.233,00
<b>VALOR ACUMULADO:</b>	\$31.221.573.233,00
<b>PLAZO INICIAL:</b>	6 MESES
<b>PRORROGA No. 1:</b>	6 MESES
<b>PRORROGA No. 2</b>	3 MESES
<b>PRORROGA No. 3</b>	5 MESES
<b>PRORROGA No. 4</b>	14 DÍAS
<b>PLAZO TOTAL:</b>	20 MESES Y 14 DÍAS
<b>INTERVENTORÍA:</b>	SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901114547-5
<b>FECHA DE INICIO:</b>	30 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN :</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	12 DE FEBRERO DE 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	05 DE JULIO DE 2024
<b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>	EN EJECUCIÓN
<b>PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:</b>	86,17 %



**ESTADO DEL CONTRATO:** A la fecha 14 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal y 4 frentes se encuentran en ejecución con la instalación de tubería eléctrica, redes sanitarias, redes de acueducto, piso travertino, pavimento rígido y demás actividades preliminares.

14 frentes con terminados en travertino y calzada vehicular

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12
- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13

4 frentes en intervención con actividades preliminares y ejecución de acabados.


- Carrera 10 entre calles 41 y 42
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato, se realizaron actividades en 11 frentes.

- **Carrera 10 entre calles 37 y 41:** Se han realizado actividades de adecuación de cajas eléctricas de media tensión y alumbrado público, con la instalación de tapas, aplicación de sellante en losas de concreto.
- **Carrera 10 entre calles 41 y 42:** se ha realizó instalación de piso peatonal en piedra travertino, instalación de tubería para redes eléctricas de alumbrado público y de baja tensión, instalación de canales de monoblock y adecuación de tubería sanitaria para desagüe a pozo de inspección.
- **Carrera 10 entre calles 42 y 43:** instalación piso peatonal en travertino, instalación de tubería para redes eléctricas de AP, adecuación de cajas eléctricas y replanteo de niveles en capa de base granular sobre calzada vehicular.
- **Carrera 10 entre calles 43 y 44:** Instalación de tubería sanitaria y acometidas domiciliarias, instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de baja tensión y alumbrado público, instalación de piso peatonal en piedra travertino costado oriental, fundida de franja de ajuste.
- **Carrera 11 entre calles 37 y 41:** Se realizó instalación de cable para redes de Media tensión para usuarios no regulados de la procuraduría, policía Nacional y Migración, instalación de tramo piso peatonal en piedra travertino.
- **Carrera 11 entre calles 43 y 44:** se realizó adecuación rampa de acceso peatonal en bomberos e instalación de cableado para luminarias.
- **Carrera 12 entre calles 36 y 37:** Se ha realizado adecuación de caja de media tensión en calzada vehicular con instalación de tapas en concreto reforzado.
- **Carrera 12 entre calles 41 y 42:** Se realizó fundida de tramo de calzada vehicular en concreto MR-42, y su respectivo sellado de juntas de dilatación, se hizo adecuación de entrada a colegio Fátima, se realizó construcción de cajas eléctricas de media tensión en la entrada al parqueadero de la policía.
- **Calle 41 entre carreras 9 y 10:** Se realizaron actividades de adecuación con subbase granular para instalación de adoquín en concreto peatonal en zona de la intersección de la calle 41 con la carrera 9 costado sur.
- **Calle 41 entre carreras 10 y 11:** Se ha venido realizando la instalación de la estructura metálica de soporte del deck, se realizó construcción de escalones para acceso a zona del monumento.
- **Calle 41 entre carreras 12 y 13:** Se realizó instalación de cableado para red de media tensión usuario no regulado "SIJIN", se realizó adecuación e instalación de tapas caja de barrajes, instalación de adoquín peatonal en concreto, instalación de tubería red de media tensión hasta subestación eléctrica 2

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024, se han realizado diferentes actividades así:

### CARRERA 10 ENTRE CALLES 37 Y 41

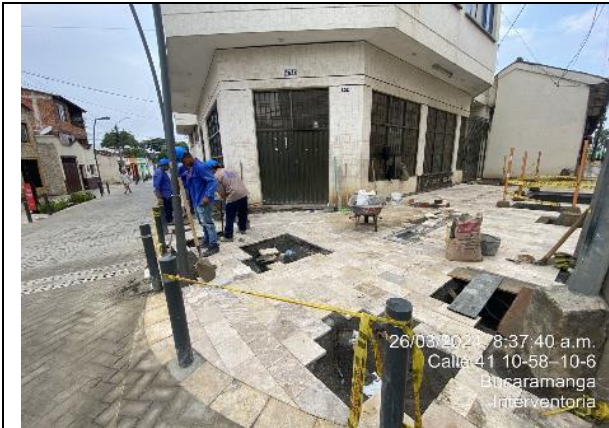

*Instalación piso travertino peatonal*



*Aplicación de sellante en losas de concreto*



*Instalación tapas caja de barrajes*



*Adecuación caja eléctrica vehicular de MT*

### CARRERA 10 ENTRE CALLES 41 y 42



*Demolición de pavimento asfáltico*



*Instalación de sardineles y bolardos*





*Instalación piso peatonal en travertino*



*Construcción pozo de inspección  
alcantarillado*

**CARRERA 10 ENTRE CALLES 42 y 43**



*Instalación tubería red eléctrica de AP*



*Instalación piso en travertino peatonal*



*Franja de ajuste costado occidental*



*Escarificación de base granular para  
replanteo de niveles*



### CARRERA 10 ENTRE CALLES 43 y 44



*Instalación tubería red sanitaria 16"*



*Instalación tramo de sardinel prefabricado*



*Instalación tubería red de BT*



*Instalación piso travertino peatonal*

### CARRERA 11 ENTRE CALLES 37 y 41



*Instalación tramo de piso y guía táctil peatonal*



*Instalación cableado red de MT No regulados*



### CARRERA 11 ENTRE CALLES 43 y 44



*Adecuación rampa de acceso peatonal en bomberos*



*Instalación cable para luminarias*

### CARRERA 12 ENTRE CALLES 36 y 37



*Adecuación tapas de caja eléctrica de MT en zona vehicular*



### CARRERA 12 ENTRE CALLES 41 y 42



*Fundida de losas en concreto MR-42*



*Instalación sardinel prefabricado en curva*



**CALLE 41 ENTRE CARRERAS 9 y 10**



*Instalación tubería red de telemáticos*



*Instalación bancas prefabricadas*



*Instalación de cableado para luminarias*



*Adecuación de cajas eléctricas existentes  
costado sur con cra 9*

**CALLE 41 ENTRE CARRERAS 12 y 13**



*Aplicación de sellante sobre losas de  
concreto*



*Instalación de adoquín en concreto peatonal*



*Instalación de marco metálico y tapa de caja  
de barrajes*



*Instalación de cableado XLPE red de Media  
Tensión*



**CONTRATO DE OBRA 198 de 2023 – COASCON SAS “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.**

Valor del contrato:	\$ 1.718.692.419,00
Valor Adicional No 1:	\$ 98.453.564,26
Valor total del Contrato:	\$ 1.817.146.055,26
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Plazo Adicional:	Quince (15) días
Plazo Total	Cuatro (04) meses y Quince (15) días
Fecha de inicio:	16 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2023
Nueva Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2023
Porcentaje avance:	100%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra terminado, se están realizando unas correcciones que solicito la interventoría, para de esta manera dar trámite a firma de Acta de Recibo Final y posterior liquidación

	
<p>Imagen: Espacio Publico Calle 41, finalización de marcación vial, instalación de postería, luminarias, instalación de adoquines</p>	<p>Imagen: Espacio Publico Colegio Camacho Carreño, Finalización de Actividades de Barandas, Escalera, rampa de acceso al colegio, zona verde y zona dura</p>
	
<p>Imagen: Carrera 9na Espacio Publico Colegio Camacho Carreño, entrada posterior, finalización barandas zonas duras rejillas de concreto, ciclisteros</p>	<p>Imagen: Espacio Publico Carrera 9na, finalización de zona dura e iluminación.</p>

**CONTRATO DE OBRA No. 396 DE 2022:** “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR INICIAL: \$ 10.995.207.368

VALOR ADICIONAL 1: \$ 1.817.357.764

VALOR TOTAL: \$ 12.812.565.132

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL 1: UN (01) MESES Y 25 DÍAS

PLAZO ADICIONAL 2: TRES (03) MESES Y 22 DÍAS

PLAZO ADICIONAL 3: DOS (02) MESES

PLAZO TOTAL: QUINCE (15) MESES + 17 DÍAS

FECHA DE INICIO: 06 de MARZO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de AGOSTO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE: 75%

ESTADO CONTRATO: EN EJECUCIÓN

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 75%, (adjunto registro fotográfico).

### PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN







Construcción de Placa Aligerada. Anden de la Plazoleta, calle 36.



**PARQUE GARCIA ROVIRA**








Instalación de piso Sinú Veta, Anden de la Alcaldía, Calle 35.



Cableado de cajas eléctricas, frente a la Iglesia San Laureano.

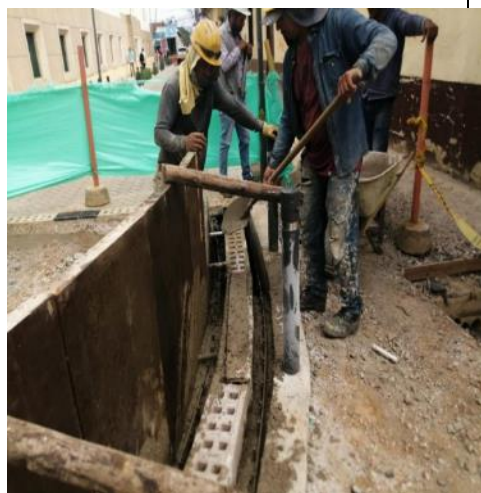





Construcción de canales en la calle 37

**CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022:** “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”


VALOR INICIAL:	\$ 9.702.944.903
VALOR ADICIONAL :	N.A
VALOR TOTAL:	\$ 9.702.944.903
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONAL :	N.A
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE:	18.57%
ESTADO CONTRATO:	SUSPENDIDO

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 18.57%, (adjunto registro fotográfico).


**OBSERVACION:** Una vez la administración municipal contrate una nueva interventoría se dará reinicio al contrato para su culminación.



**TRAMO CRA 26 ENTRE CALLES 32 A LA 33**

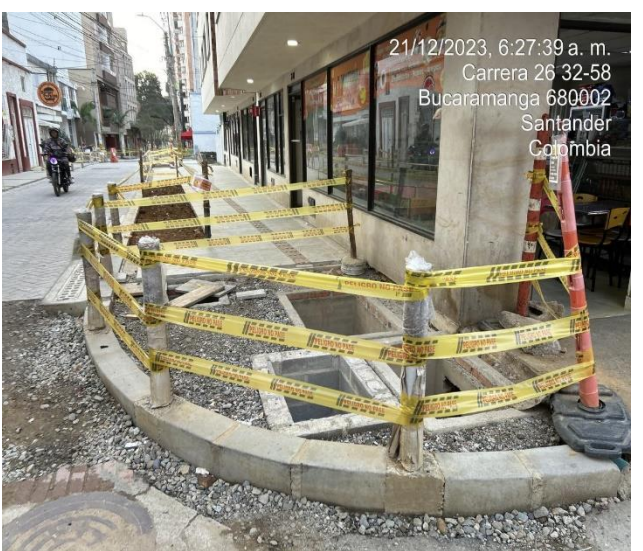

**TRAMO CARRERA 26 ENTRE CALLES 34 A LA 35**

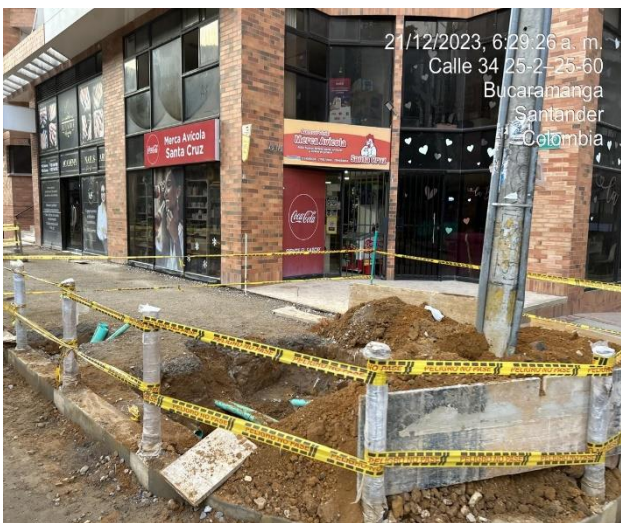

**TRAMO CARRERA 26 ENTRE CALLES 35 A LA 36**





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 310 DEL 09 DE NOVIEMBRE 2023** cuyo objeto es CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B VEREDA SANTA RITA.

<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 866.841.849
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
<b>FECHA INICIAL:</b>	CUATRO (04) DE DICIEMBRE 2023
<b>SUSPENSION No.01:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)
<b>AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.01:</b>	07 DE FEBRERO DE 2024 (19 DIAS)
<b>REINICIO No.01:</b>	26 DE FEBRERO DE 2024
<b>ADICIONAL No.01 EN PLAZO:</b>	26 DE FEBRERO DE 2024 PRORROGA No.01: TRES (03) MESES
<b>MODIFICATORIA No.01</b>	
<b>SUSPENSION No.02:</b>	18 DE JUNIO DE 2024 (15 DIAS)
<b>FECHA FINAL:</b>	18 DE JUNIO DE 2024
<b>PLAZO FINAL:</b>	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
<b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>	SUSPENDIDO
<b>PORCENTAJE DE AVANCE:</b>	40%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempla la intervención del espacio público adyacente al colegio Bosconia sede B en la vereda Santa Rita de Bucaramanga. Durante este período se han llevado a cabo obras preliminares, excavaciones, movimiento de tierras, desmontes y demoliciones, así como la construcción de muros de contención, cimentaciones y cerramientos perimetrales. Estas actividades han asegurado un avance del 40% en la ejecución del proyecto.

<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	
	






## 6. ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 411 DE FECHA 26 de diciembre de 2022:**  
 “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1 (URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS)

VALOR INICIAL	:	\$7.121.453.216,00
VALOR ADICIONAL	:	\$3.596.834.651,54
VALOR TOTAL	:	\$10.718.287.867,54
VALOR ANTICIPO	:	\$3.596.834.651,54
PLAZO INICIAL	:	6 MESES
FECHA DE INICIO	:	24 DE ENERO DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	31 DE DICIEMBRE 2023
NUEVA FECHA DE TERM.	:	En evaluación de reinicio
ESTADO DEL CONTRATO:	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	90.67%
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 99.0%		

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra en SUSPENSION, limpieza, acabados, garantía y generación de certificación Retie posteriormente Retilap, medidor de agua y aprobación por el operador de red de la subestación eléctrica.

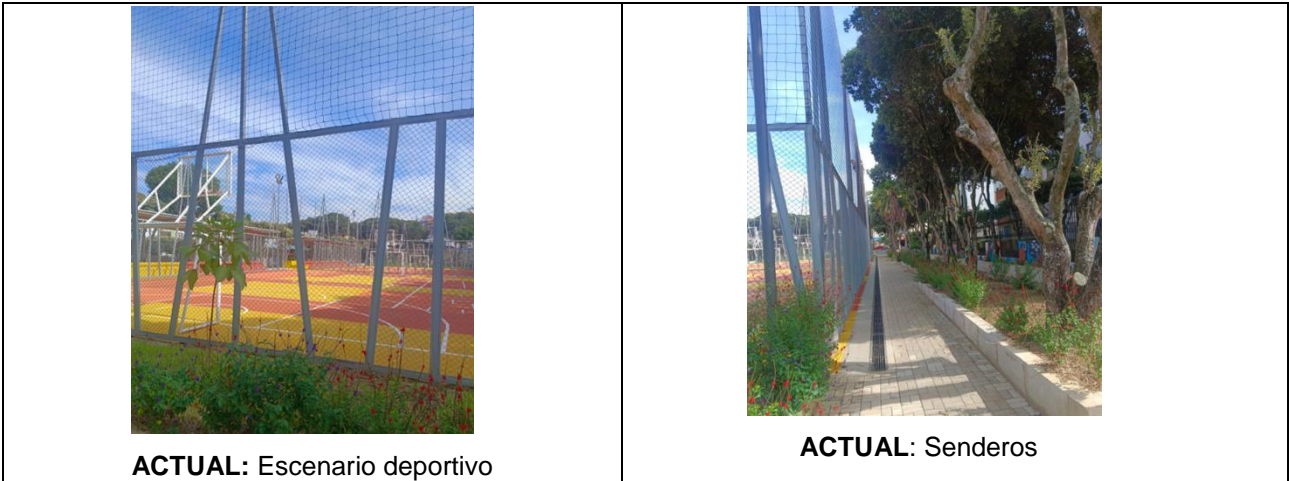

**ACTUAL:** Escenario deportivo

**ACTUAL:** Senderos



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 412 DE FECHA 26 de diciembre de 2022:**  
 “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2 (BULEVAR BOLÍVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO)

VALOR INICIAL	:	\$ 3.173.961.189,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 1.586.967.843,69
VALOR TOTAL	:	\$ 4.760.929.032,69
VALOR ANTICIPO	:	\$ 1.428.278.709,81
PLAZO INICIAL	:	7 MESES
FECHA DE INICIO	:	24 DE ENERO DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	12 DE ABRIL 2023
NUEVA FECHA DE TERM.	:	18 DE MAYO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:		PLAZO FINALIZADO
PORCENTAJE AVANCE	:	99. %
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 99. %		

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra plazo finalizado, proceso de entrega y recibo final, limpieza, acabados, garantía, Retilap y aprobación por el operador de red de la subestación eléctrica.







**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 414 DE FECHA 26 de diciembre de 2022:**  
 “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2 (BULEVAR BOLÍVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO)

VALOR INICIAL	:	\$ 3.374.175.743,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 1.883.664.200,10
VALOR TOTAL	:	\$ 5.257.839.943,10
VALOR ANTICIPO	:	\$ 1.518.208.122,12
PLAZO INICIAL	:	7 MESES
FECHA DE INICIO	:	24 DE ENERO DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	22 DE DICIEMBRE 2023
NUEVA FECHA DE TERM.	:	13 DE JUNIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	PLAZO FINALIZADO
PORCENTAJE AVANCE	:	100 %
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 99. %		

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra plazo finalizado, proceso de entrega y recibo final, limpieza, acabados, garantía, visita técnica por alumbrado público.





Zona interna

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 285 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:  
MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE  
BUCARAMANGA – LOTE 1º Carrera 27 Calle 9- Calle 34**

VALOR INICIAL	:	\$ 1.542.848.948,00
VALOR ADICIONAL	:	
VALOR TOTAL	:	\$ 1.542.848.948,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 462.854.684,40
PLAZO INICIAL	:	80 DIAS
FECHA DE INICIO	:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	18 DE FEBRERO 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	28 DE ABRIL 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	22. %
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO:	:	22. %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido, canalizaciones eléctricas obstruida, llegada al punto de conexión.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vial



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 286 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:**  
 “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE  
 BUCARAMANGA – LOTE 2” Carrera 27 Calle 34- Puerta del sol.

VALOR INICIAL : \$ 1.522.075.669,89  
 VALOR ADICIONAL :  
 VALOR TOTAL : \$ 1.522.075.669,89  
 VALOR ANTICIPO : \$ 456.622.700,97  
 PLAZO INICIAL : 80 DIAS  
 FECHA DE INICIO : 29 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 18 DE FEBRERO 2024  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 28 DE ABRIL 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO  
 PORCENTAJE AVANCE : 46. %  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 46. %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Vial

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 287 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:**  
 “MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE  
 BUCARAMANGA – LOTE 3” Calle 36

VALOR INICIAL : \$ 1.498.472.490,53  
 VALOR ADICIONAL :  
 VALOR TOTAL : \$ 1.498.472.490,53  
 VALOR ANTICIPO : \$ 449.541.747,16  
 PLAZO INICIAL : 80 DIAS  
 FECHA DE INICIO : 29 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 18 DE FEBRERO 2024  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 28 DE ABRIL 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO  
 PORCENTAJE AVANCE : 23. %  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 23. %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido, canalizaciones eléctricas obstruida, llegada al punto de conexión.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Vial

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 291 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:**  
**“MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE**  
**BUCARAMANGA – LOTE 4” Carrera 15.**

VALOR INICIAL	:	\$ 1.444.130.820,00
VALOR ADICIONAL	:	
VALOR TOTAL	:	\$ 1.444.130.820,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 433.239.246,00
PLAZO INICIAL	:	80 DIAS
FECHA DE INICIO	:	28 DE MOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	17 DE FEBRERO 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	21 DE MAYO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	37.9 %
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO:	:	37.9 %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Carrera 15



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 288 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:**  
**“MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 5” Avenida quebrada seca.**

VALOR INICIAL : \$ 1.209.155.465,00  
 VALOR ADICIONAL :  
 VALOR TOTAL : \$ 1.209.155.465,00  
 VALOR ANTICIPO : \$ 362.746.639,50  
 PLAZO INICIAL : 80 DIAS  
 FECHA DE INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 17 DE FEBRERO 2024  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 21 DE MAYO 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO  
 PORCENTAJE AVANCE : 56.2 %  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 56.2 %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




**Avenida quebrada seca**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 289 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:**  
**“MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 6” Avenida Gonzales valencia.**

VALOR INICIAL : \$ 836.362.735,00  
 VALOR ADICIONAL :  
 VALOR TOTAL : \$ 836.362.735,00  
 VALOR ANTICIPO : \$ 250.908.820,00  
 PLAZO INICIAL : 80 DIAS  
 FECHA DE INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 17 DE FEBRERO 2024  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 30 DE MAYO 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO  
 PORCENTAJE AVANCE : 26. %  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 26. %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido, canalizaciones eléctricas obstruida, llegada al punto de conexión.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

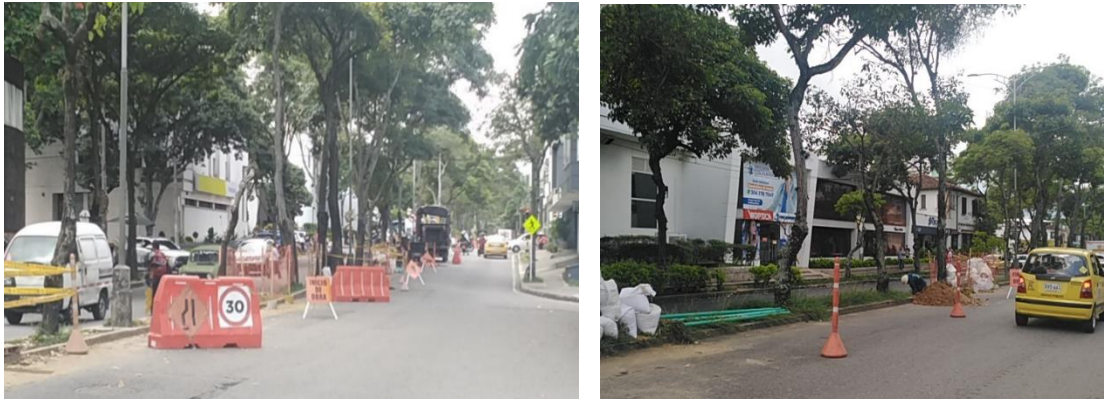

**Avenida Gonzales Valencia**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 290 DE FECHA 03 de noviembre del 2023:**  
**“MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE**  
**BUCARAMANGA – LOTE 6” Avenida la rosita.**

VALOR INICIAL	:	\$ 897.152.256,00
VALOR ADICIONAL	:	
VALOR TOTAL	:	\$ 897.152.256,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 269.145.676,80
PLAZO INICIAL	:	80 DIAS
FECHA DE INICIO	:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	17 DE FEBRERO 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	30 DE MAYO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	24. %
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO:	:	24. %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido, canalizaciones eléctricas obstruida, llegada al punto de conexión.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 332 DE FECHA 23 de noviembre del 2023:**  
**“AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO**  
**DE BUCARAMANGA, SANTANDER” Corregimiento 1 y 2.**

VALOR INICIAL	:	\$ 1.659.990.756,00
VALOR ADICIONAL	:	
VALOR TOTAL	:	\$ 1.659.990.756,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 829.995.378,00
PLAZO INICIAL	:	2 MESES
FECHA DE INICIO	:	15 DE ABRIL DE 2024
FECHA TERM. INICIAL.	:	14 DE JUNIO 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	14 DE JUNIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	34.5 %
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO:	:	34.5 %

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra suspendido.







**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 138 DE FECHA 22 de junio del 2023:  
“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
– GRUPO No 1”**

VALOR INICIAL	:	\$ 1.122.746.611,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 561.373.305,50
VALOR TOTAL	:	\$ 1.684.119.916,50
VALOR ANTICIPO	:	
PLAZO INICIAL	:	7 MESES
FECHA DE INICIO	:	24 DE JULIO DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	23 DE FEBRERO 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	26 DE JULIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	EJECUCION
PORCENTAJE AVANCE	:	87.61%
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 87.61%		

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra en ejecución, atendiendo los diferentes eventos que se registren.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 139 DE FECHA 22 de junio del 2023:**  
**“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**  
**– GRUPO No 2”**

VALOR INICIAL : \$ 1.140.646.311,00  
 VALOR ADICIONAL : \$ 570.323.155,50  
 VALOR TOTAL : \$ 1.710.969.466,50  
 VALOR ANTICIPO :  
 PLAZO INICIAL : 7 MESES  
 FECHA DE INICIO : 24 DE JULIO DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 23 DE FEBRERO 2024  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 26 DE JULIO 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: EJECUCION  
 PORCENTAJE AVANCE : 87.61%  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 87.61%

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra en ejecución, atendiendo los diferentes eventos que se registren.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140 DE FECHA 22 de junio del 2023:**  
**“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**  
**– GRUPO No 3”**

VALOR INICIAL : \$ 1.124.731.209,00  
 VALOR ADICIONAL : \$ 562.365.604,50  
 VALOR TOTAL : \$ 1.687.096.813,50  
 VALOR ANTICIPO :  
 PLAZO INICIAL : 7 MESES  
 FECHA DE INICIO : 24 DE JULIO DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 23 DE FEBRERO 2024  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 26 DE JULIO 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: EJECUCION  
 PORCENTAJE AVANCE : 87.61%  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 87.61%

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra en ejecución, atendiendo los diferentes eventos que se registren.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 DE FECHA 22 de junio del 2023:**  
**“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**  
**– GRUPO No 4”**

VALOR INICIAL	:	\$ 1.036.925.512,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 518.462.756,00
VALOR TOTAL	:	\$ 1.555.388.268,00
VALOR ANTICIPO	:	
PLAZO INICIAL	:	7 MESES
FECHA DE INICIO	:	24 DE JULIO DE 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	23 DE FEBRERO 2024
NUEVA FECHA DE TERM.	:	26 DE JULIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO:		EJECUCION
PORCENTAJE AVANCE	:	87.61%
PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO:		87.61%

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra en ejecución, atendiendo los diferentes eventos que se registren.







**MANTENIMIENTO**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141 DE FECHA 29 de septiembre del 2023:**  
 “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR INICIAL : \$ 464.512.725,00  
 VALOR ADICIONAL :  
 VALOR TOTAL : \$ 464.512.725,00  
 VALOR ANTICIPO : \$ 139.353.817,50  
 PLAZO INICIAL : 3 MESES  
 FECHA DE INICIO : 04 DE OCTUBRE DE 2023  
 FECHA TERM. INICIAL. : 31 DE DICIEMBRE 2023  
 NUEVA FECHA DE TERM. : 09 DE SEPTIEMBRE 2024  
 ESTADO DEL CONTRATO: EJECUCION  
 PORCENTAJE AVANCE : 12 %  
 PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 12%

**ESTADO DEL CONTRATO:** Se encuentra en ejecución.

**7. MALLA VIAL URBANA Y RURAL**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 405 DE 2022:** “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 1”.

VALOR INICIAL:	\$ 7.542.347.806
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 2.992.039.448
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 1.182.389.445
VALOR TOTAL:	\$ 11.716.776.699
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL:	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE JUNIO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE:	100%
ESTADO CONTRATO:	EN TRAMITE DE LIQUIDACION

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra ejecutado un avance del 100%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 1, 2, 3, 4, 13,14 Y 15 de la ciudad.

N°	BARRIO
1	VILLA ALEGRÍA I (PARTICIPATIVO)
2	MARIA PAZ (PARTICIPATIVO)
3	LA AURORA (PARTICIPATIVO)
4	BUENOS AIRES (PARTICIPATIVO)
5	VENADO DE ORO (PARTICIPATIVO)
6	EL DIVISO (PARTICIPATIVO)
7	VIA NACIONAL BUCARAMANGA – CUCUTA
8	VEGAS DE MORRORICO (PARTICIPATIVO)
9	EL CINAL (PARTICIPATIVO)
10	EL PRADO
11	DEPRIMIDO MESÓN DE LOS BÚCAROS
12	MEJORAS PÚBLICAS
13	LOS ALPES
14	BUENAVISTA (PARTICIPATIVO)
15	GARCÍA ROVIRA

<b>Barrio: Villa Alegría I</b>	
<b>Dirección:</b> Calle 28A norte desde la carrera 11 hasta la carrera 9	<b>Participativo</b>
	
<b>Descripción:</b> Marca Vial con pintura en frio.	



<b>Barrio: María Paz</b>	
<b>Dirección:</b> Calle 15A norte desde la carrera 2A (Pavimento existente), hasta la carrera 1	<b>Participativo</b>
 <p>#María Paz #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 11:02:57 a. m. 7°8'51"N - 73°8'27"W</p>	 <p>#María Paz #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 10:54:11 a. m. 7°8'50"N - 73°8'28"W</p>
<b>Descripción:</b> Adecuación de andenes concreto de 3000 Psi	<b>Descripción:</b> Instalación rejilla sumidero.

ALPES PARTICIPATIVO			ÁREA INTERVENIDA
DIRECCIÓN	FOTO ANTES	FOTO DESPUES	
Calle 31 entre cra 41 y 43	 <p>19/02/24, 9:10 N 7° 7' 46" W 73° 6' 34" CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>14/03/2024, 9:21:27 a.m. N 7° 7' 46" W 73° 5' 34" 347 Santander Consortio Provenza Calle 31 con Carrera 43 Barrio Alpes</p>	1153,64 M2
	 <p>19/02/24, 9:10 N 7° 7' 46" W 73° 6' 34" CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>8/04/24, 9:12 N 7° 7' 46" W 73° 6' 34" CONSORCIO PROVENZA</p>	
	 <p>19/02/24, 9:12 N 7° 7' 48" W 73° 6' 36" CONSORCIO PROVENZA</p>	 <p>8/04/24, 9:15 N 7° 7' 45" W 73° 6' 36" CONSORCIO PROVENZA</p>	

<b>Barrios: San Alonso</b>	
<b>Dirección:</b> Deprimido mesón de los Búcaros	
 <p>#Mesón de los Bucaros #Señalización vial #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 10:31:51 a. m. 7°7'43" N - 73°7'1" W</p>	 <p>#Mesón de los Bucaros #Señalización vial #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 10:31:08 a. m. 7°7'42" N - 73°7'2" W</p>
<b>Descripción:</b> Instalación señalización vertical.	

ÁLVAREZ			ÁREA INTERVENIDA
DIRECCIÓN	FOTO ANTES	FOTO DESPUES	
Calle 32 # 35-04			153,14 M2
Calle 32 # 40-12			86,78 M2
Calle 32 # 43-20			101,01 M2
Calle 32 con cra 44			38,92 M2

Barrio: El Prado	
Dirección: Carrera 36 entre calles 42 y 41	Caja: 1
	
#Caja 1 #Carrera 36 #Calle 42 #lote 1 #Bucaramanga 4/03/2024 8:54:06 p. m. 7°7'18"N -73°6'35"W	#Caja 1 #Calle 41 #Carrera 36 #lote 1 #Bucaramanga 4/03/2024 10:34:33 p. m. 7°7'17"N -73°6'34"W
<b>Descripción:</b> Demarcación de caja	<b>Descripción:</b> Fresado y limpieza





mar, mar 5, 2024 00:39a. m.  
7°7'17" N -73°6'35" W  
malla vial lote #1  
calle42carrera 36  
B/caramanga  
caja #1

**Descripción:** Imprimación CRL-40



mar, mar 5, 2024 04:03a. m.  
7°7'18" N -73°6'35" W  
malla vial lote #1  
calle42carrera 36  
B/caramanga  
caja #1

**Descripción:** Instalación MDC-19

**Barrio: Mejoras Públicas**

**Dirección:** Carrera 32 # 38-67

**Caja: 5**



mié, mar 6, 2024 21:39p. m.  
7°7'19" N -73°6'46" W  
malla vial lote #1  
carrera 32#38-67  
B/caramanga  
caja #5

**Descripción:** Demarcación de caja



mié, mar 6, 2024 22:01p. m.  
7°7'19" N -73°6'46" W  
malla vial lote #1  
carrera 32#38-67  
B/caramanga  
caja #5

**Descripción:** Demarcación de caja



jue, mar 7, 2024 00:38a. m.  
7°7'19" N -73°6'46" W  
malla vial lote #1  
carrera 32 #38-67  
B/caramanga  
caja #5

**Descripción:** Fresado de pavimento e Imprimación CRL-40



jue, mar 7, 2024 03:46a. m.  
7°7'19" N -73°6'46" W  
malla vial lote #1  
carrera 32 #38-67  
B/caramanga  
caja #5

**Descripción:** Instalación MDC-19

**Barrio: García Rovira**

**Dirección:** Cra 9 entre calle 44 y 45 sentido S-N

**Caja: 4**



19/02/2024, 10:37:40 p.m.  
Consorcio Provenza  
Calle 45 con calle 9



mar, feb 20, 2024 02:08a. m.  
malla bial lote #1  
calle45 carrera 19  
B/caramanga

<b>Descripción:</b> Demarcación de caja	<b>Descripción:</b> Fresado, limpieza e imprimación.
 <p>mar, feb 20, 2024 04:17a. m. malla bial lote #1 calle45 carrera 19 B/caramanga</p>	 <p>mar, feb 20, 2024 04:14a. m. malla bial lote #1 calle45 carrera 19 B/caramanga</p>
<b>Descripción:</b> Fresado, limpieza e imprimación.	<b>Descripción:</b> Instalación MDC-19

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 406 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 2”.**


VALOR INICIAL:	\$ 7.007.204.406
VALOR ADICIONAL 1 :	\$1.603.540.991
VALOR ADICIONAL 2 :	\$ 1.085.668.114
VALOR TOTAL:	\$ 9.696.413.511
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL 1 :	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2 :	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	100%
ESTADO CONTRATO:	EN TRAMITE DE LIQUIDACION

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra ejecutado con un avance del 100%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 5, 6,7, 8, 9,10, 11,12 y 17 de la ciudad.



<b>Barrio: Mercedes</b>	
<b>Dirección: Calle 58 #32-98</b>	<b>Cajas: 909.1</b>
 <p>28/02/24 9:17 p. m. 7°6'33"N - 73°6'35"W Bucaramanga Calle 58#32-98 lote 2</p>	 <p>Jue, febrero 29, 2024 04:43 a. m. obra mailla Vial lote 2</p>
Foto Antes	Foto Después

 <p>4/03/2024 7° 6' 6" N, 73° 6' 21" W Bucaramanga Guayacanes</p>	 <p>4/03/2024 7° 6' 8" N, 73° 6' 23" W Bucaramanga Guayacanes</p>
<b>Descripción: Instalación Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19</b>	

<b>Barrio: Cabecera del Llano</b>	
<b>Dirección: Calle 53 entre Carreras 36 – 37</b>	<b>Caja: 904</b>
 <p>26/02/24 10:40 p. m. 7°6'44"N - 73°6'28"W Bucaramanga Calle 53#36-43 lote 2</p>	 <p>mar, febrero 27, 2024 04:34 a. m. obra mailla Vial lote 2</p>
Foto Antes	Foto Después



<b>Barrio: Concordia</b>	
<b>Dirección: Carrera 39 #65-37</b>	<b>Cajas: 922</b>
	
Foto Antes	Foto Después

<b>Barrio: PROVENZA</b>	
<b>Dirección: PARALELA A LA AUTOPISTA PROVENZA</b>	<b>Cajas: 926</b>
	
Foto Antes	Foto Después

<b>Barrio: Quintas del Cacique</b>	
<b>Dirección: Carrera 49 # 73ª - 44</b>	<b>REDUCTOR DE VELOCIDAD PARABÓLICO</b>
	
Foto Durante	Foto Después





**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 de 2023:** AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – COMANDO DE INGENIEROS – BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 05 “CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS” ” A TRAVES DE LA CENAC ESP ING PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CONFORME AL ALCANCE DEL ACUERDO.

VALOR INICIAL:	\$ 3.061.685.511
VALOR ADICIONAL :	N.A
VALOR TOTAL:	\$ 3.061.685.511
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL :	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	44,5%
ESTADO CONTRATO:	EN LIQUIDACION

**ESTADO DEL CONTRATO:** El convenio interadministrativo se encuentra en liquidación bilateral debido a inconvenientes técnicos en la maquinaria del ejército nacional, con un avance físico del 44.5%, se realizaron actividades como: construcción en losas de concreto, construcción y pavimentación de vías en concreto flexible actividades de socialización y actas de vecindad – Comuna 1 y 2. Barrios Colorados, Café Madrid, Portal de los ángeles, Kennedy, Esperanza III.

	
<p>PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO KENNEDY</p>	<p>PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO KENNEDY</p>

	
<p>PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO LOS COLORADOS</p>	<p>PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO LOS COLORADOS</p>

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 215 DE 2023:** SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2

VALOR INICIAL: \$ 103.793.736,92

VALOR ADICIONAL : N.A

VALOR TOTAL: \$ 103.793.736,92

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

PLAZO ADICIONAL : N.A.



PLAZO TOTAL: CUATRO (04) MESES  
FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023  
PORCENTAJE AVANCE: 100 %  
ESTADO CONTRATO: ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN.

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en etapa de recibo final y liquidación con un avance en tiempo del 100%, hasta el momento se han adelantado actividades de entrega total de insumos.

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 216 DE 2023:** SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE No. 3

VALOR INICIAL: \$ 497.646.161  
VALOR ADICIONAL : N.A  
VALOR TOTAL: \$ 497.646.161  
  
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES  
PLAZO ADICIONAL : CINCO (05) MESES  
PLAZO TOTAL: NUEVE (09) MESES  
FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE MAYO DE 2024  
PORCENTAJE AVANCE: 28%  
ESTADO CONTRATO: EN LIQUIDACION

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra liquidación con un avance Físico del 28%, hasta el momento se adelantaron actividades como la entrega parcial de insumos. Se da su liquidación con un porcentaje de avance muy bajo, debido a la culminación del convenio interadministrativo No. 157 con el Ejército Nacional.

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 230 DE 2023:** SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 1

VALOR INICIAL: \$ 2.119.924.300  
VALOR ADICIONAL : N.A

VALOR TOTAL: \$ 2.119.924.300

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

PLAZO ADICIONAL : CINCO (05) MESES

PLAZO TOTAL: NUEVE (09) MESES

FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO DE 2024

PORCENTAJE AVANCE: 48%

ESTADO CONTRATO: EN EJECUCIÓN.

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra liquidación con un avance Físico del 48%, hasta el momento se adelantaron actividades como la entrega parcial de insumos. Se da su liquidación con un porcentaje de avance muy bajo, debido a la culminación del convenio interadministrativo No. 157 con el Ejército Nacional.

**CONTRATO DE OBRA 418 del 27 diciembre 2022 - CONSORCIO JASC 2022**  
**“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria de los Corregimientos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga” – Lote 1**

VALOR INICIAL:	\$ 2.130.769.633
ADICIONAL 01:	\$ 901.028.598,20
VALOR TOTAL:	\$ 3.031.798.231
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2023
SUSPENSION No.01:	08 DE AGOSTO DE 2023 (15 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.01:	23 DE AGOSTO DE 2023 (30 DIAS)
AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No.01:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (20 DIAS)
AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No.01:	12 DE OCTUBRE DE 2023 (10 DIAS)
REINICIO No.01:	20 DE OCTUBRE DE 2023
	25 DE OCTUBRE DE 2023
ADICIONAL No.01 EN VALOR Y PLAZO:	PRORROGA No.01: DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS
	VALOR: \$ 901.028.598,20
SUSPENSION No.02:	10 DE ENERO DE 2024 (45 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.02:	24 DE FEBRERO 2024 (60 DIAS)
REINICIO No.02:	24 DE ABRIL DE 2024
	25 DE ABRIL DE 2024
ADICIONAL No.02 EN PLAZO	PRORROGA No.02: CUARENTA (45) DIAS CALENDARIO
FECHA FINAL:	15 DE JUNIO DE 2024
PLAZO FINAL:	NUEVE (09) MESES Y CINCO (05) DIAS
ESTADO DEL CONTRATO:	EN PROCESO DE RECIBO Y LIQUIDACION
PORCENTAJE DE AVANCE:	100%



**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto se encuentra en el 100% de ejecución y el contrato en proceso de recibo y liquidación. En este proyecto, se han construido 1.7 km de placa huella conforme a las especificaciones técnicas para carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), junto con otras obras complementarias como muros de contención y obras para el control de aguas de escorrentía. Estas acciones se llevaron a cabo en el Corregimiento 1, específicamente en las veredas Angelinos, San Pedro Bajo, La Sabana, La Esmeralda, Aburrido Bajo, San Pedro Bajo, San Cayetano, Santa Rita y Vijagual.

**CUADRO DE AVANCE GRUPO 1 PLACA HUELLAS**

TRAMO	VEREDA	SECTOR	PLACA HUELLAS (m)	EJECUTADO TOTAL
				%
1	Angelinos	Inicio ramal al tanque	47	100,00%
2	Angelinos	Finca La Esperanza	92	100,00%
3	Angelinos	Finca Pajitas	60	100,00%
4	San Pedro Bajo	Balneario La Vega	120	100,00%
5	San Pedro Bajo	Miramar	100	100,00%
6	La Sabana	La Y. Finca El Rubí	100	100,00%
7	La Sabana	Finca Mi Paraiso	100	100,00%
8	La Esmeralda	El Calzo	168	20,00%
9	El Aburrido Bajo	La Esperanza	175	95,00%
10	San Pedro Bajo	El Arenal	120	100,00%
11	San Pedro Bajo	Las Marraneras	120	100,00%
12	San Cayetano	Escuela	126,5	100,00%
13	Santa Rita	Capilla Alta- Magüeyes tramo 1	100	100,00%
14	Santa Rita	Capilla Alta- Magüeyes tramo 2	150	100,00%
15	VIAJAGUAL	TIENDA ROJA	184	100,00%
<b>TOTALES</b>			<b>1762,5</b>	

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





**CONTRATO DE OBRA 419 del 37 de diciembre de 2022- RURAL BUCARAMANGA “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” – Lote 2**

VALOR INICIAL:	\$ 1.860.497.004,65
ADICIONAL 01:	\$ 725.657.760
VALOR TOTAL:	\$ 2.586.154.764,65
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION No.01:	28 DE JULIO DE 2023 (15 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.01:	12 DE AGOSTO DE 2023 (15 DIAS)
AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No.01:	26 DE AGOSTO DE 2023 (20 DIAS)
AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No.01:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (30 DIAS)
AMPLIACION No.04 A LA SUSPENSION No.01:	15 DE OCTUBRE 2023 (08 DIAS)
REINICIO No.01:	23 DE OCTUBRE DE 2024
	25 DE OCTUBRE DE 2024
ADICIONAL No.01 EN VALOR Y PLAZO:	PRORROGA No.01: DOS (02) MESES
	VALOR: \$ 725.657.760
SUSPENSION No.02:	09 DE ENERO 2024 (30 DIAS)
AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.02:	09 DE FEBRERO 2024 (30 DIAS)
AMPLIACION No.02 A LA SUSPENSION No.02:	09 DE MARZO 2024 (30 DIAS)
AMPLIACION No.03 A LA SUSPENSION No.02:	09 DE ABRIL 2024 (15 DIAS)
REINICIO No.02:	24 DE ABRIL 2024
	25 DE ABRIL 2024
ADICIONAL No.02 EN PLAZO	PRORROGA No.02: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
SUSPENSION No.03:	14 DE JUNIO 2024 (20 DIAS)
FECHA FINAL:	14 DE JUNIO 2024
PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ESTADO DEL CONTRATO:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE DE AVANCE:	90%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto se encuentra en un 90% de ejecución y actualmente suspendido debido a las lluvias que afectaron el ingreso de material para culminar tramos finales. En este proyecto, se han construido 1.7 km de placa huella conforme a las especificaciones técnicas para carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), junto con otras obras complementarias como muros de contención y obras para el control de aguas de escorrentía. Estas acciones se llevaron a cabo en el Corregimiento 2 y 3 en las veredas Capilla Alta, Monserrate, Bolarqui Bajo, San José, Pedregal, Retiro chiquito, Gualilo Alto, Galilo y Santa Barbara.



**GRUPO 2 - C2 - PLACAS HUELLAS**

No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE	ESTADO
1	Corregimiento 2	Capilla alta	Finca El Guarumo - Finca Esquinita	Placa huella L=170 M	170	90%	EJECUCION
2	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela	Placa huella L=150 M	106	100%	TERMINADO
3	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela II	Placa huella L=100 M	144	100%	TERMINADO
4	Corregimiento 2	Vereda Monserrate	Sector El Embalse Tona	Placa huella L=200 M	140	70%	EN EJECUCION
5	Corregimiento 2	Vereda Bolarqui Bajo		Tramo Adicional	60	100%	TERMINADO

**GRUPO 2 - C2 - OBRAS DE ARTE**

	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	Cantidad	% AVANCE	ESTADO
6	Corregimiento 2	Bolarqui Bajo	Sector el guayabito	Muro de estabilización.	1	100%	TERMINADO

**GRUPO 2 - C3 - PLACAS HUELLAS**

No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE	ESTADO
7	Corregimiento 3	San José	Gruta de la virgen casa No.50	Placa huella L=150 M	106	100%	TERMINADO
8	Corregimiento 3	San José	Sector casa roja - finca Genaro	Placa huella L=52 M	66	100%	TERMINADO
9	Corregimiento 3	El Pedregal	Sector El mango	Placa huella L=190 M	138	100%	TERMINADO
10	Corregimiento 3	El Pedregal	Finca Villa Laura curva 1 y 2	Placa huella L=37 M	37	100%	TERMINADO
11	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector Curva el miedo	Placa huella L=200 M	80	100%	EN EJECUCION
12	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 1.	Placa huella L=100 M	126	100%	TERMINADO
13	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 2.	Tramo Adicional	80	100%	TERMINADO
14	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.1.	Tramo Adicional	70	100%	POR INICIAR
15	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.2.	Tramo Adicional	70	100%	TERMINADO
16	Corregimiento 3	Gualilo.	La Malaña.	Tramo Adicional	70	5%	EJECUCION
17	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Udes.	Tramo Adicional	80	100%	TERMINADO
18	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Antena.	Tramo Adicional	80	100%	TERMINADO
<b>LONGITUD TOTAL</b>					<b>1.623,00</b>		





## 8. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 171 DE 2023 - ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA** “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA, Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO (INDIVIDUALES) DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECIFICOS DEFINIDOS”.

Valor del contrato:	\$ 5.717.873.362,00
	Aporte Municipio \$ 4.671.830.671,00
	Aporte Convenido \$ 1.046.042.692,22
Plazo inicial:	Cinco (5) meses y Quince (15) días
Fecha de inicio:	22 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2023
Porcentaje avance:	0%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra suspendido, y en trámites de obtener la aprobación por parte del ente ambiental (CDBM).

## 9. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO



**CONTRATO DE OBRA 106 de 2023 - : CONSORCIO GAITAN “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

Valor del contrato: \$ 16.639.364.368,41  
 Plazo inicial: Trece (13) meses  
 Fecha de inicio: 01 de agosto de 2023  
 Fecha de terminación: 30 de agosto de 2024  
 Porcentaje avance: 90%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado actividades como: excavaciones, anclajes, concreto lanzado, perfilado, instalación de parrilla y malla electrosoldada, construcción de obras hidráulicas (canaletas y disipadores de energía) y tensionamiento de los elementos previamente instalados de acuerdo al cumplimiento de la norma técnica del concreto.

 <p>21/5/2024 1:14:08 p. m. Bucaramanga carrera 14 12-1 comuna 4 occidental Bucaramanga Santander OLH S.A.S</p>	 <p>23/5/2024 3:17:49 p. m. Bucaramanga carrera 14 12-1 comuna 4 occidental Bucaramanga Santander OLH S.A.S</p>
<p><b>Imagen: Tensionamiento de los elementos previamente instalados</b></p>	<p><b>Imagen: Construcción de obras hidráulicas (canaletas)</b></p>
 <p>27/5/2024 9:22:52 a. m. Bucaramanga carrera 14 12-1 comuna 4 occidental Bucaramanga Santander OLH S.A.S</p>	 <p>31/5/2024 8:40:27 a. m. Bucaramanga carrera 14 12-1 comuna 4 occidental Bucaramanga Santander OLH S.A.S</p>
<p><b>Imagen: Perfilado del terreno</b></p>	<p><b>Imagen: construcción de obras hidráulicas (disipadores de energía)</b></p>



**CONTRATO DE OBRA 104 de 2023 - : CONSORCIO GESA “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.**

Valor fiscal: \$ 64.809.568.908,48  
 Plazo inicial: Doce (12) meses  
 Fecha de inicio: 29 de agosto de 2023  
 Fecha de terminación: 28 de agosto de 2024  
 Porcentaje avance: 90 %

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado las siguientes actividades por frentes:

Frente Nazareth: Tensionamiento de los elementos  
 Frente la Gloria: Construcción de obras hidráulicas, perfilado, instalación de malla electrosoldada y parrillas y lanzado de concreto  
 Frente Pablo VI: Perforación e instalación de anclajes activos, perfilado del terreno, excavación a tajo abierto de talud y retiro de escombros

	
<p>Imagen: Construcción de obras hidráulicas en el frente de la Gloria</p>	<p>Imagen: Instalación de malla electrosoldada en el frente de la Gloria</p>
	
<p>Imagen: Tensionamiento de los elementos en el frente Nazareth</p>	<p>Imagen: Tensionamiento de los elementos en el frente Nazareth</p>
	
<p>Imagen: Perforación e instalación de anclajes activos en el frente Pablo VI</p>	<p>Imagen: Perfilado del terreno en el frente Pablo VI</p>



**CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 - : CONSORCIO LA FLORA 2023**  
**“CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.**

Valor fiscal: \$ 40.514.056.133,00  
 Plazo inicial: Dieciocho (18) meses  
 Fecha de inicio: 05 de mayo de 2023  
 Fecha de terminación: 04 de noviembre de 2024  
 Porcentaje avance: 43 %

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución y se han construido 410 ML de boxculvert de 3.50\*3.50 en concreto de 4.000 psi, se han instalado 318.0 ML de tubería sanitaria en PVC de 24 in., para el interceptor y rellenos en zanja con una cantidad acumulada de 19.952 M3, en áreas laterales del nuevo Box construido y por encima de la losa superior de la estructura.

	
<p>Imagen: Fundida losa inferior modulo No 41</p>	<p>Imagen: Amarre de acero muros modulo No 41</p>
	
<p>Imagen: Armado de refuerzo losa superior módulo No 41</p>	<p>Imagen: Fundida losa superior módulo No 41</p>



**CONTRATO DE OBRA: No. 284 de 2023 (03 DE NOVIEMBRE DE 2023)**  
**“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (SEGUNDA FASE) A LAS**  
**INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE**  
**LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.**

**FRENTE 1: MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (SEGUNDA FASE) A LAS**  
**INSTALACIONES CAIV**

VALOR INICIAL	:	\$ 283.178.271
VALOR FRENTE 1	:	\$ 283.178.271
VALOR ANTICIPO	:	\$ 0
PLAZO INICIAL	:	45 Días
FECHA DE INICIO	:	14 de noviembre de 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	28 de diciembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERM.	:	27 de enero de 2024
ESTADO DEL CONTRATO:		TERMINADO – PENDIENTE LIQUIDAR
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:		100 %
PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO:		90%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en estado Terminado. Se mantuvo el control y seguimiento en las actividades ejecutadas, donde se han intervenido a las instalaciones del centro de atención y reparación integral de las víctimas (CAIV) del municipio de Bucaramanga, Santander.

El proyecto contempla el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno – CAIV, el cual incluye la intervención de 175,24 m2 para la adecuación de las unidades sanitarias, el mejoramiento sala de juntas, ampliación zona de archivo y cafetería. Incluye desmonte de puertas, ventanas, incrustaciones, aparatos sanitarios, cielo raso, estructura en aluminio, muros divisorios en mampostería, luminarias, aparatos eléctricos, demolición de pisos y enchapes en cerámica, subsanación filtración de aguas lluvias en cubiertas y canales, acceso salón de capacitaciones, acabados generales en pintura, divisiones metálicas, incrustaciones metálicas, piso en cerámica, cielo raso, en lámina de yeso entre otras. Actualmente el proyecto se encuentra en un avance físico del 100% de la adecuación, donde ya se realizó acta final pendiente acta de liquidación.





Impermeabilización de cubiertas asbesto cemento.



Intervención Baterías Sanitarias



Sala de Juntas.

## 10. PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FRENTE A CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES.

Una vez se inicia ésta Administración, se encuentra que hay varios contratos, que ya terminaron o están a punto de terminar actividades de obra, pero que no se han liquidado. Si bien hay contratos finalizados en 2.023, cuyo plazo de liquidación correspondería para realizarse en éste año 2.024, se identificaron varios contratos de años anteriores que también requieren adelantar el trámite de liquidación.

Los contratos encontrados, se clasificaron en alguno de los siguientes grupos:

### ✓ **CONTRATOS FINALIZADOS, CON RECIBO A SATISFACCIÓN PENDIENTE**

Se encontraron al iniciar la administración del año 2024 28 contratos que estaban finalizados en su plazo, y que tenían Acta de Terminación con Pendientes suscrita, varios de éstos pendientes de temas técnicos (detalles de calidad en obra), o finalizados en su plazo, pero con obras no realizadas. En algunos casos, existen procesos sancionatorios pendientes de resolverse.

### ✓ **CONTRATOS FINALIZADOS, RECIBIDOS A SATISFACCIÓN (O CON TEMAS DE OBRA RESUELTOS) PERO CON PENDIENTES ADMINISTRATIVOS**

Se encontraron al iniciar la administración del año 2024, 8 Contratos que estaban finalizados en su plazo, y que tenían Acta de Terminación con Pendientes suscrita, donde ya se subsanaron los pendientes de obra, pero quedan pendientes diligencias administrativas para poder firmar el recibo final, especialmente en temas de recibo por las Empresas de Servicios Públicos (Acueducto, EMPAS, ESSA, Alumbrado)



✓ **CONTRATOS CON ACTA DE RECIBO FINAL, PERO NO LIQUIDADOS**

Se encontraron al iniciar la administración del año 2024, 14 Contratos que estaban finalizados en su plazo, y que tenían Acta de Terminación con Pendientes suscrita, donde ya se subsanaron los pendientes de obra, así como Acta de Recibo Final suscrita, pero no liquidados, principalmente por no haberse presentado aprobación de pólizas, o por no haber radicado los documentos en su momento ante la Secretaría de Infraestructura.

✓ **CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE NO SE PUEDEN LIQUIDAR ACTUALMENTE**

Corresponde a contratos de Interventoría que ya finalizaron su plazo, pero que, debido a pendientes de las obras a las cuales les realizaron la Interventoría, no pueden liquidarse, porque parte de sus obligaciones es liquidar la obra. Son 10 contratos con ésta situación.

✓ **CONTRATOS NO LIQUIDADOS**

Dado que se encuentra una amplia cantidad de contratos en éstas condiciones, se determina conformar un equipo de profesionales para que se ponga al frente de sacar adelante éstas 60 liquidaciones, así como apoyar en la solución de dificultades técnicas que se presenten en la ejecución de contratos que actualmente se encuentran suspendidos, y que requieren acciones del Gobierno Municipal, para poder continuar su ejecución.

A continuación, se presenta la evolución del proceso de liquidación de éstos contratos que se recibieron al iniciar el presente año:

	DIC 31/ 2023	JULIO 2/2024
TERMINADOS CON PENDIENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	28	10
TERMINADOS CON PENDIENTES ADMINISTRATIVOS (RESUELTOS LOS TÉCNICOS)	8	18
CON ACTA DE RECIBO FINAL, CON TRÁMITES PARA LIQUIDAR	14	13
INTERVENTORÍAS ESPERANDO LIQUIDACIÓN DE OBRAS, PARA LIQUIDAR	10	10
LIQUIDADOS		9
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Como se observa, de los 60 contratos iniciados al principio de la gestión, ya se logró que 18 de ellos resolvieran los pendientes técnicos que tenían, quedando únicamente con pendientes administrativos. De igual forma, se ha logrado liquidar o identificar su estado como liquidados, de 9 contratos. Se está a la espera de pendientes administrativos en 18 contratos, que a su vez generan que no se haya liquidado aún 10 interventorías. Estos pendientes administrativos, principalmente, se debe a trámites ante empresas de servicios públicos.

Es importante mencionar, que se han identificado otros contratos que no se encontraban liquidados al iniciarse la presente Administración, pero que no estaban identificados en la información entregada en su momento. De igual forma, se incluyen contratos que se han finalizado ya en ésta administración. Este listado corresponde a 7 nuevos contratos que se suman.

A la fecha, se han adelantado las siguientes acciones de algunos de los contratos para liquidar.

Ítem	Número Contrato	Objeto Contrato	ACCIONES ADELANTADAS JUNIO 30
1	248-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 7	PENDIENTE LEGALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS. YA LEGALIZADO EMPAS. PENDIENTE PAZY SALVO DE ACUEDUCTO. NO TIENE PENDIENTES EN OBRA. UNA VEZ LEGALIZADO, SE FIRMA ACTA DE RECIBO FINAL
2	152-2021	Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 3	EL CONTRATISTA EJECUTO APROXIMADAMENTE EL 79%. CONTINÚA PROCESO DE APLICACIÓN DE MULTAS. REUNIÓN EL 20 DE JUNIO.
3	172-2021	“Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander” - Grupo 3	RESOLUCION 008 DEL 27 DE MAYO DE 2024 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AFECTACION DE GARANTIAS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA
4	26-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano Del Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 3	SE HIZO VISITA DE OBRA, Y SE SUBSANARON YA TODAS LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS, QUEDAN PENDIENTE SOLO TEMA BEBEDEROS. FALTA LEGALIZAR SERVICIOS PUBLICOS
5	34-2022	Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander. - Grupo 3A	ACTA DE RECIBO FINAL CON PENDIENTES DE RETIE Y RETILAB Y ALGUNOS ARREGLOS
6	37-2022	Adecuación De Salones Comunes En El Municipio De Bucaramanga Santander. - Grupo 2- VILLA MERCEDES	El municipio debe asignar supervisor y contratar Interventoría y/o definir si el supervisor que se designe asume la liquidación. Se realizó visita de inspección a la obra, para verificar estado obra. Se tiene deuda de 25 años con el acueducto, se realizó reunión con Bienes y Servicios para proceso de pago por parte del municipio. Contratista está organizando la documentación para su liquidación.
7	49-2022	Interventoría a la Adecuación De Salones Comunes En El Municipio De Bucaramanga Santander	En trámite del área jurídica, relacionado a un presunto sancionatorio que viene de la vigencia 2023.
8	408-2022	Adecuación Del Equipamiento Y Escenarios Deportivos Del Municipio De Bucaramanga Santander. Grupo 1	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
9	415-2022	Modernización Del Alumbrado Público De La Urbanización Los Naranjos Y Centauros, Bulevar Bolívar - Bulevar Santander, Calle 56 Fase 1 - Calle 56 Fase 2 Y Parque Gabriel Turbay Y Olaya Herrera Del Municipio De Bucaramanga, Santander – Lote 5	PENDIENTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ELABORAR EL ACTA DE RECIBO FINAL Y PROCEDER CON ACTA DE LIQUIDACIÓN
10	433-2022	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Corregimientos 1, 2 Y 3 Del Municipio De Bucaramanga, Santander. - Grupo 3	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN



11	311-2021	Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Internamiento Preventivo (Cip) Para El Funcionamiento Del Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente	EL CONTRATISTA SUBSANÓ LOS PENDIENTES. SE ESTÁ A LA ESPERA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HACER ACTA DE RECIBO FINAL. SE HIZO REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PROCEDER A HACER ACTA DE RECIBO FINAL
12	414-2021	Garantizar La Transferencia De Recursos Para El Pago De Subsidios Del Municipio De Bucaramanga A La Sociedad Metrolimpia S.A.S E.S.P Con Desembolso De Los Recursos Que Se Registren En El Fondo De Solidaridad Y Redistribución De Los Ingresos –Fsi- Destinados A Subsidiar La Demanda Del Servicio De Aseo, Por Los Suscriptores De Los Estratos 1,2 3	DOCUMENTACIÓN DE CONVENIO EN REVISIÓN
13	247-2022	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga – Emab S.A. E.S.P, Para Realizar Las Actividades De Adecuación De La Etapa E Y F De Que Trata El Estudio Geotécnico No. 4925 En Cumplimiento Del Plan De Cierre, Desmantelamiento Y Abandono Para El Sitio De Disposición Final "El Carrasco".	PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ELABORAR EL ACTA DE RECIBO FINAL Y PROCEDER A REALIZAR ACTA DE LIQUIDACIÓN
14	253-2022	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Electrificadora De Santander S.A. E.S.P., Para La Implementación Del Alumbrado Navideño 2022	PENDIENTE POR PARTE DE ALMACEN CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ACTA DE RECIBO FINAL Y PROCEDER CON ACTA DE LIQUIDACIÓN
15	313-2022	Aunar Esfuerzos Para Desarrollar Actividades Relacionadas Con El Mantenimiento, Conservación Y Embellecimiento De Parques Y Zonas Verdes	CONVENIO EN EJECUCIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN EL 11/07/2024
16	34-2023	Arrendamiento De Bien Inmueble Ubicado En La Carrera 12 No 33-51 Del Municipio De Bucaramanga (Santander) Para El Funcionamiento De La Oficina Y Bodega De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
17	39-2021	Interventoría a la Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander.	LIQUIDADO 21/12/2023
18	420-2022	Interventoría al Mejoramiento de la infraestructura urbana dentro de la estrategia Centro Caminable	ENTREGARON YA INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA. EN PENDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA ACTA DE RECIBO FINAL
19	134-2022	Verificar Las Medidas De Variables Eléctricas Que Realiza El Dispositivo Fotocontrol Cimcon Islc 3100-7P-C... Cuya Carga Son Las Distintas Luminarias Que Se Han Seleccionado Producto Del Análisis Y Espacio Muestral De Acuerdo Con La Norma Iso No. 2859-1:1999 Procedimientos De Muestreo Para Inspeccion De Atributos.	PENDIENTE DE REVISIÓN DOCUMENTOS DEL ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO FINAL

20	136-2021	La Adquisición, A Través De La Bmc Bolsa Mercantil De Colombia S.A., Para “Desarrollar La Primera Fase Para La Adquisición, Suministro, Implementación Y Puesta En Funcionamiento De Puntos De Gestión Inteligente Y Medidas Para La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga”, Cuyas Características Técnicas, Cantidades Y Lugares De Cumplimiento Se Encuentran Detalladas En Los Documentos De Condiciones Especiales (Fichas Técnicas De Productos) Y Ficha Técnica De Negociación, De Conformidad Con El Procedimiento Establecido En El Reglamento De Funcionamiento Y Operación De La Bolsa Para El Mercado De Compras Públicas - Mcp- De La Bolsa Mercantil De Colombia.	ESTÁ EN PROCESO SANCIONATORIO
21	217-2021	Interventoría Al Mantenimiento Y Modernización De La Infraestructura Eléctrica De Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga	CUENTA CON ACTA DE RECIBO FINAL, ESTA EN ESPERA DE REANUDAR PROCESO SANCIONATORIO DEL CONTRATO 218-2021
22	218-2021	Mantenimiento Y Modernización De La Infraestructura Eléctrica De Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga, Grupo N-01	EN ESPERA DE REANUDAR AUDIENCIA SANCIONATORIA
23	219-2021	Mantenimiento Y Modernización De La Infraestructura Eléctrica De Alumbrado Público En El Municipio De Bucaramanga, Grupo N-03	SE HIZO GESTIÓN PARA QUE SE ACTUALIZARA EL ÚLTIMO PAGO EN SECOP. LIQUIDADADO PARA 31 DE DICIEMBRE
24	153-2023	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga S.A E.S.P. Para Realizar Las Actividades De Adecuación Correspondientes A Las Etapas 1A Hasta 1F Del Estudio Geotécnico N° 5030 Denominado “Estudios Y Diseños Geotécnicos Para La Estabilización, Adecuación Y Aumento De La Capacidad Del Sitio De Disposición Final “El Carrasco”	SE RECIBE DOCUMENTACION EN DRIVE PARA REVISIÓN. CONVENIO EN EJECUCIÓN.
25	159-2023	Aunar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Empresa De Aseo De Bucaramanga S.A E.S.P. Para La Construcción De Obras Y Adecuaciones Necesarias Para La Potencialización De La Planta De Tratamiento De Lixiviados Del Sitio De Disposición Final “El Carrasco” Del Municipio De Bucaramanga.	SE RECIBE DOCUMENTACION EN DRIVE PARA REVISIÓN. CONVENIO EN EJECUCIÓN.
26	160-2023	Aunar Esfuerzos Para El Desarrollo De Obras De Control De Aguas Lluvias Con El Fin De Mejorar La Estabilidad Y Reducir La Acumulación De Lixiviados En El Sitio De Disposición Final "El Carrasco	SE RECIBE DOCUMENTACION EN DRIVE PARA REVISIÓN. SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.
27	165-2023	Anudar Esfuerzos Entre El Municipio De Bucaramanga Y La Electrificadora De Santander S.A. E.S.P Para La Implementación Del Alumbrado Navideño 2023	PEDIENTE POR PARTE DE ALMACEN CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ACTA DE RECIBO FINAL Y PROCEDER CON ACTA DE LIQUIDACIÓN
28	173-2021	“Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander” - Grupo 1	CONTRATISTA RADICA SOLICITUD EN EL CAME EL 30 DE MAYO PARA AUTORIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN DONDE SE ENCUENTRA MEDIDOR, SEGÚN INDICACIONES DE LA ESSA.S.A.



29	27-2022	Adecuación Del Equipamiento Urbano Del Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 4	PENDIENTE LEGALIZAR REDES DE SERVICIOS PUBLICOS
30	167-2022	Adecuación Del Parque El Centenario Del Municipio De Bucaramanga.	PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA MODIFICAR BRAYLE DE SEÑALETICAS. PENDIENTE VISITA POR PARTE DE LA AMB PARA REVISIÓN APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN.
31	144-2023	Actividades De Tala Y Manejo Integral Del Componente Arbóreo Ubicados En El Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga	PENDIENTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA COBRAR DOS CUENTAS PENDIENTES LA DE DICIEMBRE Y LOS DIAS CORRESPONDIENTES AL 2024. JUNTO CON EL RECIBO DE ACTA DE ENTREGA FINAL
32	146-2022	Mejoramiento De La Señalización Horizontal Y Obras Complementarias En Tramos Viales	EN REVISIÓN POR REPORTE DE AUDITORÍA POR SEÑALIZACIÓN ROJA HORIZONTAL
33	182-2022	Interventoría De Mejoramiento De La Señalización Horizontal Y Obras Complementarias En Tramos Viales Del Municipio De Bucaramanga, Santander.	EN REVISIÓN POR REPORTE DE AUDITORÍA POR SEÑALIZACIÓN ROJA HORIZONTAL
34	266-2021	Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural "Casa Galán" - Grupo 2	SE ESTA REALIZANDO EL TRAMITE POR PARTE DEL ING EDGAR BAYONA SUPERVISOR PARA FIRMA DE ACTA DE RECIBO FINAL OBRA 100% SIN PENDIENTES
35	215-2023	Suministro De Materiales, Insumos Y Combustibles En El Marco Del Convenio Interadministrativo No. 157 Del 28 De junio Del 2023, Suscrito Entre El Ministerio De Defensa Y El Municipio De Bucaramanga, Para El Mantenimiento, Mejoramiento Y Rehabilitación De La Malla Vial Urbana En Las Comunas 1 Y 2, Del Municipio De Bucaramanga. Lote 2	EN ELABORACIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL
36	327-2021	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para El Funcionamiento Y Puesta En Marcha Del Teatrino De La Escuela Municipal De Artes (Ema), Mediante El Suministro E Instalación De Equipos De Sonido, Iluminación, Vestimenta Teatral, Sistema De Tramoya Motorizado, Sistema De Acondicionamiento De Graderías Complementarios, Ascensor Y Obras Civiles Del Lobby Del Teatro Santander En El Municipio De Bucaramanga.	LIQUIDADO A LA FECHA
37	31-2022	Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander. - Grupo 4	Listo para Liquidar, actas y documentación completa. A la espera de actualización de CDP y RP 2024.
38	33-2022	Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander. - Grupo 5 Orvenir	Listo para Liquidar, actas y documentación completa. A la espera de actualización de CDP y RP 2024.
39	142-2022	Construcción De Obras De Mitigación Y Recuperación Vial De Los Sectores Afectados En El Marco De La Declaratoria De Calamidad Publica En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Lote 1	Listo para Liquidar, actas y documentación completa. A la espera de actualización de CDP y RP 2024.

40	446-2022	Interventoría La Adecuación Del Equipamiento Y Escenarios Deportivos Del Municipio De Bucaramanga Santander. Grupo 1	LIQUIDADO A LA FECHA
41	388-2022	Adecuación De Los Salones Comunes De Los Barrios La Concordia Y San Luis Del Bucaramanga Santander.	EL CONTRATISTA ESTA ATENDIENDO REQUERIMIENTOS DE CALIDAD.
42	14-2023	Interventoría Al Mejoramiento De La Red Vial Terciaria En Los Corregimientos 1, 2 Y 3 Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 3	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
43	17-2023	Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga. Grupo 1	LIQUIDADO A LA FECHA
44	18-2023	Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga. Grupo 2	LIQUIDADO A LA FECHA
45	297-2022	Mantenimiento De Puentes Peatonales En El Municipio De Bucaramanga	LIQUIDADO A LA FECHA
46	262-2022	"Mejoramiento Y Obras Complementarias A Las Instalaciones Del Centro De Atención Y Reparación Integral De Las Víctimas Caiv	PENDIENTE RESOLUCIÓN DE CDP DE PASIVOS EXIGIBLES PARA REALIZAR LIQUIDACIÓN
47	265-2021	"Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalía General De La Nación En Bucaramanga	EN PROCESO DE PASIVOS EXIGIBLES PARA LIQUIDAR 100% DE OBRA SIN PENDIENTES
48	184-2022	Interventoría a Equip Urbano En Parques, Escenarios Deportivos	PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR.
49	41-2022	Interventoría a la adecuación Del Equipamiento Urbano	TENEMOS HASTA SIA OBSERVA DE ACTA DE RECIBO FINAL. FALTA RP DE PRESUPUESTO 2024
50	134-2021	Interventoría A La Adecuación Y Mejoramiento De Parques Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga, Santander. Grupo 1	PENDIENTE LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA 248-21
51	141-2021	Interventoría A La Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 2	PENDIENTE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 172 PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA
52	140-2021	Interventoría A La Adecuación De Infraestructura Para Equipamientos Comunitarios Y Espacios Públicos Adyacentes En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 1	INTERVENTORIA DEL CONTRATO 173-2021 EL CUAL SE ENCUENTA PENDIENTE RESPUESTA DE RADICACIÓN No. 1-FA-202405-00111484 REALIZADA EN EL CAME EL 30 DE MAYO 2024.
53	48-2022	Interventoría A La Adecuación Del Equipamiento Urbano Del Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 2	PENDIENTE LIQUIDAR OBRA PARA LIQUIDAR INTERVENTORÍA
54	40-2022	Interventoría A La Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 3	Listo para Liquidar, actas y documentación completa. A la espera de actualización de CDP y RP 2024.



55	46-2022	Interventoría A La Adecuación De La Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En El Municipio De Bucaramanga, Santander - Grupo 2	INTERVENTORIA ESTA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LOS PENDIENTES PARA HACER ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA Y PROCEDER A LIQUIDACIÓN.
56	168-2022	Interventoría A La Adecuación Del Parque El Centenario Del Municipio De Bucaramanga, Santander.	INTERVENTORIA ESTA ESPERANDO QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LOS PENDIENTES PARA HACER ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA Y PROCEDER A LIQUIDACIÓN.
57	428-2022	Interventoría A La Adecuación De Los Salones Comunes De Los Barrios La Concordia Y San Luis Del Municipio De Bucaramanga.	PENDIENTE LIQUIDACION DE LA OBRA
58	430-2022	Interventoría Al Mantenimiento Y Recuperación Del Equipamiento Urbano En Parques, Escenarios Deportivos Y Espacio Público Del Municipio De Bucaramanga.	LIQUIDADO A LA FECHA
59	167-2021	Interventoría A La Adecuación De Salas De Paso, Atención Al Usuario Y Unidad De Reacción Inmediata Para La Sede Principal De La Fiscalía General De La Nación En Bucaramanga Asi Como La Interventoría A La Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Cultural "Casa Galán"	PENDIENTE LIQUIDACION CONTRATOS DE OBRA 265 Y 266 PARA LIQUIDAR INTERVENTORIA
60	417-2022	Mejoramiento de Andenes y Pasamanos Municipio de Bucaramanga	LIQUIDADO A LA FECHA

## 11. CONTRATOS TERMINADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y QUE DEBEN INICIAR PROCESO DE LIQUIDACION

Durante este trimestre se terminaron algunos contratos los cuales se detallan así:

**CONTRATO DE OBRA 34 de 2022 - CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3**

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra finalizado, se realizó visita al parque la Feria con el fin de verificar el estado actual de la obra y realizar su respectiva acta de recibo final

**CONTRATO DE OBRA 31 de 2022 - CONSORCIO PARQUES BIO - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 4**

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato ya cuenta con acta de recibo final, se han realizado visitas con el fin de revisar el estado actual del parque y se está en trámite de inclusión a inventarios y liquidación del mismo.

**CONTRATO DE OBRA 33 de 2022 - CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22 - ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 5.**

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato ya cuenta con acta de recibo final, se han realizado visitas con el fin de revisar el estado actual del parque y se está en trámite de inclusión a inventarios y liquidación del mismo.

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 170 – ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA** “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra terminado y en trámite de liquidación.

**CONTRATO DE OBRA 311 de 2022 - MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS - MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra terminado y en trámite de liquidación

## 12. CONTRATACION DE PERSONAL Y PAGO DE SUBSIDIOS A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura realizo la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 30 DE JUNIO 2024
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	<b>\$ 2.010.786.667,00</b>

Igualmente, el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos enviados por la Unidad Técnica de Servicios Públicos.

EMPRESA	VALOR PAGADO
<b>ACUEDUCTO</b>	\$ 1.199.525.394,00
<b>EMPAS</b>	\$ 612.885.742,00
<b>EMAB</b>	\$ 1.206.823.354,00
<b>LIMPIEZA URBANA</b>	\$ 100.160.150,00
<b>METROLIMPIA</b>	\$ 108.188.049,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3.227.582.689,00</b>

### ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)























Rubro	Descripción Rubro	MODIFICACIONES								TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados					
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00	\$ 9,00	10 = 3 - 5					11 = 5 - 7
2.3.7.06.02.4599002.9 1119.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.7.06.02.4599002.9 1119.653	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 653	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>															
2.3.7.06.02.4599002.9 1123.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 3.613.277.728,88	\$ -	\$ 3.613.277.728,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INVERSION															
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA															
	<b>LINEA 1. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRACION CULTURA</b>															
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS															
	ADQUISICION DE SERVICIOS															
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION															
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>															
2.3.2.02.02.005.33020 73.53129.213	SERVICIOS DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	\$ -	\$ -	\$ 724.441.037,00	\$ -	\$ 724.441.037,00	\$ 724.441.037,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724.441.037,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
	DEPORTE Y RECREACION															
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS															
	ADQUISICION DE SERVICIOS															
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION															
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO</b>															
2.3.2.02.02.005.43010 11.54270.201	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 105.221.228,00	\$ -	\$ 105.221.228,00	\$ 105.221.228,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.221.228,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
	<b>LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA</b>															
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL															
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS															
	ADQUISICION DE SERVICIOS															
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION															
<b>RUBRO</b>	<b>EDIFICIOS COMERCIALES</b>															
2.3.2.02.02.005.17090 78.53122.201	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 2.753.234.603,79	\$ -	\$ 2.753.234.603,79	\$ 2.753.234.603,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.753.234.603,79	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.17090 78.53122.267	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 267	\$ -	\$ -	\$ 45.805.048,00	\$ -	\$ 45.805.048,00	\$ 45.805.048,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.805.048,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.17090 78.53122.573	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 573	\$ -	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ 66.428.464,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ -	\$ -	\$ -	0
	TRANSPORTE															
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS															
	ADQUISICION DE SERVICIOS															
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION															
<b>RUBRO</b>	<b>CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES</b>															
2.3.2.02.02.005.24020 42.53211.289	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 289	\$ -	\$ -	\$ 1.972.742.460,00	\$ -	\$ 1.972.742.460,00	\$ 1.972.742.460,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.972.742.460,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24020 42.53211.389	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 389	\$ -	\$ -	\$ 547.763.850,00	\$ -	\$ 547.763.850,00	\$ 547.763.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547.763.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES</b>															
2.3.2.02.02.005.24021 12.53211.213	VIA TERCARIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 213	\$ -	\$ -	\$ 1.620.379.446,00	\$ -	\$ 1.620.379.446,00	\$ 1.620.379.446,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.620.379.446,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES</b>															
2.3.2.02.02.005.24021 13.53211.230	VIA URBANA CONSTRUIDA 230	\$ -	\$ -	\$ 3.147.387.795,00	\$ -	\$ 3.147.387.795,00	\$ 3.147.387.795,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.147.387.795,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021 13.53211.255	VIA URBANA CONSTRUIDA 255	\$ -	\$ -	\$ 673.162.286,00	\$ -	\$ 673.162.286,00	\$ 673.162.286,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673.162.286,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021 13.53211.530	VIA URBANA CONSTRUIDA 530	\$ -	\$ -	\$ 12.005.971.714,24	\$ -	\$ 12.005.971.714,24	\$ 12.005.971.714,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.005.971.714,24	\$ -	\$ -	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES</b>															
2.3.2.02.02.005.24021 14.53211.201	VIA URBANA MEJORADA 201	\$ -	\$ -	\$ 9.098.297.451,90	\$ -	\$ 9.098.297.451,90	\$ 9.098.297.451,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.098.297.451,90	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021 14.53211.213	VIA URBANA MEJORADA 213	\$ -	\$ -	\$ 3.064.223.460,00	\$ -	\$ 3.064.223.460,00	\$ 3.064.223.460,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.064.223.460,00	\$ -	\$ -	\$ -	0





Rubro	Descripción Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion			
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones					Pagos Acumulados		
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00	\$ 9,00					10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P</b>																
2.3.2.02.02.008.40020 22.83990.201	PARQUES MANTENIDOS 201	\$ -	\$ -	\$ 71.000.000,00	\$ -	\$ 71.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.000.000,00	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE</b>																
2.3.2.02.02.008.40020 22.85970.201	PARQUESMANTENIDOS 201	\$ -	\$ -	\$ 209.320.000,00	\$ -	\$ 209.320.000,00	\$ 209.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.320.000,00	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE</b>																
2.3.2.02.02.008.40020 26.85970.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ -	\$ -	\$ 6.996.363.205,00	\$ -	\$ 6.996.363.205,00	\$ 6.996.363.205,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.996.363.205,00	\$ -	\$ -			0
	<b>LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR</b>																
	<b>GOBIERNO TERRITORIAL</b>																
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>																
	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>																
	<b>CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>																
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>																
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.289	SALON COMUNAL ADECUADO 289	\$ -	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ -			0
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.389	SALON COMUNAL ADECUADO 389	\$ -	\$ -	\$ 1.202.901.289,00	\$ -	\$ 1.202.901.289,00	\$ 1.202.901.289,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.202.901.289,00	\$ -	\$ -			0
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.588	SALON COMUNAL ADECUADO 588	\$ -	\$ -	\$ 744.489.853,50	\$ -	\$ 744.489.853,50	\$ 744.489.853,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 744.489.853,50	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>																
2.3.2.02.02.005.45990 11.53129.201	SEDES ADECUADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 837.720.949,74	\$ -	\$ 837.720.949,74	\$ 837.720.949,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 837.720.949,74	\$ -	\$ -			0
	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>																
	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION</b>																
2.3.2.02.02.008.45990 06.83321.201	ESTUDIOS DE PREINVERSION4599006 201	\$ -	\$ -	\$ 2.999.987.243,76	\$ -	\$ 2.999.987.243,76	\$ 2.999.987.243,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.999.987.243,76	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO</b>																
2.3.2.02.02.008.45990 31.82120.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 81.066.666,67	\$ -	\$ 81.066.666,67	\$ 81.066.666,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.066.666,67	\$ -	\$ -			0
2.3.2.02.02.008.45990 31.82120.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ -	\$ 469.200.000,00	\$ -	\$ 469.200.000,00	\$ 469.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.200.000,00	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES</b>																
2.3.2.02.02.008.45990 31.83213.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ -	\$ 300.600.000,00	\$ -	\$ 300.600.000,00	\$ 300.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.600.000,00	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION</b>																
2.3.2.02.02.008.45990 31.83321.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 952.676.666,69	\$ -	\$ 952.676.666,69	\$ 952.676.666,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952.676.666,69	\$ -	\$ -			0
2.3.2.02.02.008.45990 31.83321.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ 534.480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P</b>																
2.3.2.02.02.008.45990 31.83990.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 628.483.333,33	\$ -	\$ 628.483.333,33	\$ 628.483.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628.483.333,33	\$ -	\$ -			0
2.3.2.02.02.008.45990 31.83990.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ -	\$ 675.480.000,00	\$ -	\$ 675.480.000,00	\$ 675.480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675.480.000,00	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P</b>																
2.3.2.02.02.008.45990 31.85999.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 326.986.666,67	\$ -	\$ 326.986.666,67	\$ 326.986.666,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.986.666,67	\$ -	\$ -			0
	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>																
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>																
	<b>EDIFICIOS COMERCIALES</b>																
2.3.7.06.02.4599002.5 3122.673	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ -	\$ -	\$ 6.733.088.246,64	\$ -	\$ 6.733.088.246,64	\$ 6.733.088.246,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.733.088.246,64	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>																
2.3.7.06.02.4599002.5 3129.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 1.175.660.913,00	\$ -	\$ 1.175.660.913,00	\$ 1.175.660.913,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.175.660.913,00	\$ -	\$ -			0
2.3.7.06.02.4599002.5 3129.616	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 616	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -			0
2.3.7.06.02.4599002.5 3129.673	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ -	\$ -	\$ 30.793.074,71	\$ -	\$ 30.793.074,71	\$ 30.793.074,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.793.074,71	\$ -	\$ -			0
2.3.7.06.02.4599002.5 4129.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ -			0
<b>RUBRO</b>	<b>CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES</b>																
2.3.7.06.02.4599002.5 3211.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 7.614.736.930,44	\$ -	\$ 7.614.736.930,44	\$ 7.614.736.930,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.614.736.930,44	\$ -	\$ -			0















Rubro	Descripción Rubro	MODIFICACIONES						TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion			
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados					Obligaciones	Pagos Acumulados	
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00						\$ 9,00	10 = 3 - 5
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS															
2.3.2.02.02.009.21020																
69.91123.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 34.468.046.411,00	\$ -	\$ 34.468.046.411,00	\$ 34.468.046.411,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.468.046.411,00	\$ -	\$ -		0
2.3.2.02.02.009.21020																
69.91123.526	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 526	\$ -	\$ -	\$ 16.681.210.880,54	\$ -	\$ 16.681.210.880,54	\$ 16.681.210.880,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.681.210.880,54	\$ -	\$ -		0
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		\$ 180.799.516.046,00	\$ 100.052.310.283,74	\$ 271.139.562.214,26	\$ 283.879.764.088,57	\$ 87.312.108.409,43	\$ 268.111.624.455,43	\$ 23.355.223.235,60	\$ 23.336.646.359,60	\$ 14.696.521.564,37	\$ 13.995.496.625,92	\$ 244.756.401.219,83	\$ 18.576.876,00	\$ 8.640.124.795,23		8,70

**RELACION GASTOS DE INVERSION A 30 DE JUNIO DE 2024**

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2975	1/04/2024 10:59	1275	1092354965	MANUEL JOSE BRICEÑO VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE ARQUITECTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2997	1/04/2024 15:38		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.355.523,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 4.355.523,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE FEBRERO DE 2024 AL 13 DE MARZO DE 2024, SEGÚN FACTURA 218549822 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
2998	1/04/2024 15:38		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.080.347,79	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.080.347,79	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 19 MARZO DE 2024 AL 19 ABRIL DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E 5793822041 - REFERENCIA 8221383845.
3027	2/04/2024 16:01	252	900160387	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 35.000.000,00	2.3.2.02.02.008.3301094.83321.201 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 201	\$ 35.000.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO 1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 252 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO OBJETO ES, INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
3153	9/04/2024 7:29		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.199.721,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 5.199.721,00	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 , SEGUN FACTURA TBCL-23446546 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
3240	11/04/2024 15:27	138	901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 320.784.746,00	2.3.2.02.02.008.4599016.871520.5.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 320.784.746,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 138 DEL 22/06/2023 DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1.
3241	11/04/2024 15:28	139	830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 325.898.946,00	2.3.2.02.02.008.4599016.871520.5.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 325.898.946,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 139 DEL 22/06/2023 DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2.
3242	11/04/2024 15:30	140	901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 321.351.774,00	2.3.2.02.02.008.4599016.871520.5.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 321.351.774,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 140 DEL 24/07/2023 DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 3.
3243	11/04/2024 15:31	141	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 296.264.432,00	2.3.2.02.02.008.4599016.871520.5.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 296.264.432,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 141 DEL 29/06/2023 DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 4.
3244	11/04/2024 15:31	142	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 236.887.350,00	2.3.2.02.02.008.4599016.871520.5.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 236.887.350,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 142 DEL 22/06/2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1.
3245	11/04/2024 15:32	143	860041968	COMPañIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 236.907.877,42	2.3.2.02.02.008.4599016.871520.5.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 236.907.877,42	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 143 DEL 22/06/2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2.
3255	11/04/2024 16:49		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 240.465,16	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 240.465,16	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO 2024 AL 03 DE ABRIL DE 2024 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E 5798543103 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
3281	12/04/2024 15:32	1363	1098634815	JAVIER BARAJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.



RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3321	16/04/2024 10:27	1385	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3344	16/04/2024 16:48		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.368.780.473,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.368.780.473,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN FACTURA 218963032 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
3374	17/04/2024 15:27		900677737	METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 56.934.312,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 56.934.312,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1460 \$ 56.934.312,00 VALOR TOTAL \$ 56.934.312,00 - METROLIMPIA
3387	18/04/2024 9:18	1406	1098610298	YERLY FABIAN MARTINEZ ESTUPIÑAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 28.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 28.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3501	18/04/2024 12:03		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 248.034.543,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 248.034.543,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 05984 \$ 248.034.543,00 VALOR TOTAL \$ 248.034.543,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
3525	19/04/2024 10:37	1421	37830644	MARIA ELENA GUTIERREZ DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3540	22/04/2024 9:30	1426	1098615471	ADRIANA DEL ROSARIO CUENTAS MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3541	22/04/2024 9:31	1427	63505805	LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3542	22/04/2024 9:32	1428	91457720	RODRIGO HERNANDEZ CARRILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3543	22/04/2024 9:33	1433	13809541	GERMAN LARROTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3544	22/04/2024 9:33	1429	13838468	ARCADIO MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3660	23/04/2024 11:16	1442	1098694375	WALTHER FERNANDO URIZA VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SOLDADOR EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3836	24/04/2024 11:38	1445	74374860	MANUEL SAUL JAIMES BARRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3837	24/04/2024 11:41		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.612.582,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 4.612.582,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE MARZO DE 2024 AL 12 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN FACTURA 219718407 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3838	24/04/2024 11:44		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 127.055.680,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 127.055.680,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 002758 \$ 127.055.680,00 VALOR TOTAL \$ 127.055.680,00 - EMPAS
3955	29/04/2024 10:05	444	860041968	COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.200.000,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 102.200.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 444 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
3959	29/04/2024 11:58	13	901667990	CONSORCIO CDC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.196.672,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 102.196.672,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 13 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
3963	29/04/2024 14:46	410	901663899	CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 624.362.094,84	2.3.2.02.02.005.4301004.53270.267 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 267	\$ 624.362.094,84	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 410 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3
3964	29/04/2024 14:48	447	901667665	CONSORCIO INTERVIAS RS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 81.018.964,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53270.201 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	\$ 81.018.964,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 447 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 3
4004	2/05/2024 9:51	1490	13719477	OSCAR LEONARDO PLATA PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4016	2/05/2024 11:56		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 227.447.333,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 227.447.333,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 05991 \$ 227.447.333,00 VALOR TOTAL \$ 227.447.333,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
4017	2/05/2024 11:56		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 254.239.679,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 254.239.679,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MARZO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ES337 \$ 254.239.679,00 VALOR TOTAL \$ 254.239.679,00,00 - EMAB
4034	3/05/2024 14:11	1504	37557336	ANGELICA MARIA MARTINEZ ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS
4040	3/05/2024 14:50		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.095.049,56	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.095.049,56	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 ABRIL DE 2024 AL 19 MAYO DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E 5804129443- REFERENCIA 8221383845.



RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4177	8/05/2024 11:07		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.129.059,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 5.129.059,00	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN FACTURA TBCL-23503821 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 POR VALOR DE \$ 2.473.375, ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN FACTURA 580831167722 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$ 2.655.684, PARA UN TOTAL DE \$5.129.059.
4179	8/05/2024 11:26		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.894.848,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 39.894.848,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA NO. LBUC NO.364 \$ 20.028.859, Y MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. LBUC NO. \$ 19.865.989,00 VALOR TOTAL \$ 39.894.848,00-LIMPIEZA URBANA
4412	16/05/2024 10:46	316	800189202	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 172.725.229,80	2.3.2.02.02.005.4002020.54211.282 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 282	\$ 172.725.229,80	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 316 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
4443	16/05/2024 14:57	1591	1098802558	MARIA ALEJANDRA ACEVEDO HURTADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4444	16/05/2024 14:58	1590	1098793938	JORGE ELIECER GOMEZ HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4449	16/05/2024 15:17		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.375.720.090,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.375.720.090,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA 220139512 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
4482	17/05/2024 11:31		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 486.958,96	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 486.958,96	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE ABRIL 2024 AL 03 DE MAYO DE 2024 Y ADEMAS AL PERIODO 04 DE MAYO 2024 AL 03 DE JUNIO 2024; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5808871178 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
4783	27/05/2024 15:38		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.508.207,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 4.508.207,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE ABRIL DE 2024 AL 14 DE MAYO DE 2024, SEGUN FACTURA 220895815 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
4784	27/05/2024 15:40		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.095.049,56	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.095.049,56	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 MAYO DE 2024 AL 19 JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA DE CLARO NO. E 5814440200- REFERENCIA 8221383845
4808	28/05/2024 8:25	217	13873896	WILKES ALFREDO JIMENEZ CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 217 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4809	28/05/2024 8:26	191	1098686687	ANGELICA MARCELA HERNANDEZ VELAZCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.233.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 7.233.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 191 DEL 29 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4811	28/05/2024 8:32		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 112.401.932,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 112.401.932,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ENERO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 0003564 \$ 112.401.932,00 VALOR TOTAL \$ 112.401.932,00 - EMPAS
4862	28/05/2024 13:47	332	91489166	IVAN DARIO MUÑOZ AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.900.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.900.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 332 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"
4863	28/05/2024 13:47	271	1098634006	MELVIN SNEYDER GUTIERREZ SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.833.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 271 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL Y APOYO TÉCNICO EN EL AREA DE CONTRACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4864	28/05/2024 13:48	190	1098777640	DANIELA ALEJANDRA CELIS QUINTERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.133.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.133.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 190 DEL 29 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4865	28/05/2024 13:49	164	37863152	ENELDA GOMEZ NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.166.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.166.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 164 DEL 27 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
4866	28/05/2024 13:49	163	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.683.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.683.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 163 DEL 27 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4867	28/05/2024 13:49	309	1098692371	JUAN SEBASTIAN REY SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.200.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 309 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4868	28/05/2024 13:50	165	63486215	NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.650.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.650.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 165 DEL 27 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS BRINDANDO APOYO EN EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
4869	28/05/2024 13:51	331	68295591	ALBA MARINA DELGADO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.766.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.766.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 331 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"
4879	28/05/2024 15:41	343	91256968	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.466.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.466.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 343 DEL 03 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4880	28/05/2024 15:43	293	1094948041	MAYCOL ESTIVEN MORALES ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.900.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.900.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 293 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4886	28/05/2024 16:07	219	63350037	LAURA REGINA LOPEZ PRIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 219 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4887	28/05/2024 16:07	399	13872516	PABLO ANDRES CONTRERAS VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 399 DEL 06 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4888	28/05/2024 16:08	241	1098605651	DIANA PATRICIA CARVAJAL FUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 241 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4889	28/05/2024 16:08	216	1096946883	LUZ EMILSEN CASTAÑEDA LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 216 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4899	28/05/2024 20:52	350	5685121	ARNULFO OROZCO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.166.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.166.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 350 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4900	28/05/2024 21:12	348	63348331	LILIANA CARVAJAL SALAMANCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 348 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4901	28/05/2024 21:16	262	1098730591	IVO ALEJANDRO RIVERA PINILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.833.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 262 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4902	28/05/2024 21:16	347	1101687332	WILLIAM JOSE CALA VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 347 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"
4903	28/05/2024 21:17	218	79710194	CARLOS ALBERTO CARDENAS LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 218 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4904	28/05/2024 21:18	290	1098773016	ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.333.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.333.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 290 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4905	28/05/2024 21:18	307	91106800	WALTER YEZID MARTINEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.333.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.333.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 307 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"
4906	28/05/2024 21:19	468	91180736	LUIS RAUL CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.400.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.400.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 468 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: " PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"
4907	28/05/2024 21:19	474	1098721390	MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.666.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.666.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 474 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4949	29/05/2024 14:49	492	91540606	EDGAR LIBARDO ORTEGA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.300.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.300.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 492 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4950	29/05/2024 14:49	641	1093798962	KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.813.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 1.813.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NO. 641 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4951	29/05/2024 14:50	550	91298539	RAFAEL ANTONIO CHACON RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 550 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
4952	29/05/2024 14:50	291	1098765143	JUAN CAMILO RANGEL ZAPATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.333.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.333.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 291 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4981	29/05/2024 17:44	143	860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 177.680.908,07	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 177.680.908,07	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA NO. 143 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2”
4982	29/05/2024 17:45	141	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 222.198.324,00	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 222.198.324,00	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 141 DE 2023, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 4”.
4983	29/05/2024 17:46	140	901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 241.013.830,50	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 241.013.830,50	ADICIONAL NO 02 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA NO 140 DE 2023, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3”.
4984	29/05/2024 17:48	139	830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 244.424.209,50	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 244.424.209,50	ADICIONAL NO 02 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA NO 139 DE 2023 CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2”
4985	29/05/2024 17:49	138	901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 240.588.559,50	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 240.588.559,50	ADICIONAL NO 02 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA NO 138 DE 2023 CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1”.
4986	29/05/2024 17:50	142	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 177.665.512,50	2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 177.665.512,50	ADICIONAL NO 02 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 142 DE 2023 CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1”
4989	29/05/2024 18:49	390	13874784	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.333.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.333.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 390 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA”

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5037	30/05/2024 7:33	498	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.933.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.933.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 498 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5038	30/05/2024 7:33	330	1099204435	SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 330 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5039	30/05/2024 7:36	711	1098649127	JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 711 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5040	30/05/2024 7:37	558	63339406	MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.400.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.400.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NO. 558 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5041	30/05/2024 7:37	567	1095804063	JUAN SEBASTIAN VARGAS PADILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 567 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5042	30/05/2024 7:38	240	13351098	LUIS ARTURO HERNANDEZ ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 6.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 240 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5046	30/05/2024 9:46	706	37841760	MARYELY VERA JACOME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.253 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 2.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 706 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL.
5047	30/05/2024 9:59		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 256.936.124,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 256.936.124,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ABRIL DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ES342 \$ 256.936.124,00 VALOR TOTAL \$ 256.936.124,00,00 - EMAB



RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5052	30/05/2024 10:16	559	1098700548	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.700.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.700.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 559 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5053	30/05/2024 10:18	568	37549301	JUDITH BUENO LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 568 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5054	30/05/2024 10:19	613	1098631857	OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.833.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 613 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5055	30/05/2024 10:20	696	1098683140	OMAR YESID NAVARRO RONDON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 696 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5080	30/05/2024 11:00	704	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 704 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ELÉCTRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"
5081	30/05/2024 11:00	698	1098682355	JUAN FELIPE CAMARGO JIMENEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 698 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5082	30/05/2024 11:00	691	1098756846	CRISTIAN EDUARDO REY PALACIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 698 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5083	30/05/2024 11:01	664	13721027	CESAR JULIAN ACEVEDO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 3.200.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 664 DEL 14 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5084	30/05/2024 11:01	344	91489818	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 344 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5102	30/05/2024 11:30	239	1102375286	JHOANNA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 239 DEL 31 DE ENERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5103	30/05/2024 11:34	751	91245880	CARLOS ALIRIO QUINTERO LESMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 1.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 751 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
5104	30/05/2024 11:35	792	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.173.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 1.173.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 792 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5105	30/05/2024 11:35	707	1098741571	LIZETH ANDREA RENGIFO CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 707 DEL 15 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: STAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5112	30/05/2024 13:41	11	901668987	CONSORCIO PI CENTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 163.816.293,00	2.3.2.02.02.005.4002020.53270.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 163.816.293,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 11 DEL 13 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
5158	30/05/2024 15:23	12	901669773	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 107.625.408,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53270.201 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	\$ 107.625.408,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 2
5169	30/05/2024 17:01	1659	91013981	ADMETH SAUL PARDO OLAYA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 6.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS
5170	30/05/2024 17:02	1662	63557509	JOHANA ANDREA ORTIZ OLAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS
5181	30/05/2024 19:08	1667	1095797270	JENSYN PAOLO PORRAS JEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 5.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JURIDICA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5182	30/05/2024 19:09	1672	1007193498	LEYNE FERNANDA MARITNEZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 4.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS
5183	30/05/2024 19:10	1673	1098729702	LEIDY ANDREA DUARTE SAAVEDRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 6.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN TODAS SUS ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5221	31/05/2024 16:07	396	91348449	JOSE ROBINSON MELON SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 2.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 396 DEL 06 DE FEBRERO DE 2024, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"
5230	31/05/2024 17:54	1678	91492981	NELSON MEZA HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 6.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5395	7/06/2024 11:10		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.129.059,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 5.129.059,00	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN FACTURA TBCL-23556407 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 POR VALOR DE \$ 2.283.683,32 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MAYO DE 2024, SEGUN FACTURA 580831180657 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$ 2.845.375,68 PARA UN TOTAL DE \$5.129.059.
5606	19/06/2024 11:30	90	804016472	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.426.609,00	2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 20.426.609,00	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, INCLUYENDO LA DISPOSICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.



**RELACION GASTOS DE PERSONAL A 30 DE JUNIO DE 2024**

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	163	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA JOHANNA	IGLESIAS ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.683.333,33	28/05/2024	30/05/2024	30/06/2024
2024	164	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENELDA	GOMEZ NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 5.166.666,67	28/05/2024	30/05/2024	30/06/2024
2024	165	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NUBIA CONSTANZA	VALENCIA PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS BRINDANDO APOYO EN EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.650.000,00	28/05/2024	30/05/2024	30/06/2024
2024	190	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIELA ALEJANDRA	CELIS QUINTERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.133.333,33	28/05/2024	30/05/2024	30/06/2024
2024	191	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELICA MARCELA	HERNANDEZ VELAZCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.233.333,33	27/05/2024	30/05/2024	30/06/2024
2024	216	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ EMILSEN	CASTAÑEDA LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	28/05/2024	1/06/2024	30/06/2024
2024	217	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILKES ALFREDO	JIMENEZ CASTELLANOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	27/05/2024	1/06/2024	30/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	218	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	CARDENAS LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	28/05/2024	1/06/2024	30/06/2024
2024	219	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA REGINA	LOPEZ PRIETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	28/05/2024	1/06/2024	30/06/2024
2024	239	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHOANNA ANDREA	GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	30/05/2024	1/06/2024	30/06/2024
2024	240	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ARTURO	HERNANDEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	29/05/2024	1/06/2024	30/06/2024
2024	241	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA PATRICIA	CARVAJAL FUENTES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	28/05/2024	1/06/2024	30/06/2024
2024	262	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVO ALEJANDRO	RIVERA PINILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.833.333,33	28/05/2024	2/06/2024	30/06/2024
2024	271	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MELVIN SNEYDER	GUTIERREZ SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL Y APOYO TÉCNICO EN EL AREA DE CONTRACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.833.333,33	28/05/2024	2/06/2024	30/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	290	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDREA JULIANA	SUAREZ LEAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.333.333,33	28/05/2024	6/06/2024	30/06/2024
2024	291	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CAMILO	RANGEL ZAPATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.333.333,33	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024
2024	293	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYCOL ESTIVEN	MORALES ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.900.000,00	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024
2024	307	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER YEZID	MARTINEZ VEGA	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 4.333.333,33	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024
2024	309	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	REY SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.200.000,00	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024
2024	330	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO MAURICIO	TELLEZ GAITAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.750.000,00	29/05/2024	6/06/2024	30/06/2024
2024	331	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA MARINA	DELGADO LOPEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 4.766.666,67	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024



Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	332	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	MUÑOZ AYALA	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 3.900.000,00	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024
2024	343	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BONIFACIO	FLOREZ ANTELIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.466.666,67	28/05/2024	5/06/2024	30/06/2024
2024	344	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALBERTO	ARIAS ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	29/05/2024	6/06/2024	30/06/2024
2024	347	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM JOSE	CALA VALBUENA	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 3.750.000,00	28/05/2024	6/06/2024	30/06/2024
2024	348	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	CARVAJAL SALAMANCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.750.000,00	28/05/2024	6/06/2024	30/06/2024
2024	350	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARNULFO	OROZCO TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.166.666,67	28/05/2024	6/06/2024	30/06/2024
2024	390	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 3.333.333,33	29/05/2024	6/06/2024	30/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	396	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ROBINSON	MELON SILVA	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 2.000.000,00	31/05/2024	7/06/2024	30/06/2024
2024	399	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PABLO ANDRES	CONTRERAS VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.000.000,00	28/05/2024	7/06/2024	30/06/2024
2024	468	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS RAUL	CARRILLO RIVEROS	" PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 4.400.000,00	28/05/2024	9/06/2024	30/06/2024
2024	474	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY ALEJANDRA	MEDINA CHARRY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.666.666,67	28/05/2024	9/06/2024	30/06/2024
2024	492	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR LIBARDO	ORTEGA TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.300.000,00	29/05/2024	9/06/2024	30/06/2024
2024	498	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.933.333,33	29/05/2024	9/06/2024	30/06/2024
2024	550	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANTONIO	CHACON RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACION Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 3.000.000,00	29/05/2024	13/06/2024	30/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	558	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PATRICIA	MONSALVE MONSALVE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.400.000,00	29/05/2024	13/06/2024	30/06/2024
2024	559	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	RODRIGUEZ ARAMBULA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.700.000,00	29/05/2024	13/06/2024	30/06/2024
2024	567	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	VARGAS PADILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR Y EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000,00	29/05/2024	13/06/2024	30/06/2024
2024	568	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	BUENO LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PRECONTRACTUALES Y DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000,00	29/05/2024	13/06/2024	30/06/2024
2024	613	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OCTAVIO ANDRES	SANDOVAL GONZALEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.833.333,33	29/05/2024	14/06/2024	30/06/2024
2024	641	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN MARCELA	GUTIERREZ BARRAGAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.813.333,33	29/05/2024	14/06/2024	30/06/2024
2024	664	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CESAR JULIAN	ACEVEDO GOMEZ	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 3.200.000,00	29/05/2024	15/06/2024	30/06/2024



Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	691	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN EDUARDO	REY PALACIOS	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 2.500.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024
2024	696	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR YESID	NAVARRO RONDON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.250.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024
2024	698	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	CAMARGO JIMENEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.500.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024
2024	704	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR ELIAS	MENESES AGRESOTH	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL COMPONENTE ELÉCTRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 2.500.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024
2024	706	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARYELY	VERA JACOME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JUDICIAL	\$ 2.500.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024
2024	707	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH ANDREA	RENGIFO CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.250.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024
2024	711	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENNY PAOLA	RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.250.000,00	29/05/2024	16/06/2024	30/06/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	751	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALIRIO	QUINTERO LESMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 1.800.000,00	29/05/2024	19/06/2024	30/06/2024
2024	792	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.173.333,33	29/05/2024	20/06/2024	30/06/2024
2024	1363	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	BARAJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 20.000.000,00	12/04/2024	15/04/2024	14/08/2024
2024	1385	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	15/04/2024	16/04/2024	15/08/2024
2024	1406	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YERLY FABIAN	MARTINEZ ESTUPIÑAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 28.000.000,00	17/04/2024	18/04/2024	17/08/2024
2024	1421	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ELENA	GUTIERREZ DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	18/04/2024	19/04/2024	18/08/2024
2024	1426	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA DEL ROSARIO	CUENTAS MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	19/04/2024	22/04/2024	21/08/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1427	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA PAOLA	AMOROCHO MONTAGUT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	19/04/2024	22/04/2024	21/08/2024
2024	1428	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RODRIGO	HERNANDEZ CARRILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.800.000,00	19/04/2024	22/04/2024	21/08/2024
2024	1429	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARCADIO	MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.800.000,00	19/04/2024	22/04/2024	21/08/2024
2024	1433	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN	LARROTA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 12.800.000,00	19/04/2024	22/04/2024	21/08/2024
2024	1442	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTHER FERNANDO	URIZA VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SOLDADOR EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 10.000.000,00	22/04/2024	23/04/2024	22/08/2024
2024	1445	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL SAUL	JAIMES BARRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.800.000,00	23/04/2024	24/04/2024	23/08/2024
2024	1490	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR LEONARDO	PLATA PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	30/04/2024	6/05/2024	5/09/2024



Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1504	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELICA MARIA	MARTINEZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS.	\$ 24.000.000,00	2/05/2024	6/05/2024	5/09/2024
2024	1590	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	GOMEZ HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.500.000,00	15/05/2024	16/05/2024	30/06/2024
2024	1591	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	ACEVEDO HURTADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LA PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.500.000,00	15/05/2024	16/05/2024	30/06/2024
2024	1659	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADMETH SAUL	PARDO OLAYA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS	\$ 6.000.000,00	30/05/2024	4/06/2024	3/07/2024
2024	1662	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHANA ANDREA	ORTIZ OLAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS	\$ 4.500.000,00	30/05/2024	4/06/2024	3/07/2024
2024	1667	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENSYN PAOLO	PORRAS JEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS Y DE DEFENSA JURIDICA.	\$ 5.000.000,00	30/05/2024	4/06/2024	3/07/2024
2024	1672	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEYNE FERNANDA	MARITNEZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS	\$ 4.500.000,00	30/05/2024	4/06/2024	3/07/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1673	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY ANDREA	DUARTE SAAVEDRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN TODAS SUS ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	30/05/2024	4/06/2024	3/07/2024
2024	1678	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELSON	MEZA HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	31/05/2024	4/06/2024	3/07/2024
