



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Octubre – 31 Diciembre de 2022
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el cuarto trimestre del año, en el cual ha contrato, ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que realizo la Secretaria de Infraestructura en el cuarto trimestre de 2022

LINEA ESTRATEGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 104 DE FECHA 28 de mayo de 2021: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

VALOR INICIAL	:	\$ 10.161.443.099,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 2.047.432.424,30
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 3.335.243.684,00
VALOR TOTAL ACTUAL	:	\$ 15.544.243.684,00

VALOR ANTICIPO INICIAL	:	\$ 3.048.432.929,70
VALOR ANTICIPO ADICION 1	:	\$ 614.229.727,29
VALOR ANTICIPO ADICION 2	:	\$ 1.000.573.105,20
TOTAL ANTICIPOS	:	\$ 4, 663, 235,762.19

PLAZO INICIAL	:	7 MESES
PLAZO ADICIONAL 1	:	15 DIAS
PLAZO ADICIONAL 2	:	3.5 MESES
PLAZO ADICIONAL 3	:	2 MESES
PLAZO ADICIONAL 4	:	8 DIAS
PLAZO ADICIONAL 5	:	2 MESES
PLAZO ADICIONAL 6	:	1 MES
PLAZO TOTAL	:	16 MESES Y 8 DIAS

FECHA DE INICIO	:	28 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACION	:	3 de noviembre de 2022

% EJECUCION	:	100,00%
-------------	---	---------

ESTADO DEL CONTRATO : TERMINADO: El contrato se encuentra terminado avance del 100%, se intervinieron las instalaciones del edificio de bienestar en las que se encuentran las oficinas de psicología, enfermería, odontología, batería de baños, sala audiovisual docentes, papelería, auditorio, pasillos, sala egresados, ludoteca,

Edificio administrativo: Este edificio incluye la intervención de las oficinas de Secretaría rectoría, Coordinación académica, Contabilidad académica, Almacén, Pagaduría, SIMAT y secretaria general, pasillos y dos baños

Espacio Público: Se ejecutó una (1) cancha multifuncional, (1) cancha para futbol en arenilla, zonas arborizadas, instalación de mesas de picnic, mesas de ping pong, juegos de calistenia y zonas de circulación en adoquín, decks, amueblamiento urbano, entre otras.

Adicionalmente también se están interviniendo las porterías sobre la Carrera . 30 y la Calle 10 junto con la vía vehicular paralela al edificio central, con sus respectivas circulaciones peatonales y zonas verdes.

REGISTRO FOTOGRAFICO

URBANISMO - instalacion Adoquín y Bolardos - ANTES	URBANISMO Instalación de Adoquín y Bolardos - DESPUES
	
URBANISMO CONSTRUCCIÓN DE BANCAS - ANTES	URBANISMO CONSTRUCCIÓN DE BANCAS - DESPUES
	



URBANISMO - PORTERÍA CRA 30 – ANTES	URBANISMO - PORTERÍA CRA 30 – DESPUES
	
URBANISMO – ZONA FRENTE A BIENESTAR - ANTES	URBANISMO ZONA FRENTE A BIENESTAR – DESPUES
	
URBANISMO – ZONA CIRCULACION CANCHA - ANTES	URBANISMO – ZONA CIRCULACION CANCHA - DESPUES
	



**LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA:
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES**

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 172 DE 2022 “ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

IDENTIFICACION EN SECOP:	SI-SI-CMA-008-2022
CONTRATISTA:	JIMENEZ CASTRO S.A.S
PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 99.762.624,00
ACTA DE MODIFICACION No 1:	\$ 68.658.329
ACTA DE MODIFICACION No 2:	\$ 95.189.097
ADICIONAL EN PLAZO No 1:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
ANTICIPO:	N/A
VALOR TOTAL:	\$ 95.189.097
FECHA DE INICIO:	29/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28/09/2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2022
PORCENTAJE DE AVANCE:	100 %
ESTADO DEL CONTRATO:	Liquidado

Con el fin de dar cumplimiento al contrato de consultoría, se realizaron las actividades necesarias para la toma de muestras tales como la ejecución de sondeos y apiques en cada uno de los frentes, posteriormente se procedió a llevar las muestras al laboratorio para conocer las características del suelo y así definir las propiedades geométricas, hidráulicas y de deformabilidad del mismo para su evaluación de integración suelo-estructura.



El contratista realizo y presento los informes de caracterización geotécnica de los frentes definitivos.

	FRENTE
1	LA SALLE
2	IE ORIENTE MIRAFLORES
3	BORDE SUR LA VICTORIA
4	ANTONIA SANTOS
5	AURELIO SEDE C
6	CALLE 83 DIAMANTE
7	PLAZA GUARIN
8	CAI CENTENARIO
9	CORREDOR AMBIENTAL 1

	FRENTE
10	CORREDOR AMBIENTAL 2
11	PARQUE ROMERO
12	PROVENZA CALLE 110
13	JORGE ELIECER GAITAN
14	PILAR SEDE C
15	SC VIJAGUAL
16	CRA 26
17	SAN MARTIN
18	INEM

	FRENTE
19	IE SANTANDER
20	PARQUE EXTREMO
21	CRISTAL BAJO
22	CALLE 32

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 205 DE 2022 “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MITIGAR LA EROSION Y/O DESLIZAMIENTOS EN TALUDES DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

IDENTIFICACION EN SECOP:	SI-SI-CMC-004-2022
CONTRATISTA:	JIMENEZ CASTRO S.A.S
PLAZO INICIAL:	45 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 54.758.816,88
ANTICIPO:	N/A
FECHA DE INICIO:	29/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/10/2022
PORCENTAJE DE AVANCE:	100 %
ESTADO DEL CONTRATO:	Liquidado

No se realizaron modificaciones durante la ejecución del contrato.

El área directa del estudio estuvo localizada en la zona de influencia de los sectores de: CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPO REAL Y VIA DE ACCESO A BALCONES DEL SUR, BARRIO SAN PEDRO CLAVER Y BARRIO ESPERANZA II , del Municipio de Bucaramanga departamento de Santander, una vez terminado el plazo contractual se pudieron remitir por parte del contratista los resultados obtenidos del estudio realizado para el diseño de las obras de protección requeridas sin ningún inconveniente.

EXPLORACION EN CAMPO REAL:


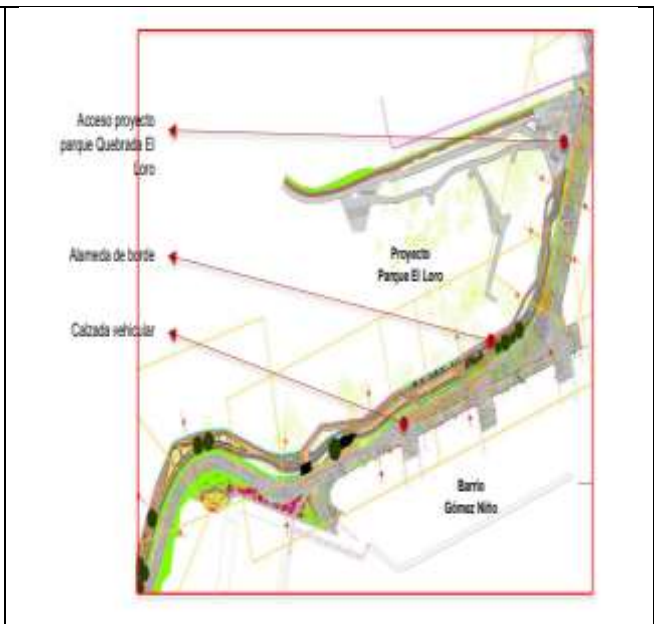


EXPLORACION EN SAN PEDRO CLAVER:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 331 de 2021: “REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53-54. CONEXIÓN ORIENTE-OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR”.

VALOR FISCAL INICIAL	:	\$ 2.885.000.000
VALOR FISCAL ADICIONAL	:	N/A
VALOR FISCAL TOTAL	:	\$ 2.885.000.000
PLAZO INICIAL	:	10 MESES
PLAZO ADICIONAL	:	45 DÍAS
PLAZO INICIAL + ADICIONAL	:	11 MESES Y MEDIO
FECHA DE INICIO	:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	97%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se terminó el día 18 de noviembre de 2022 y se encuentra en proceso de recibo final con un avance del 97%.

	
<p>Localización general</p>	<p>Descripción general tramo 2</p>



Vista general tramo 2



Vista general tramo 2



CONTRATO DE CONSULTORIA No. 222 DE 2022: "ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL MANTENIMIENTO DEL PUENTE VIADUCTO PROVINCIAL LA NOVENA - ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 60.360.365

www.bucaramanga.gov.co



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

VALOR FISCAL ADICIONAL	:	N/A
VALOR FISCAL TOTAL	:	\$ 60.360.365
PLAZO INICIAL	:	UN MES Y MEDIO (1,5) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	15 DÍAS
PLAZO INICIAL + ADICIONAL	:	2 MESES
FECHA DE INICIO	:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

**GOBERNAR
ES HACER**

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se terminó el día 17 de noviembre de 2022 y se encuentra en proceso de recibo final con un avance del 100%.

	
Inspección visual	Inspección visual

	
Visita de inspección técnica	Elementos: Tirantes (Tubo antivandario y banda elastomérica).

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183 DE 2022: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE NARIÑO SOBRE EL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 233.416.259,00
VALOR FISCAL ADICIONAL:	\$ 18.690.288,75.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 252.106.547,75
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES, TRECE (13) DIAS
PLAZO INICIAL + ADICIONAL: DIAS	TRES (03) MESES, VEITIOCHO (28)
FECHA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se terminó el día 23 de diciembre de 2022 y se encuentra en proceso de recibo final con un avance del 100%

1. Topografía
2. Levantamiento del puente
3. Hidrología e hidráulica
4. Geotecnia
5. Diseño geométrico
6. Estructural
7. Presupuesto
8. Programación
9. Especificaciones técnicas
10. Plan de manejo ambiental
11. Plan de manejo de transito
12. BIM
13. Estratigrafía



Estado actual del puente Nariño

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 195 DE 2022 -: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA “ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

Valor fiscal:	\$ 867.866.417,58
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses Quince (15) días
Fecha de inicio:	17 de agosto de 2022
Fecha de terminación:	29 de diciembre de 2022
Porcentaje avance:	40.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, en el año 2023 se adicionara en plazo y valor para incluir nuevo diseños de acueductos veredales.

PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 332 DE 2021 -: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2,3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor fiscal:	\$ 134.096.188,80
Valor Adicional:	\$ 39.723.720,00
Plazo inicial:	Cuarenta (40) días
Plazo adicional:	Cambia plazo total siete (7) meses
Fecha de inicio:	01 de diciembre de 2021
Fecha de terminación:	10 de enero de 2022
Nueva fecha de terminación:	Junio 30 de 2022
Nueva fecha de terminación:	Diciembre 30 de 2022
Porcentaje avance:	75.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **suspendido**, en el año 2023 se adicionara en plazo ya que quedaron recursos para ejecutar en la vigencia 2023, suministrando agua potable a los sectores V. Pedregal sectores Porvenir y Los Cuadros, V. Los Santos Bajos, Chitota, Bonanza Campestre y Villa Carmelo.



**CONTRATO DE OBRA 250 DE 2022 UNION TEMPORAL ROSABLANCA
“OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS LA MALAÑA Y VEREDA ROSA BLANCA EN
EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

Valor fiscal:	\$ 173.346.072,00
Valor Adicional:	\$ 49.928.330,00
Plazo inicial:	Dos (2) meses Siete (7) días
Fecha de inicio:	24 de octubre de 2022
Fecha de terminación:	Diciembre 30 de 2022
Porcentaje avance:	41.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **suspendido**, en el año 2023 se adicionara en plazo ya que quedaron recursos para ejecutar en la vigencia 2023.

REGISTRO FOTOGRAFICO



**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:
LA VIDA ES SAGRADA**

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 66 - 05/04/2022 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Este contrato fue adjudicado a JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ, el día 05 de abril del 2022 por un valor de \$ 2.622.405.105,00, y se firmó acta de inicio el día 29 de abril del 2022. Se realizó un adicional por valor de \$ 784.776.200, este contrato se ejecutó en su totalidad en un tiempo de siete meses en los cuales se realizó la atención correspondiente al macaneo y limpieza de las zonas verdes de los parques y áreas públicas como separadores,

vías, laterales y zonas verdes en diferentes áreas de la ciudad de Bucaramanga correspondientes a cada comuna el cual consistió en el corte de césped, maleza, arreglo de setos, barrido y recolección de los desechos vegetales generados por las actividades desarrolladas, de igual manera se atendieron permanentemente los diferentes parques que son visitados a diario ubicados en el municipio de Bucaramanga.

Durante la ejecución del contrato se realizó el mantenimiento a 203 parques y zonas verdes ubicadas en el municipio de Bucaramanga en las diferentes comunas de la ciudad esta actividad se ha realizado tres veces a cada área correspondiente a una frecuencia de mes y medio y en algunas áreas se ha tenido que intervenir más seguido por las lluvias frecuentes que se han presentado este año, lo que ha generado el crecimiento de la maleza, esta actividad se atendió con 22 cuadrillas conformadas por un macaneador y dos auxiliares, de igual manera con 80 parqueros los cuales realizaban el mantenimiento de las zonas verdes ubicadas en los parques o espacios públicos correspondiente al barrido de hojas secas, riego y fertilización.

Otro de los items que se adelantó con el contrato de mantenimiento es la siembra de grama dulce en los siguientes parques de la ciudad.

- Parque Santander 260m2
- Parque Cordoncillos – 91 m2
- Parque Turbay – 850 m2
- Parques Bosque del Cacique – 3.460 m2
- Parque Sarrapios – 727 m2
- Ágora la Feria – 50 m2

Resumen financiero del contrato de obra 066/2022	
Valor presupuesto oficial	\$ 3.407.181.305,00
Valor anticipo entregado	No tuvo anticipo
Valor acta parcial 1	\$ 535.088.340,00
Valor acta parcial 2	\$ 466.205.400,00
Valor acta parcial 3	\$ 458.407.400,00
Valor acta parcial 4	\$ 486.607.900,00
Valor acta parcial 5	\$ 487.837.400,00
Valor acta parcial 6	\$ 489.605.190,00
Total, Pagado a la fecha	\$ 2.923.751.630,00
Pendiente por Pagar	\$ 483.429.675,00

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 313 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Se suscribió un convenio Interadministrativo con el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA el día 11 de noviembre del 2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Se firmó acta de inicio el día 12 de diciembre del 2022 con una duración en tiempo de ocho meses para garantizar el mantenimiento diario y permanente de los parques y áreas verdes de la ciudad.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

● Valor Total del Convenio:	\$ 4.212.665.314,47
● Aportes del Municipio:	\$ 3.948.051.805,00
● Aportes Área Metropolitana:	\$ 264.613.509,47
● Valor Desembolso:	\$ 592.208.617,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
HACER**



PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

CONTRATO DE OBRA N° 24 DE 2022: CONSORCIO EQUIPO URBANO PL "ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 1".

Valor Inicial:	\$ 3.945.859.179.00
Adicional en Valor y Plazo:	\$ 960.840.527.00
Valor Total:	\$ 4.906.699.706.00
Plazo Inicial:	5 meses
Plazo Adicional:	Tres (3) meses Diez y Siete (17) días
Fecha de Inicio:	28 de Marzo de 2022
Fecha de terminación:	14 de diciembre de 2022

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se ejecutó con un avance del 100 %,

El contrato finalizó en la fecha estipulada quedando pendiente arreglos pequeños que quedaron consignados en un acta de ejecución.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

DESPUES



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipalidad

**GOBERNAR
HACER**



22 abr. 2022 10:12:31 a. m.
Escenario deportivo Portal de los angeles
#Bucaramanga Santander



VEREDA VIJAGUAL

ANTES



261°W
Bucaramanga-San Alberto
Bucaramanga
Santander
proyecto vijagual Norte- bucaramanga Santander
20 abr. 2022 2:45:30 p. m.

DESPUES



BOSQUE NORTE

ANTES



DESPUES



15 nov. 2022 8:53:59 a. m.
7 1436025N 78 1322232165566W
2b-30-Barrera 15d
Bucaramanga
Santander

CONTRATO DE OBRA N° 25 DE 2022: TITÁN INGENIERÍA INTELIGENTE SAS
“ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER
GRUPO 2 ”.

Valor Inicial:	\$3.166.887.555,00
Adicional en Valor:	\$501.800.376.00
Valor Total:	\$3.668.687.931.00
Plazo Inicial:	Cuatro (4) Meses
Adicional Plazo:	cuatro (4) Meses Diez y Siete (17) días
Fecha de Inicio:	28 de Marzo del 2022
Fecha de Terminación:	14 de diciembre del 2022

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se ejecutó con un avance del **100.00%**

El contrato finalizo en la fecha estipulada quedando pendiente arreglos pequeños que quedaron consignados en un acta de ejecución.

GIRARDOT

ANTES



DESPUES



SANTANDER

ANTES



DESPUES



DON BOSCO

ANTES



DESPUES



SAN PIO

ANTES



DESPUES



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 26 DE FECHA 10 de febrero de 2022:
“ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 3.”

VALOR INICIAL : \$ 5.247.985.246
 VALOR ADICIONAL 1 : \$ 943.239.434
 VALOR TOTAL ACTUAL : \$ 6.191.224.680

VALOR ANTICIPO INICIAL : \$ 1.574.395.574
 TOTAL ANTICIPOS : \$ 1.574.395.574



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

PLAZO INICIAL : 6 MESES
PRORROGA No 1 : 25 DÍAS
PRORROGA No 2 : 54 DÍAS
PLAZO TOTAL : 6 MESES Y 79 DÍAS

FECHA DE INICIO : 28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION : 27 de septiembre de 2022
SUSPENSION No. 1 : 14 días (20/10/22 – 2/11/22)
SUSPENSION No. 2 : 20 días (27/12/22 – 15/01/23)
NUEVA FECHA DE TERMIN: 18 de enero de 2023
% EJECUCION : 85.19%

ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO

Dentro de las observaciones que se encuentran durante el periodo del presente informe, se notifica la falta de personal en los diferentes frentes y se informa que el contrato cuenta con un avance de obra programado del 92.26 % correspondiente al valor de \$5.712.023.889,77 y un ejecutado del 85.19% que corresponde al valor de \$5.274.304.304,89.

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE AURELIO MARTINEZ SEDE B - ANTES



IE AURELIO MARTINEZ SEDE B - DESPUES



ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES
GERENCIAR**



SAN GERARDO - ANTES



SAN GERARDO - DESPUES



LOS NARANJOS- ANTES



LOS NARANJOS- DESPUES



LA GRAN LADERA- ANTES



LA GRAN LADERA - DESPUES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 27 DE FECHA 10 de febrero de 2022:
**“ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
 SANTANDER GRUPO 4.”**

VALOR INICIAL : \$ 5.049.581.350
 VALOR ADICIONAL No. 1 : \$ 539.318.859,00
 VALOR TOTAL ACTUAL : \$ 5.588.900.209,00

VALOR ANTICIPO INICIAL : \$ 1.514.874.405
 TOTAL ANTICIPOS : \$ 1.514.874.405

PLAZO INICIAL : 7 MESES
 PRORROGA No. 1 : 54 DÍAS
 PLAZO TOTAL : 7 MESES Y 54 DIAS

FECHA DE INICIO : 23 de marzo de 2022
 SUSPENSIÓN No. 1 : 14 días
 FECHA DE TERM. : 18 de enero de 2023
 % EJECUCIÓN : 60.40%
 ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO

El contrato cuenta con un avance programado de 90.31% correspondiente al valor de \$5'047.335.778,76 y un avance ejecutado del 60.40% correspondiente al valor de \$3.375.695.726,24, lo cual nos indica un retraso del 29.91% que ha sido notificado por la interventoría, donde indica la falta del personal especialmente en el frente de bosques del cacique.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
BUCARAMANGA**



PARQUE FONTANA- ANTES



PARQUE FONTANA- DESPUES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 29 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 1” –
Parque Ferrocarriles

VALOR INICIAL : \$ 7.620.834.131,00
 VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 2.286.250.239,00
 ADICIONAL VALOR. : \$ 158.054.823,33
 FECHA DE INICIO : 28 marzo de 2022
 PLAZO INICIAL : 10 Meses.
 FECHA DE TERM INICIAL : 27 de enero 2023
 % EJECUCION : 26.22%
 ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN





ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
HACER**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 30 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 2” –
Cancha Café Madrid

VALOR INICIAL	:	\$ 4.427.144.706,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 1.328.143.411,80
VALOR ADICIONAL.	:	\$ 632.046.432,00
FECHA DE INICIO	:	28 marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	06 Meses.
PLAZO ADICIONAL	:	03 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	27 de septiembre 2022
NUEVA FECHA DE TERMI.	:	27 de diciembre de 2022
% EJECUCION	:	77%
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO





ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

GOBERNAR
BUCARAMANGA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 34 DE FECHA 28 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 3” – Parque La Feria

VALOR INICIAL : \$ 6.249.897.563,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 1.874.969.268,9
FECHA DE INICIO : 07 de abril de 2022
PLAZO INICIAL : 09 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL : 06 de enero de 2023
% EJECUCION : 10,55%
ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO





ALCALDÍA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
BUEN**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 31 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 4” – Parque Canelos

VALOR INICIAL	:	\$ 6.874.999.999,0
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 1.462.499.999,7
FECHA DE INICIO	:	30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	07 Meses.
PLAZO ADICIONAL	:	03 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	29 de octubre de 2022
NUEVA FECHA DE TERMI.	:	29 de enero de 2023
% EJECUCION	:	64%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUCIÓN






ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ACER**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 33 DE FECHA 25 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 5” -
Parque Porvenir

VALOR INICIAL	:	\$ 7.925.167.869,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 2.377.550.360,70
FECHA DE INICIO	:	30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	10 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	29 de enero de 2023
% EJECUCION	:	44%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUCIÓN

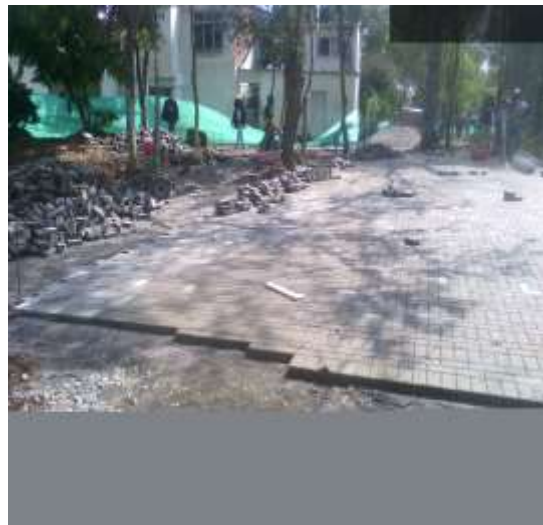



ALCALDÍA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
HACER**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 167 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022 "ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

VALOR INICIAL	:	\$ 10.637.401.017,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 3.191.220.305,09
VALOR ADICIONAL	:	\$ 366.824.761,23
FECHA DE INICIO	:	09 de agosto 2022
PLAZO INICIAL	:	6 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	08 de febrero de 2023
% EJECUCION	:	10,70%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUCIÓN





ALCALDÍA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
HACER**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 136 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022 "RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" - Grupo 1

VALOR INICIAL : \$ 729.277.245,00
 VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 218.783.173,50
 VALOR ADICIONAL : \$ 323.348.804,66
 FECHA DE INICIO : 01 de agosto 2022
 PLAZO INICIAL : 5 Meses.
 FECHA DE TERM INICIAL : 30 de diciembre de 2022
 % EJECUCION : 87,63%
 ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO





ALCALDÍA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES
GERENCIAR**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022 “RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” – Grupo 2

VALOR INICIAL : \$ 744.914.177,00
 VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 223.474.253,10
 FECHA DE INICIO : 01 de agosto 2022
 PLAZO INICIAL : 5 Meses.
 FECHA DE TERM INICIAL : 30 de diciembre de 2022
 % EJECUCION : 98%
 ESTADO DEL CONTRATO : EN LIQUIDACIÓN





ALCALDÍA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

GOBERNAR
BUCARAMANGA



CONTRATO DE OBRA 36 DE 2022 - GRUPO 3 (GRUPO J8 SAS) "ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3.

Valor fiscal:	\$ 459.976.380,00
Valor Adicional:	\$ 111.252.208,00
Valor Total:	\$ 571.228.588,00
Plazo inicial:	Dos (2) meses
Plazo Adicional:	Tres (3) meses tres (3) dias
Fecha de inicio:	28 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	27 de Mayo de 2022
Nueva Fecha de Terminación:	Noviembre 11 de 2022
Porcentaje avance:	87.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **suspendido**, en el año 2023 se adicionara en plazo y valor para lograr la culminación de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO DE OBRA 37 DE 2022 - : ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2.

Valor fiscal:	\$ 406.829.486,00
Valor Adicional:	\$ 93.779.508,00
Valor Total:	\$ 500.608.994,00
Plazo inicial:	Dos (2) meses
Plazo Adicional:	Cuatro (4) meses Veintiocho (28) dias
Fecha de inicio:	28 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	27 de mayo de 2022
Nueva Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2022
Porcentaje avance:	41.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, en el año 2023 se adicionara en plazo ya que quedaron recursos para ejecutar en la vigencia 2023.



CONTRATO DE OBRA 38 DE 2022 -: CONSORCIO PRACI “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 1.

Valor fiscal:	\$ 479.947.142,00
Valor Adicional:	\$ 96.968.284,00
Valor Total:	\$ 576.915.426,00
Plazo inicial:	Dos (2) meses
Plazo Adicional:	Cuatro (4) meses Veintiocho (28) días
Fecha de inicio:	28 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	27 de mayo de 2022
Nueva Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2022
Porcentaje avance:	14.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, en el año 2023 se adicionara en plazo ya que quedaron recursos para ejecutar en la vigencia 2023.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 163 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA INCAL NIT: 901606477-1
VALOR INICIAL:	\$ 31.221.573.233,00
PLAZO INICIAL:	6 MESES
INTERVENTORÍA:	SOLIUN INGENIERIA S.A.S. NIT: 901114547-5
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	1° DE MARZO DE 2023

PORCENTAJE AVANCE FISICO: 10,00 %

AVANCE FINACIERO: 6,21%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra en ejecución, con un avance físico del 10.00% con respecto a la programación y plazo actual, de acuerdo lo anterior se puede apreciar un retraso, quedando 2 meses para finalizar el contrato, los retrasos se han presentado debido de acuerdo a los siguientes precedentes:

- Ajustes en los diseños topográficos, niveles y pendientes que no se adaptaban a lo encontrado en terreno, por lo que se tuvo que realizar replanteos topográficos y socializar los cambios en mesas de trabajo con profesionales de la alcaldía.
- Redes eléctricas: debido a que el proyecto plantea la necesidad de soterrar la mayoría de tramos de redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público, en terreno se han ido encontrando obstáculos que no han permitido un avance eficiente, es tema de redes de acueducto y alcantarillado los cuales se han ido cruzando con los diseños estipulados, por lo que se ha tenido que programar

visitas a campo y reuniones con personal de la ESSA, de la alcaldía y especialistas eléctricos tanto del contratista como de la interventoría, con el fin de ir liberando tramos e ir avanzando en el soterrado de las redes. Estas actividades hacen parte de la ruta crítica debido a que se deben dejar instaladas los ductos para poder conformar rasante y rematar con los acabados según diseños.

- El factor social es un componente muy importante en la ejecución de cualquier proyecto, inicialmente el contratista tenía planteada la opción de iniciar por la calle 37 entre cra 11 y 15, sin embargo, se presentó una oposición por parte del gremio comercial del sector alegando que iban a tener afectaciones teniendo en cuenta la temporada de diciembre, por lo que fue necesario llegar a un acuerdo y replantear el inicio de las obras en otros frentes.
- En el tramo inicial comprendido entre la carrera 11 entre calles 41 y 42 se presentaron varios inconvenientes que retrasaron el avance normal del contrato, y que radica principalmente en los árboles existentes, debido a que la ubicación de estos árboles interfería con lo planteado en los diseños, específicamente la proyección de redes eléctricas y redes pluviales (canales de monoblock para desagües de agua lluvia) y principalmente con la ubicación de contenedores de raíces diseñados para estos árboles, hubo que replantear la ubicación de estos contenedores, así como realizar procedimientos técnicos de poda aérea y radicular que minimizaran el impacto a los mismos, por lo que fue necesario pedir concepto técnico de especialistas forestales del contratista, interventoría y alcaldía.
- La empresa de alcantarillado de Bucaramanga (EMPAS) tenía en su programación realizar intervenciones para el cambio de tubería de alcantarillado en algunos tramos específicos que hacen parte de la intervención del proyecto, por lo que fue necesario que el contratista tuviera que reprogramar sus actividades mientras la empresa realizaba sus intervenciones con el fin de no interferir en la ejecución de las obras.

Después de los inconvenientes presentados y a medida que se han ido liberando actividades, en el último mes se ha incrementado la ejecución de actividades teniendo en cuenta los imprevistos que se puedan presentar y dando solución mediante mesas de trabajo concertadas entre las partes (contratista, interventoría y alcaldía). A la fecha se tienen intervenidos 4 frentes de trabajo donde se han realizado diferentes actividades así:

Carrera 11 entre calles 37 y 41

- Demoliciones de placa de piso
- Instalación de ductos redes de Media tensión, baja tensión, alumbrado público y redes telemáticas (comunicaciones).
- Excavación y construcción de Cajas de inspección MT, BT y AP
- Manija hidráulica pluvial de 10" y pozos de inspección para canal de monoblock
- Poda aérea y radicular en los árboles existentes
- Excavación y acondicionamiento red de acueducto existente y acometidas domiciliarias
- Excavación y construcción de 4 contenedores de raíces

Carrera 11 entre calles 41 y 42

- Demoliciones de placa de piso y pavimento asfáltico

Instalación de ductos redes de Media tensión, baja tensión, alumbrado público y redes telemáticas (comunicaciones).

- Excavación y construcción de Cajas de inspección MT, BT y AP
- Pozos de inspección para canal de monoblock
- Pozo de inspección para desagüe aguas pluviales
- Instalación canal monoblock
- Excavación y acondicionamiento red de acueducto existente y acometidas domiciliarias
- Excavación para contenedores
- Instalación de sardinel prefabricado 20x50x80

Carrera 11 entre calles 42 y 43

- Demoliciones de placa de piso y pavimento asfaltico
- Instalación de ductos redes de Media tensión, baja tensión, alumbrado público y redes telemáticas (comunicaciones).
- Excavación y construcción de Cajas de inspección MT, BT y AP
- Excavación y acondicionamiento red de acueducto existente y acometidas domiciliarias
- Excavación y acondicionamiento red de alcantarillado existente y acometidas domiciliarias
- Excavación para contenedores

Carrera 37 entre carreras 11 y 12

- Demoliciones de placa de piso y pavimento asfaltico
- Instalación de ductos red de Media tensión
- Excavación y acondicionamiento red principal de alcantarillado existente

Obras de mejoramiento vial

Teniendo en cuenta el plan de manejo del tráfico, se están realizando actividades de reparcho como mejoramiento a las vías aledañas del proyecto y que hacen parte del plan de desvíos establecidos en el PMT, en un perímetro que comprende desde la calle 28 hasta la calle 45 y desde la cra 5 hasta la cra 20. Las actividades ejecutadas para cada reparcho son:

- Corte y demolición de pavimento
- Conformación de calzada y riego de imprimación con emulsión asfáltica
- Suministro e instalación de mezcla densa en caliente MDC-19

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Demoliciones placa de piso






Mejoramiento vial (reparcheos vías - rutas alternas del área de influencia del proyecto)

Calle 36 con carrera 14



Carrera 11 con calle 34

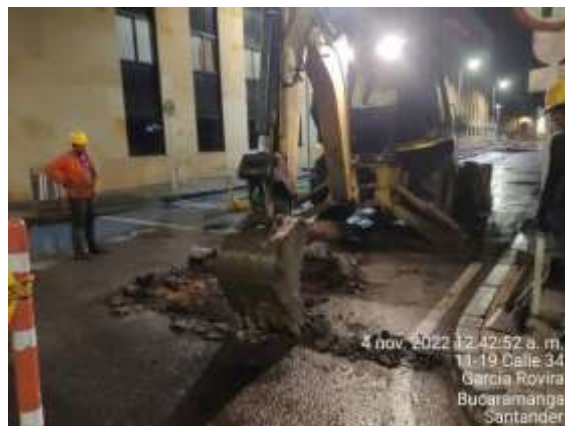

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 248-2021 Objeto: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 7, PARQUE MONTERREDONDO”.

GRUPO 7:

VALOR	:	\$2.252.831.768,00
VALOR ANTICIPO	:	\$675.849.529,28 (30%)
VALOR ADICIONAL 1	:	\$476.021.977,00
VALOR TOTAL	:	\$2.728.853.745,00
PLAZO INICIAL	:	6 MESES
PLAZO ACTUAL	:	9 MESES
FECHA DE INICIO	:	22 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	23 de diciembre de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO – Pendiente subsanar detalles finales en
PORCENTAJE AVANCE	:	Obra y en proceso de Recibo Final. 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Se realizan trabajos en varios frentes de trabajo como es la superficie de la cancha y construcción de detalles estructurales en la zona de gradería, bordillos para estabilización de taludes, cuneta de borde perimetral de la cancha e instalaciones eléctricas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 151 DE FECHA 19 de julio 2021 Objeto:
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 1, PARQUE CONCORDIA

GRUPO 1:

VALOR INICIAL	:	\$3.393.956.372,00
VALOR ANTICIPOS	:	No tiene anticipo por solicitud del contratista.
VALOR ADICIONAL 1	:	\$497.709.712,00
VALOR ADICIONAL 2	:	\$0,00
VALOR TOTAL	:	\$3.891.666.084.00
PLAZO INICIAL	:	7 meses
PLAZO ADICIONAL	:	30 días
PLAZO ADICIONAL 2	:	22 días
FECHA DE INICIO	:	09 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	15 de mayo de 2022
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO – En proceso de Recibo Final

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

GOBERNAR
MEJOR



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 152 DE FECHA 19 de julio 2021

Objeto: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 3, ESPACIO PÚBLICO LAS AMÉRICAS.

GRUPO 3:

VALOR INICIAL	:	\$1.267.985.719,00
VALOR ANTICIPOS	:	\$380.395.715,70
VALOR ADICIONAL 1	:	\$109.752.727,63
VALOR ADICIONAL 2	:	\$0,00
PLAZO INICIAL	:	4 meses y 15 días.
PLAZO ADICIONAL 1	:	2 meses
PLAZO ADICIONAL 2	:	1 mes
PLAZO ADICIONAL 3	:	17 días
PLAZO TOTAL	:	8 meses y 2 días
FECHA DE INICIO	:	27 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	4 de agosto de 2022
% EJECUCION	:	80,5%
ESTADO DEL CONTRATO	:	Se encuentra en Terminación de Actividades y Recibo Final

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
HACER**



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 327 DE 2021 Entre el Municipio de Bucaramanga y la FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS COMPLEMENTARIOS, ASCENSOR Y OBRAS CIVILES DEL LOBBY DEL TEATRO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 2.600.000.000
DESEMBOLSO No 1 (50%):	\$ 1.300.000.000
DESEMBOLSO No 2 (40%):	\$ 1.040.000.000
FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
SUSPENSION No 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2021
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 1:	17 DE ENERO DE 2022
REINICIO No 1:	17 DE FEBRERO DE 2022
ADICIONAL EN PLAZO No 1:	24 DE FEBRERO DE 2022
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 2:	\$1.300.000.000
DESEMBOLSO No 3 (50% ADICIONAL):	\$ 650.000.000 – NOVENTA Y SEIS (96) DIAS
SUSPENSION No 1:	13 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION:
PORCENTAJE DE EJECUCION:
ESTADO DEL CONVENIO:


10 DE FEBRERO DE 2023
80%
EN EJECUCION

El convenio se encuentra actualmente en ejecución con un porcentaje del 80%, dentro de las actividades que se vienen adelantando se encuentra la instalación de Los sistemas tales como equipos de SONIDO, ILUMINACIÓN, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, Y SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERÍAS COMPLEMENTARIOS, los cuales serán implementados en el Teatrino de la escuela municipal de artes (EMA) ubicado en el Edificio de apoyo del Teatro, cuya zona a la fecha se encuentra con el piso y aislamiento acústico terminado y en instalación de tratamiento acústico.

FOTOGRAFIAS



INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO

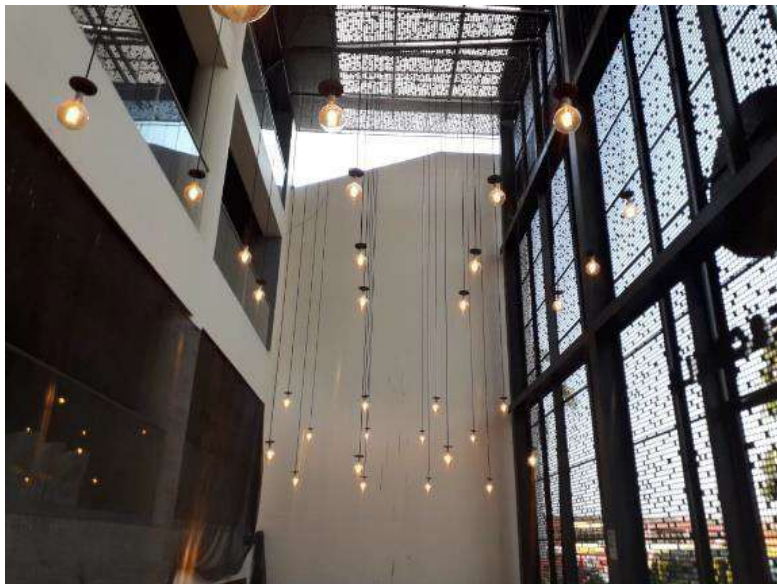

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	No. 265 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021 GRUPO 02
	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S
	NIT. 900.173.700,00
OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 01 FISCALIA	
VALOR INICIAL	\$ 636.173.700,00
VALOR ANTICIPO	\$ 318.086.850,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 57.522.300
VALOR TOTAL	\$ 693.696.000
PLAZO INICIAL	2 MESES Y 15 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 1	14 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 2	42 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 3	15 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 4	45 DIAS
PLAZO TOTAL	6 MESES Y 11 DIAS
FECHA DE INICIO	03-11-2021
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	28-01-2022
FECHA REINICIACIÓN N° 1	16-02-2022
FECHA SUSPENSIÓN N° 2	06-04-2022
FECHA DE REINICIACIÓN N° 2	19-12-2022
ULTIMA FECHA DE TERMINACION	11-02-2023
% EJECUCION	94%
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Una vez expedida la orden de reinicio de actividades, el Contratista retomó actividades de obra luego de la suspensión de 258 días, el día 19 de diciembre de 2022. A continuación, se relaciona el listado de actividades ejecutadas por el Contratista, entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2022:

UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (U.R.I.). (Oficina de inspección a cadáver)

- Instalación de puerta enrejada, localizada entre la oficina de inspección a cadáver y portería.
- Instalación de láminas de fibrocemento para muro divisorio de la oficina de inspección a cadáver.
- Instalación de puerta metálica de acceso a la oficina de inspección a cadáver.
- Instalación de lámina lineal de fibrocemento sobre reja del paramento exterior, parasoporte de aires acondicionados y cielo falso.
- Instalación de cielo falso en fibra mineral.
- Instalación de 10 unidades de luminaria tipo LED 60 X 60 cm para techo de la oficina de inspección a cadáver.
- Instalación de acometida de red eléctrica para equipos de aire acondicionado.
- Instalación de dos equipos de aires acondicionado tipo Minisplit 18.000 BTU.

CELDAS INTERNAS

Instalación de 6 planchuelas de seguridad en las puertas de barrotes de las celdas de detención, en reemplazo de las inicialmente instaladas. Se atienden observaciones de funcionarios de la Fiscalía con respecto al tamaño de las mismas, y se realizan los correctivos correspondientes, sin que esto implique sobrecostos. Se lleva a cabo aplicación de pintura epóxica anticorrosiva





ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES
TRABAJAR**

<p>Instalación de puerta enrejada acceso URI.</p>	<p>Instalación de muro en lámina de fibrocemento y puerta metálica - URI</p>
	
<p>Instalación de cielo falso oficina de inspección a cadaver</p>	<p>Instalación de luminarias LED oficina de inspección a cadaver</p>
	
<p>Instalación de aires acondicionados Tipo Minisplit - URI</p>	
	
<p>Instalación de unidades condensadoras del aire acondicionado - URI</p>	
<p>CELDAS DE PASO</p>	



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
MEJOR**



Instalación de planchuelas de seguridad en puertas de barrotes de celdas de paso

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 146 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 2.245.556.033
 VALOR FISCAL ADICIONAL : \$ 1.100.131.989,00
 VALOR FISCAL TOTAL : \$ 3.345.688.022,00
 PLAZO INICIAL : CUATRO (04) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DIECISEIS (16) DIAS
 PLAZO INICIAL + ADICIONAL : CUATRO (04) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
 FECHA DE INICIO : 08 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA DE TERMINACIÓN : 23 DE DICIEMBRE DE 2022
 PORCENTAJE AVANCE : 57,42%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se suspendió el día 22 de diciembre de 2022 y se encuentra con un avance del 57,42%, e incluye la intervención de las siguientes direcciones en los barrios correspondientes de la ciudad:

Nº	BARRIO	DIRECCIÓN
1	Barrio La Aurora	Glorieta Mesón de los Búcaros
2	Barrio La Universidad	Glorieta Caballo de Bolívar
3	Barrio San Francisco	Carrera 21 17-16 glorieta de san francisco
4	Barrio La Concordia	Carrera 15 con calle 45
5	Barrio Ricaurte	Calle 56 con diagonal 15
6	Barrio Gomez Niño	Diagonal 14 con calle 56
7	Barrio Gomez Niño	Carrera 17 con calle 56
8	Barrio Ciudadela real de minas	Carrera 5 con calle 64
9	Barrio La ciudadela	Diagonal 14 con carrera 9
10	Barrio Cabecera del llano	Carrera 33 con calle 56 (asfalto)
11	Barrio Cabecera del llano	Carrera 36 con calle 56 (asfalto)



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

12	Barrio Centro	Carrera 15 con calle 33
13	Barrio Centro	Carrera 15 con calle 37
14	Barrio Mejoras publicas	Carrera 27 con calle 33
15	Barrio Centro	Carrera 33 con calle 56
16	Barrio Diamante II	Carrera 24 con calle 83
17	Barrio Bolivar	Siete bocas (asfalto)
18	Barrio Sotomayor	Carrera 33 con calle 42
19	Barrio Bolivar	Carrera 27 con AV. La rosita
20	Barrio Cabecera del llano	Carrera 33 con calle 45
21	Barrio Cabecera del llano	Carrera 33 con calle 48
22	Barrio Cabecera del llano	Carrera 27 con AV. Gonzales valencia
23	Barrio Mejoras publicas	Carrera 33 con calle 36
24	Barrio Mejoras publicas	Carrera 33 con calle 34
25	Barrio Cabecera del llano	Carrera 33 con calle 48 (asfalto)
26	Barrio La aurora	Carrera 33 con calle 30A
27	Barrio Cabecera del llano	Carrera 36 con calle 56
28	Barrio Centro	Diag15 con calle 36
29	Barrio Universidad	Carrera 30 con calle 14
30	Barrio Real de minas	Rotonda real de minas
31	Barrio Sotomayor	Carrera 27 con calle 48
32	Barrios Los Alpes	Carrera 46 con calle 32
33	Barrio La concordia	Diag. 15 con carrera 17
34	Barrio Bolivar	Carrera 27 con calle 45
35	Sotomayor	Av. Gonzalles Valencia con calle 54 ASFALTO
36	Cabecera del llano	Cra 33 con calle 45 ASFALTO
37	Mejoras publicas	Calle 36 con carrera 32 glorieta Chicamocha ASFALTO
38	Mejoras publicas	Cra 27 con calle 36
39	San alonso	Cra 33 con Av. Queda Seca
40	Modelo	Calle 45 con carrera 9
41	Alfonso lopez	Bul.Sder carrera 15 con calle 23
42	La concordia	Diag.15 con carrera 16
43	mutualidad	Bul.Sder con calle 14
44	campestre	Cra 33 con Calle 52B
45	bolarqui	Cra 27 con calle 56 ASFALTO




ALCALDIA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

FRENTE 6: Calle 64 con Cra 5

registro fotografico

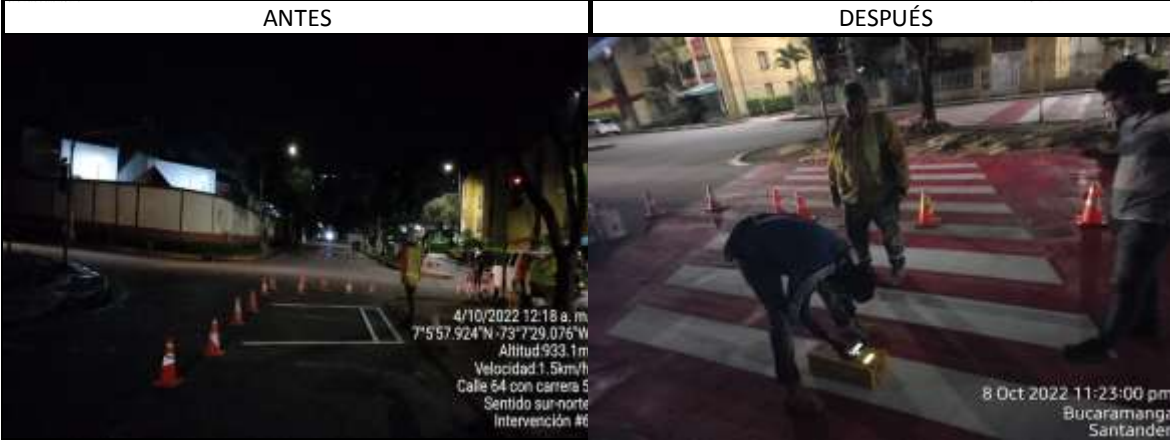

Calle 64 con Cra 5 acceso#6

Calle 64 con Cra 5 acceso#6



Fotografía 7: Calle56 con Dg15 acceso#5

Fotografía 8: Calle56 con Dg15 acceso#5

FRENTE 9: Cra 15 con calle33

registro fotografico



Cra 15 con calle33 acceso#1

Cra 15 con calle33 acceso#1

FRETE 4: Calle 45 con Dg 15	
registro fotografico	
ANTES	DESPUÉS
 <p> <small> 6/11/2022 8:28 p. m. 7 852.417 N -73 7 34.547 W Bucaramanga Altitud: 948.8 m Calle 45 con Diag. 15 Frente de obra #4 </small> </p>	 <p> <small> 11/10/2022 12:44 a. m. 7 852.908 N -73 7 30.186 W Bucaramanga Altitud: 958.1 m Velocidad: 0.0 km/h Calle 45 con Diag. 15 Frente de obra #4 </small> </p>
Calle 45 con Dg 15 Malla antibloqueo 1	Calle 45 con Dg 15 Malla antibloqueo 1
 <p> <small> 10/10/2022 9:21 p. m. 7 852.824 N -73 7 30.774 W Bucaramanga Altitud: 959.6 m Velocidad: 0.0 km/h Calle 45 con Diag. 15 Frente de obra #4 </small> </p>	 <p> <small> 11/10/2022 12:56 a. m. 7 852.74 N -73 7 30.558 W Bucaramanga Altitud: 958.9 m Velocidad: 0.0 km/h Calle 45 con Diag. 15 Frente de obra #4 </small> </p>
Calle 45 con Dg 15 Malla antibloqueo 2	Calle 45 con Dg 15 Malla antibloqueo 2



ALCALDIA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

FRENTE 11: Cra 15 con calle 37

Registro fotografico

**GOBERNAR
ES HACER**

ANTES	DESPUES
	 10/12/22 02:03a. m. Calle 37 Cra 15. Acceso #1
Cra 15 con calle 37 acceso #1	Cra 15 con calle 37 acceso #1
	 10/12/22 02:00a. m. Calle 37 Cra 15. Acceso #2
Cra 15 con calle 37 acceso #2	Cra 15 con calle 37 acceso #2
	 10/12/22 02:02a. m. Calle 37 Cra 15. Acceso #3
Cra 15 con calle 37 acceso #3	Cra 15 con calle 37 acceso #3
	 10/12/22 02:04a. m. Calle 37 Cra 15. Acceso #4
Cra 15 con calle 37 acceso #4	Cra 15 con calle 37 acceso #4

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. Nº 297 de 2022: “MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 763'631.187,00

VALOR ANTICIPO : \$ 229'089.356,10

PLAZO INICIAL : DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO : 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA SUSPENSIÓN N° 1 : 28 DE DICIEMBRE DE 2022

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO : 30 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra suspendido. Se han presentado análisis de precios unitarios para actividades no previstas y requeridas para la ejecución y terminación del objeto del contrato, los cuales están en proceso de revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Hasta la fecha de suspensión del contrato se ha avanzado en actividades de limpieza y pintura de elementos del puente, reposición de mortero y gravilla, en el puente peatonal de la diagonal 15 entre calles 51 y 52 y en el de la carrera 17 con calle 52.

Las actividades para el mantenimiento de los puentes peatonales ubicados en la carrera 15 con calle 35 y 37, anexos a la zona comercial del centro, por solicitud de la comunidad del sector, se realizará inicio de intervención sobre la fecha de reinicio del contrato (16/01/2023).

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pintura escaleras - Puente cra 17 con calle 50 San Miguel



Gravilla plataforma - Puente cra 17 con calle 50 San Miguel



Pintura columnas - Puente cra 15 con calle 50 Perpetuo socorro

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 17 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO 1 (PARQUE LA LOMA)”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.424.543.281,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 453.480.166,70
VALOR TOTAL	:	\$ 1.878.023.447,70
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	:	22 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	10 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO** y en servicio, mejorando las condiciones de acceso y seguridad en este importante parque de la ciudad

Actualmente, en proceso de entrega de los documentos finales, necesarios para iniciar el acto administrativo de liquidación



Sendero Parque La Loma



Luminarias Yoa Midi Parque La Loma

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 18 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO 2- (PARQUE LOS SARRAPIOS)”.

VALOR FISCAL	:	\$ 780.526.955,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 202.489.700,84

VALOR TOTAL	:	\$ 983.016.655,84
PLAZO	:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	:	22 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	02 DE FEBRERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	97,82%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **SUSPENDIDO**.

MOTIVACIONES

Se está esperando el certificado RETIE para realizar los trámites de legalización ante el operador de red.



PARQUE LOS SARRAPIOS



PARQUE LOS SARRAPIOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 19 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER -GRUPO 3-VÍAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.106.491.282,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 242.713.374,17
VALOR TOTAL	:	\$ 1.349.204.656,17
PLAZO	:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	22 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	:	13 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO	:	27 DE SEPTIEMBRE DE
FECHA DE TERMINACIÓN	:	05 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **LIQUIDADADO**



PEATONAL: CALLE 42 # CON CRA 42



PEATONAL: CALLE 42 # CON CRA 40A

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 85 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 1”.

VALOR FISCAL	:	\$ 813.032.264,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE ENERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	94,26%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **EJECUCIÓN**, en su fase intermedia de ejecución, en el cual se realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias y toda la infraestructura eléctrica del alumbrado público.



Cúcuta km 7



Provincia de Soto

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 86 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 2”.

VALOR FISCAL	:	\$ 538.567.888,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE ENERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	94,26%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **EJECUCIÓN**, en su fase intermedia de ejecución, en el cual se realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias y toda la infraestructura eléctrica del alumbrado público.



Barrio Buenos Aires



Via Center

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 87 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 3”.

VALOR FISCAL	:	\$ 741.517.944
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE ENERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	94,26%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **EJECUCIÓN**, en su fase intermedia de ejecución, en el cual se realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias y toda la infraestructura eléctrica del alumbrado público.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



García Rovira



Parque Monter redondo

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 165 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR FISCAL	:	\$ 1.670.299.115,90
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	1 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	28 DE FEBRERO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	46,48%

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCIÓN**, en su fase intermedia de ejecución. El frente de actividades eléctricas está realizando la instalación de luminarias en el interior del parque y el frente civil está realizando la reposición de senderos.



PARQUE LAS CIGARRAS



PARQUE LAS CIGARRAS

www.bucaramanga.gov.co

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 200 DE 2021: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO N-01”.

VALOR FISCAL	:	\$ 932.330.318,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 426.041.800,32
VALOR TOTAL	:	\$ 1.358.372.118,32
PLAZO	:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	29 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **LIQUIDADO**



Parque San Pio Cra 33 con calle 45



Parque San Pio Cra 35a con calle 46

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 201 DE 2021: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO N-02”.

VALOR FISCAL	:	\$ 394.660.423,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 48.778.443,92
VALOR TOTAL	:	\$ 443.438.866,92
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	14 DE JULIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **LIQUIDADO**



Parque Santander Calle 35 con Cra 20



Parque Santander Calle 35 con Cra 20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 106 DE 2021: “CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.583.057.253,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TREINTA Y SEIS (36) DIAS
FECHA DE INICIO	:	15 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	17 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **LIQUIDADO**



CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 218 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1(TRANSFORMADORES)”.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

VALOR FISCAL	:	\$ 656.386.943,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	04 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	98,78%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos al acta de entrega y recibo final.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 244 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2 (TABLEROS)”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.015.817.608,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 187.983.529,54
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 303.805.479,05
VALOR TOTAL	:	\$ 1.507.606.616,59
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	04 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 219 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3 (CRA 15)”.

VALOR FISCAL	:	\$893.418.828,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 269.596.198,31
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 173.773.229,28
VALOR TOTAL	:	\$ 1.336.788.255,59
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	:	04 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 247 DE 2021: “ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 872.617.400,50
VALOR ADICIONAL	:	\$ 433.257.691,60
VALOR TOTAL	:	\$ 1.305.875.092,10
PLAZO	:	SEIS MESES (06) MESES Y (15) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	11 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	25 DE JULIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **LIQUIDADO**.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 303 DE 2021: “AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.180.027.147,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 328.453.833,73
VALOR TOTAL	:	\$ 1.508.480.980,73
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	:	10 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	07 de JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%


ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **LIQUIDADO**



CONTRATO DE COMISION No. 136 DE 2021: “DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 14.680.441.671,56
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	:	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	:	CINCuenta (50) DIAS
PLAZO ADICIONAL 3	:	TREINTA Y UNO (31) DIAS
FECHA DE INICIO	:	13 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado en su parte operativa y funcional. En la actualidad está en etapa de revisión y ajuste previos al recibo final

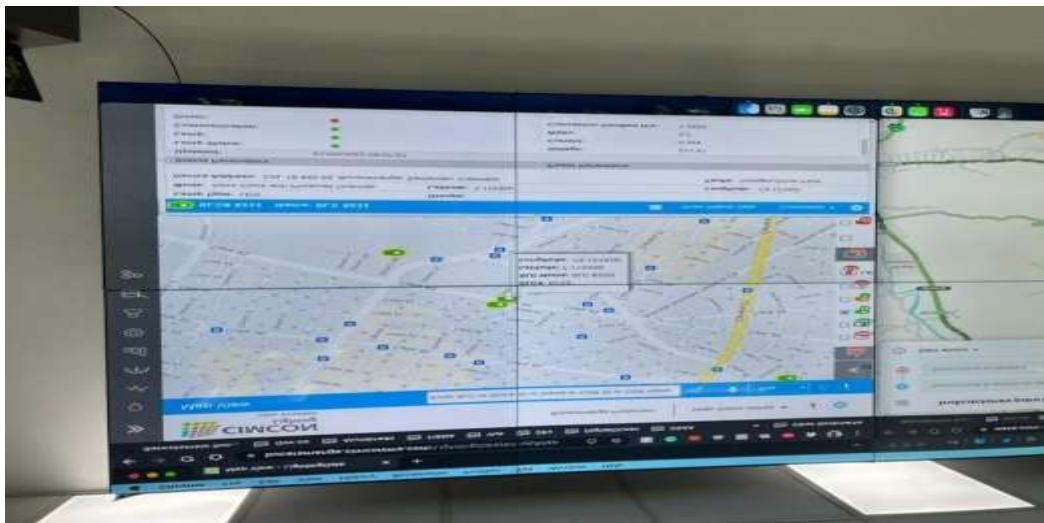

**LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN:
INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES**

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	CUARTO TRIMESTRE 2022
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 6.865.746.666,64
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	\$ 1.203.904.999,98
TOTAL GENERAL	\$ 8.069.651.666,62

OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 311 DE FECHA 10 de NOVIEMBRE de 2021:
“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR INICIAL : \$ 734.243.079,69

VALOR ANTICIPOS	:	\$ 142.272.923,91
PLAZO INICIAL	:	1.5 MESES
FECHA DE INICIO	:	25 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	08 de enero de 2022
SUSPENSION No 1	:	23 de diciembre de 2021
REINICIO No 1	:	01 de febrero de 2022
SUSPENSION No 2	:	16 de febrero de 2022
AMPLIACION 1 A SUSPENSION No 2	:	17 de marzo de 2022
AMPLIACION 2 A SUSPENSION No 2	:	02 de abril de 2022
AMPLIACION 3 A SUSPENSION No 2	:	02 de mayo de 2022
REINICIO No 1	:	20 de mayo de 2022
ADICIONAL EN PLAZO No1	:	20 de mayo de 2022 - DOS (02) MESES Y DOCE (12) DIAS
ADICIONAL EN VALOR No2	:	\$ 134.000.000
ANTICIPO ADICIONAL	:	\$ 40.200.000
ADICIONAL EN PLAZO No3	:	02 de agosto de 2022 – UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS
ADICIONAL EN PLAZO No4	:	29 de septiembre de 2022 – TREINTA Y UN (31) DIAS
ADICIONAL EN PLAZO No5	:	31 de octubre de 2022 – VEINTE (20) DIAS
ADICIONAL EN PLAZO No6	:	18 de noviembre de 2022 – VEINTIDOS (22) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
% EJECUCION	:	95%
ESTADO DEL CONTRATO	:	TERMINADO CON PENDIENTES

El contrato se terminó el pasado 12 de diciembre de 2022, en donde se realizaron actividades según alcance del contrato tales como la instalación de redes eléctricas y de comunicaciones, mejoramiento de zonas húmedas en los pisos 1-2-3 y 4, demolición y reposición de placa estructural en concreto de los niveles 3 y 4, así mismo se realizó cambio parcial de cerramiento de la cancha múltiple, instalación de sistema hidroneumático, reposición total de baterías de baños, al igual que la impermeabilización de la placa de cubierta y el cambio de cubierta en el área de comedor.



CERRAMIENTO CANCHA ANTES



CERRAMIENTO CANCHA DESPUES



ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
HACER**



PLACA TERCER NIVEL ANTES



PLACA TERCER NIVEL DESPUES

CONTRATO DE OBRA 142 DE 2022 - : JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - LOTE 1.

Valor fiscal:	\$ 1.674.988.080,00
Valor Adicional:	\$ 835.550.000,00
Valor actualizado:	\$2.510.538.080,00
Plazo actualizado:	Nueve (09) meses
Fecha de Inicio:	01 de julio de 2022
Fecha de terminación:	30 de marzo 2023
Porcentaje avance:	61.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Muro Sector Las Mangueras

www.bucaramanga.gov.co



Puente Curva de la Mora



Quebrada La Jabonera

CONTRATO DE OBRA 143 DE 2022 - : UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE BUCARAMANGA “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 2.

Valor inicial:	\$ 2.426.472.557,51
Valor adicional:	\$ 1.150.000.000,00
Valor actualizado:	\$ 3.576.472.557,51
Plazo Actualizada:	Nueve (09) meses y nueve (09) días
Fecha de Inicio:	07 de julio de 2022
Fecha de terminación:	15 abril de 2023
Porcentaje avance:	67.00 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Muro Villa Helena



Puente La Vega

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 262 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL INICIAL	: \$ 287.514.038,00
ANTICIPO (30%)	: \$ 86.254.211,10
PLAZO INICIAL	: DOS MESES
FECHA DE INICIO	: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	: 50%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra Suspendido.

ARCHIVO FOTOGRAFICO



DEMOLICIONES



ESTUCO SOBRE FACHADA



PISOS EN CONCRETO Y MORTERO

RELACION DE PROCESOS ADJUDICADOS MEDIANTE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Año	Numero Contrato	Razón Social	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato
2022	387	CONSORCIO AMBIENTAL URBANO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"	\$ 9.072.944.903,00
2022	388	CONSORCIO VTAY BUCARAMANGA	ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONCORDIA Y SAN LUIS DEL BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 1.982.750.130,00
2022	396	CONSORCIO PLAN CENTRO	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1	\$ 10.995.207.368,00
2022	397	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 426.647.666,00
2022	405	CONSORCIO AM	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 1	\$ 7.542.347.806,00
2022	406	CONSORCIO OBRAS PA-PEI	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE	\$ 7.007.204.406,00



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

			BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2	
2022	408	CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022	ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1	\$ 7.031.227.735,05
2022	409	CONSORCIO DEPORTIVOS SM	ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 2	\$ 6.255.943.671,35
2022	410	CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS	ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3	\$ 6.417.057.029,27
2022	411	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1	\$ 7.121.453.216,00
2022	412	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2	\$ 3.173.961.189,00
2022	413	CONSORCIO ALUMBRADO V4	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3	\$ 2.165.900.979,00
2022	414	CIVILEX SAS	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4	\$ 3.374.175.743,00
2022	415	UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ALUMBRADO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 5	\$ 1.649.874.261,00
2022	416	CONSORCIO ALUMBRADO EH L6	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6	\$ 677.969.822,00
2022	417	7G7 S.A.S	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO 3	\$ 1.949.858.621,00
2022	418	CONSORCIO JASC 2022	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,	\$ 2.130.769.633,10



ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
BUCARAMANGA**

SANTANDER. GRUPO 1				
2022	419	CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria en los corregimientos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander. - GRUPO 2	\$ 1.860.497.004,00
2022	420	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER.	\$ 751.918.904,00
2022	421	CONSORCIO INTERURBANAS	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 589.431.258,00
2022	422	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2	\$ 615.191.795,00
2022	423	HCR INGENIEROS S.A.S.	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4	\$ 176.399.650,00
2022	424	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3.	\$ 656.793.100,25
2022	426	CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC	ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1	\$ 7.185.094.791,00
2022	427	SITELSA SAS	INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 959.044.800,00
2022	428	CONSORCIO SALONES BUCARAMANGA LC 1248	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONCORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 287.089.880,00
2022	429	JESAK SAS	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 627.457.250,00
2022	430	JESAK SAS	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 291.695.775,00

2022	433	CONSORCIO GRAVIRU 2022	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3	\$ 1.176.592.900,00
2022	444	COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1	\$ 354.987.874,00
2022	445	CONSORCIO PLAZAS JGV 2022	ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2	\$ 4.212.966.188,00
2022	446	CONSORCIO INTERSANTANDER	INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1	\$ 576.038.600,00
2022	447	CONSORCIO INTERVIAS RS	INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 3	\$ 502.306.136,00
2022	448	CONSORCIO UNIDO	CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 9.097.194.874,05
2022	449	CONSORCIO INTER-ANDINO	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 732.067.443,00
2022	452	CONSORCIO PROVENZA	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.785.020.081,00

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

La Secretaria de Infraestructura realiza el seguimiento y monitoreo a las metas programadas para la vigencia 2022, para el cuarto trimestre presentan el siguiente avance:

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura.	100%	100%	100%	\$ 4.729.996.282,00	\$ 3.482.469.066,00

PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de acueductos veredales repotenciados.	1	2	100%	\$ 238.059.985,00	\$ 223.274.410,00

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario.	100%	100%	100%	\$ 5.504.988.716,00	\$ 5.331.012.683,00

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.	40.000	145.530,24	100%	\$ 135.840.838.763,00	\$ 108.973.958.011,00

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura.	0	2	100%	\$ 11.601.799.900,00	\$ 11.601.799.900,00

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados.	5.000	54.770	100%	\$ 52.163.919.792,00	\$ 47.138.309.818,00

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de metros lineales de placa huella construidos en la zona rural.	150	3.007	100%	\$ 9.955.135.368,00	\$ 8.570.814.807,00

PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.	1	1	100%	\$ 42.008.440.117,00	\$ 26.164.961.892,00

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.	100%	95%	100%	\$ 26.606.352.908,00	\$ 24.065.456.578,00

**LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN:
INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES**

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.	100%	100%	100%	\$ 19.284.070.224,00	\$ 14.811.561.823,00

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos terminados y en ejecución)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
	ACTIVOS FIJOS													
	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS													
	OTRAS ESTRUCTURAS													
	MONUMENTOS PUBLICOS													
	TEATROS ADECUADOS													
RUBRO	TEATROS ADECUADOS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.2.01.01.001 .03.01.3301038 53129.501	TEATROS ADECUADOS 501	-	-	149.965.235,00	149.965.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO													
	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS													
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO													
RUBRO	VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO MAQUINAS APISONADORAS Y APLANADORAS DE CAMINOS (COMPACTADORAS), AUTOPROPULSADAS													
2.3.2.01.01.003 .02.08.2402112 44424.273	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 273	-	3.000.000.000,00	-	770.285.000,00	2.229.715.000,00	2.229.714.999,37	2.229.714.999,37	2.229.714.999,37	2.229.714.999,37	-	0,63	-	99,99
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
	PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS													
RUBRO	PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS EDIFICACIONES COMERCIALES													
2.3.2.02.02.005 .1709078.5312 2.201	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	-	-	41.800.000,00	-	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800.000,00	-	41.800.000,00	-	-	100,00
2.3.2.02.02.005 .1709078.5312 2.573	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	-	11.559.999.899,67	-	-	11.559.999.899,67	11.559.999.899,67	11.559.999.899,67	-	-	-	-	11.559.999.899,67	100,00
	EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BSICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA													
RUBRO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA ESPACIO PUBLICO ADECUADO													
2.3.2.02.02.005 .2201052.5312 9.201	EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BSICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 201	-	-	3.887.817.640,38	-	3.887.817.640,38	3.887.817.640,38	3.887.817.640,38	2.166.091.952,17	-	2.166.091.952,17	-	1.721.725.688,21	100,00
2.3.2.02.02.005 .2201052.5312 9.501	EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 501	-	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA													
RUBRO	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES													
2.3.2.02.02.005 .2402042.5321 1.289	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 289	-	-	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00	-	-	-	239.000.000,00	1.561.000.000,00	86,72
2.3.2.02.02.005 .2402042.5321 1.573	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 573	-	5.100.000.000,00	-	-	5.100.000.000,00	3.961.847.411,00	3.961.847.411,00	-	-	-	1.138.152.589,00	3.961.847.411,00	77,68

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
2.3.2.02.02.005.4103027.5427.0.201	INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CENTROS COMUNITARIOS ADECUADOS 201	-	-	363.841.868,50	-	363.841.868,50	363.841.868,00	363.841.868,00	139.092.390,00	-	139.092.390,00	0,50	224.749.478,00	99,99
	CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS													
	RUBRO OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.2.02.02.005.4104001.5312.9.501	CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 501	-	2.989.447.501,00	-	-	2.989.447.501,00	2.989.447.501,00	2.989.447.501,00	-	-	-	-	2.989.447.501,00	100,00
	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
	RUBRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.2.02.02.005.4301004.5327.0.501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	-	13.853.202.280,00	-	-	13.853.202.280,00	13.564.564.721,00	13.564.564.721,00	-	-	-	288.637.559,00	13.564.564.721,00	97,91
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.2.02.02.005.4301004.5427.0.201	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	13.993.681.541,80	-	-	13.993.681.541,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005.4301004.5427.0.213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 213	-	-	183.529.000,83	-	183.529.000,83	183.529.000,83	183.529.000,83	-	-	-	-	183.529.000,83	100,00
2.3.2.02.02.005.4301004.5427.0.267	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 267	121.402.771,00	-	-	121.402.771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005.4301004.5427.0.273	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	-	20.142.555.459,17	1.810.001.940,00	-	21.952.557.399,17	21.952.527.399,17	21.952.527.399,17	17.696.153.399,67	-	17.696.153.399,67	30.000,00	4.256.373.999,50	99,99
2.3.2.02.02.005.4301004.5427.0.501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	-	-	228.977.420,00	-	228.977.420,00	228.977.420,00	228.977.420,00	223.596.478,00	-	223.596.478,00	-	5.380.942,00	100,00
	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS													
	RUBRO PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.2.02.02.005.4301011.5427.0.201	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	3.075.758.113,00	-	-	874.518.572,77	2.201.239.540,23	2.201.222.800,13	2.201.222.800,13	1.531.890.915,63	-	1.531.890.915,63	16.740,10	669.331.884,50	99,99
2.3.2.02.02.005.4301011.5427.0.213	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 213	8.118.317.887,00	-	215.766.208,17	-	8.334.084.095,17	8.334.084.095,17	8.334.084.095,17	3.191.220.305,00	-	3.191.220.305,00	-	5.142.863.790,17	100,00

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
2.3.2.02.02.008.4002026.8399.0.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	-	-	92.000.000,00	-	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	-	92.000.000,00	-	-	100,00
RUBRO	ZONAS VERDES MANTENIDAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE													
2.3.2.02.02.008.4002026.8597.0.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	3.500.000.000,00	-	318.354.512,60	331.486.029,48	3.486.868.483,12	3.485.370.827,07	3.485.370.827,07	3.078.803.916,56	-	3.078.803.916,56	1.497.656,05	406.566.910,51	99,95
2.3.2.02.02.008.4002026.8597.0.501	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 501	-	1.592.330.583,00	144.231.958,00	49.928.338,00	1.686.634.203,00	1.518.545.189,70	1.518.545.189,70	1.193.045.487,00	-	1.193.045.487,00	168.089.013,30	325.499.702,70	90,03
RUBRO	ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.													
2.3.2.02.02.008.4002026.8599.9.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	-	-	239.486.029,48	-	239.486.029,48	235.096.666,66	235.096.666,66	234.416.666,67	-	234.416.666,67	4.389.362,82	679.999,99	98,16
RUBRO	ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARRILLADO													
2.3.2.02.02.008.4003042.8332.7.201	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION 201	-	-	620.339.602,78	-	620.339.602,78	619.927.505,78	619.927.505,78	-	-	-	412.097,00	619.927.505,78	99,93
2.3.2.02.02.008.4003042.8332.7.501	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION 501	-	331.796.814,80	-	-	331.796.814,80	331.796.814,80	331.796.814,80	-	-	-	-	331.796.814,80	100,00
RUBRO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA, EXCEPTO GASODUCTOS													
2.3.2.02.02.008.4003048.5323.1.501	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 501	-	-	39.723.720,00	-	39.723.720,00	39.723.720,00	39.723.720,00	-	-	-	-	39.723.720,00	100,00
RUBRO	PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS PARQUE RECREATIVOS ACEDUADOS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.													
2.3.2.02.02.008.4301011.8399.0.201	PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201	-	-	48.600.000,00	-	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	-	48.600.000,00	-	-	100,00
2.3.2.02.02.008.4301011.8399.0.501	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	-	36.450.000,00	-	-	36.450.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	5.705.000,00	25.495.000,00	5.250.000,00	-	85,59
RUBRO	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS OTROS SERVICIOS DE APOYO NCP													
2.3.2.02.02.008.4301011.8599.9.201	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	-	-	79.200.000,00	-	79.200.000,00	77.140.000,00	77.140.000,00	77.140.000,00	-	77.140.000,00	2.060.000,00	-	97,39
2.3.2.02.02.008.4301011.8599.9.501	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	-	56.365.000,00	-	-	56.365.000,00	44.226.666,00	44.226.666,00	44.226.666,00	7.091.666,00	37.135.000,00	12.138.334,00	-	78,46
RUBRO	ESTUDIOS DE PREINVERSION ESTUDIOS DE PREINVERSION SERVICIOS DE PLANEACION URBANA													
2.3.2.02.02.008.4599006.8322.1.501	ESTUDIOS DE PREINVERSION SERVICIOS DE PLANEACION URBANA 501	-	-	141.317.564,18	-	141.317.564,18	-	-	-	-	-	141.317.564,18	-	-

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS													
RUBRO	SEDES MANTENIDAS GUANTES DE PROTECCION													
2.3.2.02.01.002.4599016.2824.202.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-
RUBRO	SEDES MANTENIDAS CASCOS DE SEGURIDAD													
2.3.2.02.01.002.4599016.2826.9.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)													
RUBRO	SEDES MANTENIDAS PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA													
2.3.2.02.01.003.4599016.3212.801.226	SEDES MANTENIDAS 226	4.600.000,00	-	-	738.830,80	3.861.169,20	3.427.123,84	3.427.123,84	3.427.123,84	3.427.123,84	-	434.045,36	-	88,75
RUBRO	SEDES MANTENIDAS PAPELES IMPREGNADOS Y REVESTIDOS INCLUSO AUTOADHESIVOS													
2.3.2.02.01.003.4599016.3214.813.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	365.996,40	-	365.996,40	166.240,03	166.240,03	166.240,03	166.240,03	-	199.756,37	-	45,42
RUBRO	SEDES MANTENIDAS TAPAS DE CARTON													
2.3.2.02.01.003.4599016.3219.921.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	952.000,00	-	952.000,00	852.087,60	852.087,60	852.087,60	852.087,60	-	99.912,40	-	89,50
RUBRO	SEDES MANTENIDAS DIESEL OIL ACPM (FUEL GAS GASOIL MARINE GAS)													
2.3.2.02.01.003.4599016.3336.103.226	SEDES MANTENIDAS 226	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-
RUBRO	SEDES MANTENIDAS VASELINA													
2.3.2.02.01.003.4599016.3350.004.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	10.710,00	-	10.710,00	3.246,92	3.246,92	3.246,92	3.246,92	-	7.463,08	-	30,31
RUBRO	SEDES MANTENIDAS TINTAS PARA SELLOS													
2.3.2.02.01.003.4599016.3514.007.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	17.017,00	-	17.017,00	8.698,90	8.698,90	8.698,90	8.698,90	-	8.318,10	-	51,11
RUBRO	SEDES MANTENIDAS PEGANTES SINTETICOS													
2.3.2.02.01.003.4599016.3542.006.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	111.919,50	-	111.919,50	61.903,80	61.903,80	61.903,80	61.903,80	-	50.015,70	-	55,31
RUBRO	SEDES MANTENIDAS BORRADORES DE CAUCHO													
2.3.2.02.01.003.4599016.3627.018.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	13.155,45	-	13.155,45	11.177,08	11.177,08	11.177,08	11.177,08	-	1.978,37	-	84,96
RUBRO	SEDES MANTENIDAS CINTAS PEGANTES TRANSPARENTES													
2.3.2.02.01.003.4599016.3692.007.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	118.666,80	-	118.666,80	116.828,25	116.828,25	116.828,25	116.828,25	-	1.838,55	-	98,45
RUBRO	SEDES MANTENIDAS RECIPIENTES DE MATERIAL PLASTICO CANECAS PARA LA BASURA													
2.3.2.02.01.003.4599016.3694.012.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00	-	559.300,00	940.700,00	-	37,28

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
2.3.2.02.02.008.4599031.8399.0.226	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	1.084.000.000,00	-	100.000.000,00	-	1.184.000.000,00	1.157.079.999,29	1.157.079.999,29	1.156.746.665,96	11.200.000,00	1.145.546.665,96	26.920.000,71	333.333,33	97,72
2.3.2.02.02.008.4599031.8399.0.253	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	-	-	69.926.388,00	-	69.926.388,00	66.883.332,66	66.883.332,66	66.883.332,66	-	66.883.332,66	3.043.055,34	-	96,98
2.3.2.02.02.008.4599031.8399.0.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526	-	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-	-
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.													
2.3.2.02.02.008.4599031.8599.9.226	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	211.500.000,00	-	-	-	211.500.000,00	208.296.666,32	208.296.666,32	208.296.666,32	-	208.296.666,32	3.203.333,68	-	98,48
2.3.2.02.02.008.4599031.8599.9.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-
RUBRO	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES													
RUBRO	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS													
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.2.02.02.009.2102010.9112.3.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS 226	-	-	42.639.723,00	-	42.639.723,00	40.201.056,00	40.201.056,00	40.201.056,00	38.655.335,25	1.545.720,75	2.438.667,00	-	94,28
RUBRO	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO													
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.2.02.02.009.2102011.9112.3.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	-	-	10.657.083.918,33	-	10.657.083.918,33	878.083.918,33	878.083.918,33	499.167.934,26	-	499.167.934,26	9.779.000.000,00	378.915.984,07	8,23
2.3.2.02.02.009.2102011.9112.3.526	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	-	2.023.428.955,12	2.000.000.000,00	-	4.023.428.955,12	-	-	-	-	-	4.023.428.955,12	-	-
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUIDAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUIDAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.2.02.02.009.2102012.9112.3.526	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	-	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUBRO	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS													
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.2.02.02.009.2102013.9112.3.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	11.033.330.000,00	-	-	42.639.723,00	10.990.690.277,00	10.752.281.031,78	10.752.281.031,78	4.323.330.220,22	170.454.261,78	4.152.875.958,44	238.409.245,22	6.428.950.811,56	97,83

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
2.3.2.02.02.009 2102013.9112 3.526	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	-	16.109.212.654,34	38.874.227,42	1.303.360.122,40	14.844.726.759,36	14.494.395.885,75	14.494.395.885,75	527.234.874,42	191.939.530,07	335.295.344,35	350.330.873,61	13.967.161.011,33	97,64
RUBRO	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO INFORMACION IMPLEMENTADO SERVICIO INFORMACION IMPLEMENTADO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.2.02.02.009 4501007.9112 3.226	SERVICIO INFORMACION IMPLEMENTADO 226	11.964.496.636,00	-	-	9.779.000.000,00	2.185.496.636,00	-	-	-	-	-	2.185.496.636,00	-	-
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO													
RUBRO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES													
2.3.2.02.02.005 2402127.5421 1.232	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 232	280.854.381,00	-	-	-	280.854.381,00	-	-	-	-	-	280.854.381,00	-	-
2.3.2.02.02.005 2402127.5421 1.282	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 282	1.083.712.056,00	-	-	-	1.083.712.056,00	-	-	-	-	-	1.083.712.056,00	-	-
2.3.2.02.02.005 2402127.5421 1.582	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 582	-	1.960.833.127,33	-	-	1.960.833.127,33	896.552.001,00	896.552.001,00	-	-	-	1.064.281.126,33	896.552.001,00	45,72
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO ESPACIO PUBLICO ADECUADO EDIFICIOS COMERCIALES													
2.3.2.02.02.005 4002020.5312 2.533	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 533	-	3.368.183.568,00	-	-	3.368.183.568,00	-	-	-	-	-	3.368.183.568,00	-	-
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES													
RUBRO	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS													
2.3.2.02.02.009 4003047.9112 3.200	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 200	270.698.077,00	-	-	-	270.698.077,00	-	-	-	-	-	270.698.077,00	-	-
2.3.2.02.02.009 4003047.9112 3.201	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	4.137.320.506,00	-	-	-	4.137.320.506,00	1.719.291.207,00	1.719.291.207,00	1.719.291.207,00	166.921.119,00	1.552.370.088,00	2.418.029.299,00	-	41,55

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
2.3.2.02.02.009 .4003047.9112 3.215	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	6.392.312.960,00	307.560.498,00	-	-	6.699.873.458,00	6.389.726.134,00	6.389.726.134,00	6.389.726.134,00	-	6.389.726.134,00	310.147.324,00	-	95,37
2.3.2.02.02.009 .4003047.9112 3.260	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 260	852.861,00	-	-	-	852.861,00	-	-	-	-	-	852.861,00	-	-
2.3.2.02.02.009 .4003047.9112 3.268	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 268	24.911.725,00	-	-	-	24.911.725,00	-	-	-	-	-	24.911.725,00	-	-
2.3.2.02.02.009 .4003047.9112 3.515	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 515	-	308.121.846,36	-	-	308.121.846,36	-	-	-	-	-	308.121.846,36	-	-
2.3.2.02.02.009 .4003047.9112 3.528	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 528	-	39.150.083,96	-	-	39.150.083,96	-	-	-	-	-	39.150.083,96	-	-
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PASIVOS EXICIBLES													
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	FINANCIACION DE DEFICIT PASIVOS													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO													
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.7.06.02.459 9002.53129.61 6	SEDES MANTENIDAS 616	-	266.733.201,66	-	-	266.733.201,66	-	-	-	-	-	266.733.201,66	-	-
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES													
2.3.7.06.02.459 9002.53211.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	-	1.842.838.994,32	-	-	1.842.838.994,32	33.288.163,86	33.288.163,86	33.288.163,86	-	33.288.163,86	1.809.550.830,46	-	1,80
2.3.7.06.02.459 9002.53211.63 0	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 630	-	116.816.300,00	-	-	116.816.300,00	116.816.300,00	116.816.300,00	116.816.300,00	-	116.816.300,00	-	-	100,00
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.7.06.02.459 9002.54129.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	-	736.279.272,46	-	-	736.279.272,46	-	-	-	-	-	736.279.272,46	-	-
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.7.06.02.459 9002.54211.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	-	20.599.615,77	-	-	20.599.615,77	20.599.615,77	20.599.615,77	-	-	-	-	20.599.615,77	100,00
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.7.06.02.459 9002.54270.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	-	1.743.233.510,45	-	-	1.743.233.510,45	299.182.225,24	299.182.225,24	299.182.225,24	-	299.182.225,24	1.444.051.285,21	-	17,16
2.3.7.06.02.459 9002.54270.61 3	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613	-	443.032.993,25	-	-	443.032.993,25	443.032.993,25	443.032.993,25	443.032.993,25	-	443.032.993,25	-	-	100,00

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT - 890201222
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO - DEUDA - INVERSION (VIGENCIA ACTUAL)
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	Disponibilidades Acumuladas 5,00	Compromisos Acumulados 7,00	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial 1,00	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Cuentas Por Pagar	Pagos Acumulados 9,00			
2.3.7.06.02.459 9002.54270.69 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 691	-	419.752.247,92	-	-	419.752.247,92	419.752.247,92	419.752.247,92	419.752.247,92	-	419.752.247,92	-	-	100,00
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA													
2.3.7.06.02.459 9002.83211.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	-	370.830.776,00	-	-	370.830.776,00	-	-	-	-	-	370.830.776,00	-	-
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA													
2.3.7.06.02.459 9002.84222.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	-	346.307.169,00	-	-	346.307.169,00	-	-	-	-	-	346.307.169,00	-	-
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.7.06.02.459 9002.91123.62 6	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	-	1.449.870.483,85	-	-	1.449.870.483,85	24.887.999,83	24.887.999,83	24.887.999,83	-	24.887.999,83	1.424.982.484,02	-	1,71
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		122.793.759.821,00	193.556.751.669,37	103.808.792.457,91	83.388.647.558,06	336.770.656.390,22	277.493.785.257,97	277.493.785.257,97	139.979.800.460,96	7.473.895.761,87	132.505.904.699,09	59.276.871.132,25	137.513.984.797,01	82,40

RELACION COMPROMISOS (01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
9440	07/10/2022 09:32	253	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	5956	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4002020.88 756.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9496	10/10/2022 07:35	3531	JORGE EDUARDO GUTIERREZ ROJAS	6687	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
9500	10/10/2022 09:13	272	CONSORCIO BUCARAMANGA	6740	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.887.999,83	2.3.7.06.02.4599002.91123. 626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 272 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
9511	10/10/2022 12:10	3535	EDGARDO ARDILA GRANDAS	6688	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 9.600.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.
9530	11/10/2022 11:18	250	UNIÓN TEMPORAL ROSA BLANCA	4027	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 173.346.072,00	2.3.2.02.02.005.4003017.53 231.289 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS 289	OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS LA MALAÑAY VEREDAL ROSA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9567	12/10/2022 11:45	3552	DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA	6723	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82 120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE.
9619	14/10/2022 10:21	259	DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION S.A.S.	6148	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.810.552,39	2.3.2.02.01.003.4599016.32 12801.226 - SEDES MANTENIDAS 226	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9629	18/10/2022 07:45		COMCEL S A	6836	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 289.830,05	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE 2022 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5618438045 DE CLARO REFERENCIA 8221401343
9734	20/10/2022 13:49		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	6889	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 276.050.074,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05644 \$ 276.050.074,00, VALOR TOTAL \$ 276.050.074,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
9735	20/10/2022 13:49		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	6890	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 208.644.641,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 232 \$ 208.644.641,00 VALOR TOTAL \$ 208.644.641,00 - EMAB
9736	20/10/2022 13:51		LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	6891	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 26.603.441,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-1687 \$ 13.253.648,00, MES JUNIO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. LUSA -1688 \$ 13.349.793,00 - VALOR TOTAL \$26.603.441,00 -LIMPIEZA URBANA
9891	21/10/2022 14:16	25	TITAN INGENIERIA INTELIGENTE SAS	6812	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 501.800.376,00	2.3.2.02.02.005.4301004.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 25 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2
9904	24/10/2022 10:37	270	BALANTA Y MEDINA INGENIEROS SAS	4278	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 83.837.903,00	2.3.2.02.02.008.4003042.83 327.201 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION 201	ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS PARA DAR SOLUCIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL SECTOR DEL ASENTAMIENTO BUENA VISTA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
9938	25/10/2022 07:57	269	UT GYC TONER	4919	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 32.871.650,00	2.3.2.02.01.003.4599016.36 99060.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DIGITALES, TONERES, Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL CAM

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
10017	26/10/2022 15:51	24	CONSORCIO EQUIPO URBANO PL	6811	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 960.840.527,00	2.3.2.02.02.005.4301004.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 24 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1
10118	28/10/2022 14:15		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	6997	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.323.650,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 Y AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 , SEGUN FACTURA TBCL- 22146861 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
10119	28/10/2022 14:16		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	6998	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.135.747.753,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 199065833 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
10120	28/10/2022 14:17		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	6999	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.771.054,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 199831710 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
10121	28/10/2022 14:17		COMCEL S A	6996	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.057.235,21	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - SEDES MANTENIDAS 253	"PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE OCTUBRE DE 2022 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5623683100 - REFERENCIA 8221383845 "
10167	02/11/2022 11:47	294	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.	3652	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 589.680.942,90	2.3.2.02.02.008.4599016.85 970.226 - SEDES MANTENIDAS 226	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
10169	02/11/2022 14:18	294	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S.	3927	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 163.223.112,70	2.3.2.02.02.008.4002026.85 970.501 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 501	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10179	03/11/2022 11:23	297	CONSORCIO LA ESPERANZA R	5459	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 763.631.187,00	2.3.2.02.02.005.2402120.53 221.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO 201	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10190	03/11/2022 15:59	300	CONSORCIO LAPP	3653	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 126.713.631,36	2.3.2.02.02.008.4599016.85 970.226 - SEDES MANTENIDAS 226	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".
10207	04/11/2022 14:22	259	DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION S.A.S.	6148	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 797.891,43	2.3.2.02.01.003.4599016.32 12801.226 - SEDES MANTENIDAS 226	ADICION 1 EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO 259 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".
10215	04/11/2022 16:58	26	CONSORCIO UNIOBRAS 2022	7065	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 943.239.434,00	2.3.2.02.02.005.4301004.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 26 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
10216	04/11/2022 16:59	27	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	7066	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 539.318.859,00	2.3.2.02.02.005.4301004.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 27 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 4
10217	04/11/2022 16:59	48	CONSORCIO CIUDAD BONITA	7064	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 284.900.510,00	2.3.2.02.02.005.4301004.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 48 DEL 09 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2
10232	08/11/2022 11:55		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	7068	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 216.283.457,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. ES235 \$ 216.283.457,00 VALOR TOTAL \$ 216.283.457,00 - EMAB
10233	08/11/2022 11:56		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	7069	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 140.657.452,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES JUNIO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 016038 \$ 140.657.452,00 VALOR TOTAL \$ 140.657.452,00 - EMPAS
10282	08/11/2022 21:24	146	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BUCARAMANGA	7107	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.100.131.989,00	2.3.2.02.02.005.2409013.53 211.201 - TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA OBRA PUBLICA NO. 146 DEL 30 DE JUNIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
10283	08/11/2022 21:25	182	CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	7108	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 75.774.906,40	2.3.2.02.02.005.2409013.53 211.201 - TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 182 DEL 19 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA DE MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
10313	10/11/2022 10:31	41	JESAK SAS	7063	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 42.513.137,00	2.3.2.02.02.005.4301004.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 41 DEL 03 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1
10326	10/11/2022 14:38		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	7120	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 269.175.481,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05657 \$ 269,175.481,00 VALOR TOTAL \$ 269,175.481,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
10332	10/11/2022 18:28	11	HCR INGENIEROS S.A.S.	7082	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 38.874.227,42	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	ADICION N° 2 EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO 011 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
10353	11/11/2022 16:03	183	CONSORCIO JYG PUENTES BUCARAMANGA 009	7118	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.690.288,75	2.3.2.02.02.008.2402118.83 323.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 183 DEL 22 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE NARIÑO SOBRE EL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10354	11/11/2022 16:26	313	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	7023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 592.208.617,00	2.3.2.02.02.008.4002026.85 970.501 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 501	MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
10402	16/11/2022 11:51	306	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	6393	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 349.983.942,00	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, EQUIPOS DE GIMNASIA, JUEGOS INFANTILES Y CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10646	24/11/2022 11:29	136	PAVIACOM S.A.S.	7159	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 323.348.804,66	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.213 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 213	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 136 DEL 24 DE JUNIO DE 2022, CUYO OBJETO: "RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" - GRUPO 1
10647	24/11/2022 11:37		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	7318	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.663.477,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.253 - SEDES MANTENIDAS253	CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 200952624 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
10648	24/11/2022 11:38		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	7319	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.205.403.218,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 200176752 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
10649	24/11/2022 11:38		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	7320	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.085.266,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - SEDES MANTENIDAS 253	"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 , SEGUN FACTURA TBCL- 22236176 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 "
10821	28/11/2022 10:29	345	GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS	6271	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 17.822.000,00	2.3.2.02.01.004.4599016.43 91201.526 - SEDES MANTENIDAS 526	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CUARTOS TECNICOS DEL VIADUCTO PROVINCIAL LA NOVENA.
11003	30/11/2022 09:23		CONSORCIO INTER BUCAROS 2014	7471	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 150.104.463,86	2.3.7.06.02.4599002.53211.630 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 630	PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 279 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
11008	30/11/2022 11:06	3706	WEYMAR STICK OBANDO VARGAS	7269	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.096.666,66	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
11058	01/12/2022 16:35		COMCEL S A	7491	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.193.857,54	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - SEDES MANTENIDAS 253	"PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5633594233 - REFERENCIA 8221383845
11205	06/12/2022 14:38	1850	LUIS RAUL CARRILLO RIVEROS	7488	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.216.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83 213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1850 DEL 14 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA ARTICULAR LOS EQUIPOS DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
11223	06/12/2022 21:04	134	CONSORCIO DS6	7649	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 34.319.514,00	2.3.2.02.02.005.4301012.53 270.201 - PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 134 DEL 07 DE JULIO DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
11350	07/12/2022 15:58	363	CONSORCIO BUCARAMANGA 2022	4032	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599016.87 14199.226 - SEDES MANTENIDAS 226	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA, Y VOLQUETAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11355	07/12/2022 16:24	29	TITAN INGENIERIA INTELIGENTE SAS	7157	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 158.054.823,33	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICION EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 29 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
11356	07/12/2022 16:52		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	7657	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 275.461.209,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.201 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05681 \$ 275.461.209,00 VALOR TOTAL \$ 275.461.209,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
11357	07/12/2022 16:52		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	7660	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 213.180.163,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. ES238 \$ 213.180.163,00 VALOR TOTAL \$ 213.180.163,00 - EMAB
11358	07/12/2022 16:53		METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	7659	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 32.105.152,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-928 \$ 32.105.152,00 VALOR TOTAL \$ 32.105.152,00 - METROLIMPIA
11359	07/12/2022 16:54		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	7658	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 128.449.207,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES JULIO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 016712 \$ 128.449.207,00 VALOR TOTAL \$ 128.449.207,00 - EMPAS
11390	12/12/2022 19:43	252	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	7692	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 826.829.772,00	2.3.2.02.01.004.4599016.46 93999.526 - SEDES MANTENIDAS 526	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 252 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11536	16/12/2022 11:23	2339	JULIO CESAR MORENO	7778	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 283.333,33	2.3.2.02.02.008.4002026.85 999.201 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2339 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
11537	16/12/2022 11:24	2302	DIEGO ARMANDO CRUZ ANQUIZ	7780	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 380.000,00	2.3.2.02.02.008.4002026.85 999.201 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2302 DEL 03 DE AGOSTO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
11538	16/12/2022 11:25	2304	GILBERTO NEIRA	7781	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 340.000,00	2.3.2.02.02.008.4002026.85 999.201 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2304 DEL 03 DE AGOSTO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
11539	16/12/2022 11:26	2337	ERIKA MILENA PINTO QUIROGA	7779	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 333.333,33	2.3.2.02.02.008.4002026.85 999.201 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2337 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
11548	16/12/2022 12:00	2259	WILLIAM CALDERON GARCIA	7792	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 2259 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO. AP-36-2
11549	16/12/2022 12:14		LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	7873	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 38.048.668,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.201 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE JULIO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-1760 \$ 18.920.586,00, MES AGOSTO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. LUSA -1761 \$ 19.128.082,00 - VALOR TOTAL \$ 38.048.668,00 - LIMPIEZA URBANA
11605	16/12/2022 14:36	387	CONSORCIO AMBIENTAL URBANO	6726	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.641.992.767,00	2.3.2.02.02.005.4002020.53 211.573 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 573	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
11640	16/12/2022 20:56	40	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S A S	7158	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 41.142.584,00	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.273 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS RECURSOS DEL CREDITO 273	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL COTRATO DE INTERVENTORIA NO. 40 DEL 03 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3
11707	19/12/2022 10:04	2190	EDGAR GOMEZ CASTAÑEDA	7724	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 586.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2190 DEL 29 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11708	19/12/2022 10:05	3483	JHON HAIVER ESTEBAN AYALA	7725	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 366.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3483 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11709	19/12/2022 10:07	2153	JESUS ANTONIO CARRION RUBIANO	7720	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 293.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2153 DEL 28 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
11710	19/12/2022 10:07	2154	DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO	7721	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 293.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2154 DEL 28 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11711	19/12/2022 10:09	2186	ISAIAS SUAREZ DELGADO	7722	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 660.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2186 DEL 29 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11712	19/12/2022 10:12	2137	TEODOMIRO ENRIQUE VERA DAVILA	7719	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 366.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2137 DEL 27 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11810	19/12/2022 18:22	149	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL	7685	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.955.330,33	2.3.2.02.02.007.4599016.72 212.253 - SEDES MANTENIDAS 253	ADICION EN VALOR Y PLAZO N° 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES N° 149-2022 DE 01 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 12 NO 33-51 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12032	20/12/2022 19:04	241	UNION TEMPORAL PARQUE SURATA	7906	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 521.541.001,41	2.3.7.06.02.4599002.54270. 601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO NO. 241 DE 2019, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12033	20/12/2022 19:05		CONSORCIO RIO SURATA	7907	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 53.218.315,12	2.3.7.06.02.4599002.54270. 601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	PASIVO EXIGIBLE, CONTRATO NO. 242 DE 2019, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12034	20/12/2022 19:06		CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020	7908	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 736.769,01	2.3.7.06.02.4599002.54270.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	PASIVO EXIGIBLE, CONTRATO NO. 302 DE 2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12035	20/12/2022 19:13	2333	JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA	7827	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 900.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 2333 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD. AP-31-2
12036	20/12/2022 19:17	1950	LUIS ANTONIO MOJICA FIGUEROA	7826	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.083.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 1950 DEL 19 DE JULIO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO, COMO APOYO TECNICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO QUE SE LE ASIGNEN. AP-07-2
12038	20/12/2022 19:21	3214	EDGARDO RODRIGUEZ HERRERA	7897	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 3214 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA A CARGO EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN QUE SE REQUIERA ENTREGAR A LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL. AP-33-2
12040	20/12/2022 19:31	2044	HUGO GIOVANNI NAVARRO MOYA	7788	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 666.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 2044 DEL 25 DE JULIO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO. AP-29-2
12064	21/12/2022 13:14	1954	YENCY JULIANA ARDILA DIAZ	7803	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 466.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 1954 DEL 19 DE JULIO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ORGANIZAR Y ARCHIVAR DE ACUERDO A LA NORMA TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES; Y POSTCONTRACTUALES QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO. AP-16-2

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12065	21/12/2022 13:15	1955	JONNATHAN MENDOZA CRISTIAN	7804	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 583.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 1955 DEL 19 DE JULIO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA RECEPCION, CLASIFICACION Y EMBALAJE DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE INGRESAN A LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-11-2
12079	21/12/2022 16:16	1957	LUZ ANGELA CABALLERO CORZO	7805	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 700.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.85 999.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 1957 DEL 19 DE JULIO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL REGISTRO ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES QUE COMPRENDE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ATENCIÓN GENERAL AL CONTRIBUYENTE RESPONSABLE. AP-18-2
12080	21/12/2022 16:39	2149	JUAN MANUEL HERRERA DIAZ	7812	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 600.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82 120.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 2149 DEL 28 DE JULIO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, QUE ESTA ADELANTE. AP-26-2
12081	21/12/2022 16:40	3175	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ	7797	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 900.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 3175 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL. AP-41-2
12083	21/12/2022 17:49	3375	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	7911	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 916.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.83 321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3375 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12084	21/12/2022 17:50	2196	DANNA ALEJANDRA ALTUVE VILLAMIZAR	7912	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 300.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 2196 DEL 29 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO (A) EN DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ASI COMO EN EL REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO, DE LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12248	22/12/2022 15:02	2334	GERMAN AUGUSTO MONTERO PARRA	7794	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.83 990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 A LA CPS NO. 2334 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL. AP-42-2
12250	22/12/2022 15:06	1812	LEIDY VANESSA PRADILLA LEAL	7898	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 216.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.82 120.501 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCIN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1812 DEL 12 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, ARTICULAR ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, QUE ESTA ADELANTE
12263	22/12/2022 18:13	397	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	6575	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.979.731,16	2.3.2.02.02.005.4002020.53 211.501 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".
12329	23/12/2022 12:27	250	UNIÓN TEMPORAL ROSA BLANCA	7939	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 49.928.338,00	2.3.2.02.02.005.4003017.53 231.501 - ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS 501	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 250 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS LA MALAÑA Y VEREDA ROSA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12348	23/12/2022 14:54	332	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	7938	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.723.720,00	2.3.2.02.02.008.4003048.53 231.501 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 501	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 332 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12404	26/12/2022 10:39	388	CONSORCIO VTAY BUCARAMANGA	6605	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 936.280.096,70	2.3.2.02.02.005.4502003.54 129.273 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS SALON COMUNAL ADECUADO 273	ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONDORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12405	26/12/2022 10:40	405	CONSORCIO AM	6663	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.611.929.928,01	2.3.2.02.02.005.2402114.53 211.573 - VIA URBANA MEJORADA 573	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1
12406	26/12/2022 10:42	406	CONSORCIO OBRAS PA-PEI	6663	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.611.929.929,01	2.3.2.02.02.005.2402114.53 211.573 - VIA URBANA MEJORADA 573	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2
12514	26/12/2022 15:10	408	CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022	6576	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.660.510.448,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53 270.501 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. LOTE 1
12515	26/12/2022 15:11	409	CONSORCIO DEPORTIVOS SM	6576	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.660.510.448,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53 270.501 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. LOTE 2
12516	26/12/2022 15:11	410	CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS	6576	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.660.510.448,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53 270.501 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. LOTE 3
12528	27/12/2022 14:44	396	CONSORCIO PLAN CENTRO	6692	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.676.462.509,51	2.3.2.02.02.005.4002020.53 270.501 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA) ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12531	27/12/2022 18:07	416	CONSORCIO ALUMBRADO EH L6	6597	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 677.969.822,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12532	27/12/2022 18:09	417	7G7 S.A.S	6583	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.949.858.621,00	2.3.2.02.02.005.2402127.54 211.582 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 582	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO NO. 3
12533	27/12/2022 18:11	411	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	6597	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.410.566.595,43	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1
12534	27/12/2022 18:12	412	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	6597	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.173.961.189,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2.
12535	27/12/2022 18:12	413	CONSORCIO ALUMBRADO V4	6597	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.165.900.979,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3.
12536	27/12/2022 18:12	414	CIVILEX SAS	6597	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.537.531.905,09	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4.
12537	27/12/2022 18:13	415	UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ALUMBRADO	6597	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.649.874.261,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 5.
12549	27/12/2022 19:34		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	7971	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 130.548.638,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.201 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES AGOSTO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 017504 \$ 130.548.638,00 VALOR TOTAL \$ 130.548.638 - EMPAS
12550	27/12/2022 19:35		METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	7972	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.372.481,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.201 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-959 \$16.588.730,00 Y MES DE SEPTIEMRBE DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-961 \$ 19.783.751,00 VALOR TOTAL \$ 36.372.481,00 - METROLIMPIA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12553	27/12/2022 19:43	411	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	6596	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.005.758.259,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53 270.501 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1
12555	28/12/2022 08:34	418	CONSORCIO JASC 2022	6765	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.130.769.633,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53 211.573 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 573	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1.
12558	28/12/2022 11:07	419	CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023	6765	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.860.497.004,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53 211.573 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 573	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2.
12562	28/12/2022 11:53	420	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S	6727	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 206.519.880,00	2.3.2.02.02.005.4002020.53 211.573 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 573	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
12563	28/12/2022 13:09		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	7975	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.459.733,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN FACTURA 201916450 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
12564	28/12/2022 13:09		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	7976	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.887.605,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - SEDES MANTENIDAS 253	"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 , SEGUN FACTURA TBCL- 22322282 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 "
12565	28/12/2022 13:09		COMCEL S A	7977	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.193.857,54	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	"PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DE 2023. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5643207500 - REFERENCIA 8221383845 " "

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12566	28/12/2022 13:10		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	7974	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.150.346.205,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 201288765 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
12587	28/12/2022 16:27	424	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S	6598	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 656.793.100,25	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3.
12588	28/12/2022 16:28	421	CONSORCIO INTERURBANAS	6598	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 589.431.258,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1.
12589	28/12/2022 16:29	422	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	6598	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 615.191.795,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2.
12590	28/12/2022 16:30	423	HCR INGENIEROS S.A.S.	6598	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 176.399.650,00	2.3.2.02.02.009.2102013.91 123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4.
12676	29/12/2022 10:49	428	CONSORCIO SALONES BUCARAMANGA LC 1248	6606	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 129.903.202,30	2.3.2.02.02.005.4502003.53 129.573 - SALON COMUNAL ADECUADO 573	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONDORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12678	29/12/2022 10:49	427	SITELSA SAS	6725	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 850.141.324,35	2.3.2.02.02.005.1709078.53 122.573 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12701	29/12/2022 11:40	167	CONSTRUCCIONES DISEÑOS ESTUDIOS S.A.	7984	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 366.824.761,23	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.213 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 213	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 167 DEL 13 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12712	29/12/2022 15:05	429	JESAK SAS	6584	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 627.457.250,00	2.3.2.02.02.005.2402127.54 211.289 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDN DE LA RED URBANA REHABILITADO 289	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
12713	29/12/2022 16:05	430	JESAK SAS	6918	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 57.649.526,00	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.501 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12714	30/12/2022 07:07	433	CONSORCIO GRAVIRU 2022	6765	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.176.592.900,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53 211.573 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 573	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3
12733	30/12/2022 11:54	432	CONSORCIO EDIFICACIONES	7008	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 203.550.545,00	2.3.2.02.02.005.3301038.53 129.501 - CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS TEATROS ADECUADOS 501	CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
12735	30/12/2022 13:19	446	CONSORCIO INTERSANTANDER	6577	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 288.637.559,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53 270.501 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. LOTE 1
12736	30/12/2022 13:20	447	CONSORCIO INTERVIAS RS	6577	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 288.637.559,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53 270.501 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. LOTE 3

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
12737	30/12/2022 13:51	449	CONSORCIO INTER-ANDINO	6646	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 213.827.546,00	2.3.2.02.02.005.4104001.53 129.501 - CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 501	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12738	30/12/2022 13:53	448	CONSORCIO UNIDO	6645	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.775.619.955,00	2.3.2.02.02.005.4104001.53 129.501 - CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 501	CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12739	30/12/2022 14:23	445	CONSORCIO PLAZAS JGV 2022	6724	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.212.966.188,00	2.3.2.02.02.005.1709078.53 122.573 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2.
12740	30/12/2022 14:24	426	CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC	6724	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.496.892.387,32	2.3.2.02.02.005.1709078.53 122.573 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1
12741	30/12/2022 15:24	444	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	6766	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 354.987.874,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53 211.573 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 573	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1
12742	30/12/2022 16:41	452	CONSORCIO PROVENZA	6664	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.049.115.418,76	2.3.2.02.02.005.2402114.53 211.573 - VIA URBANA MEJORADA 573	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RELACION PERSONAL (01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	1812	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY VANESSA	PRADILLA LEAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, ARTICULAR ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, QUE ESTA ADELANTE	\$ 216.666,67	21/12/2022	28/12/2022	28/12/2022
2022	1850	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS RAUL	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA ARTICULAR LOS EQUIPOS DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.216.666,67	02/12/2022	22/12/2022	28/12/2022
2022	1950	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ANTONIO	MOJICA FIGUEROA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO, COMO APOYO TECNICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO QUE SE LE ASIGNEN	\$ 1.083.333,33	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	1954	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YENCY JULIANA	ARDILA DIAZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ORGANIZAR Y ARCHIVAR DE ACUERDO A LA NORMA TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES; Y POSTCONTRACTUALES QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 466.666,68	19/12/2022	22/12/2022	28/12/2022
2022	1955	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JONNATHAN	MENDOZA CRISTIAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA RECEPCION, CLASIFICACION Y EMBALAJE DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE INGRESAN A LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 583.333,33	19/12/2022	22/12/2022	28/12/2022
2022	1957	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ ANGELA	CABALLER O CORZO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL REGISTRO ACTUALIZADO DE CONTRIBUYENTES QUE COMPRENDE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ATENCIÓN GENERAL AL CONTRIBUYENTE RESPONSABLE	\$ 700.000,00	19/12/2022	22/12/2022	28/12/2022
2022	1990	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HERMAN	MANTILLA SEPULVED A	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO MEDIANTE LA CONDUCCIÓN DE LA CAMIONETA DESTINADA A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 333.333,33	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	2005	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DAVID	PABON ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO, EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	\$ 433.333,33	19/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2038	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBERT LEANDRO	RODRIGUE Z MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 500.000,00	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2044	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HUGO GIOVANNI	NAVARRO MOYA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO	\$ 666.666,67	19/12/2022	21/12/2022	28/12/2022
2022	2109	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN OSWALDO	BALLESTE ROS PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 1.000.000,00	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2137	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TEODOMIRO ENRIQUE	VERA DAVILA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 366.666,67	19/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2149	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL	HERRERA DIAZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, QUE ESTA ADELANTE.	\$ 600.000,00	19/12/2022	25/12/2022	28/12/2022
2022	2153	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS ANTONIO	CARRION RUBIANO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 293.333,33	19/12/2022	25/12/2022	28/12/2022
2022	2154	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FABIAN	PATIÑO TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 293.333,33	19/12/2022	25/12/2022	28/12/2022
2022	2186	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ISAIAS	SUAREZ DELGADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 660.000,00	19/12/2022	20/12/2022	28/12/2022
2022	2190	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR	GOMEZ CASTAÑED A	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 586.666,67	19/12/2022	21/12/2022	28/12/2022

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	2196	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANNA ALEJANDRA	ALTUVE VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO (A) EN DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ASI COMO EN EL REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO, DE LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 300.000,00	21/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2259	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM	CALDERON GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.800.000,00	15/12/2022	17/12/2022	28/12/2022
2022	2302	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ARMANDO	CRUZ ANQUIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 380.000,00	15/12/2022	19/12/2022	24/12/2022
2022	2304	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GILBERTO	NEIRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 340.000,00	15/12/2022	19/12/2022	24/12/2022
2022	2307	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	ORTEGA VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 916.666,67	21/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2333	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHN FERNANDO	LARROTA PEÑALOZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD	\$ 900.000,00	20/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
2022	2334	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN AUGUSTO	MONTERO PARRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL	\$ 833.333,33	19/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	2337	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERIKA MILENA	PINTO QUIROGA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 333.333,33	15/12/2022	20/12/2022	24/12/2022

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	2339	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIO CESAR	MORENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 283.333,33	15/12/2022	20/12/2022	24/12/2022
2022	2646	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEONOR CRISTINA	GOMEZ GONZALES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO; ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 583.333,33	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	3031	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN YANDER	VALDERRAMA PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO, PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTÁ ADELANTE	\$ 750.000,00	21/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	3175	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYRA ALEJANDRA	SALCEDO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL	\$ 900.000,00	19/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
2022	3214	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGARDO	RODRIGUEZ HERRERA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO APOYANDO LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA A CARGO EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN QUE SE REQUIERA ENTREGAR A LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL	\$ 500.000,00	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	3375	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA LUCIA	HIGUERA PINO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 916.666,67	21/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	3438	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GLORIA INES	REY DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO, PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTÁ ADELANTE	\$ 916.666,67	20/12/2022	24/12/2022	28/12/2022

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	3483	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON HAIVER	ESTEBAN AYALA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 366.666,67	19/12/2022	24/12/2022	28/12/2022
2022	3522	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GENNY PAOLA	ARAQUE VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 12.750.000,00	03/10/2022	05/10/2022	23/12/2022
2022	3531	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE EDUARDO	GUTIERREZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 10.800.000,00	07/10/2022	10/10/2022	21/12/2022
2022	3535	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	EN EJECUC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGARDO	ARDILA GRANDAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 9.600.000,00	07/10/2022	10/10/2022	21/12/2022
2022	3540	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ARTURO	ROMERO BASTO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 5.400.000,00	07/10/2022	10/10/2022	23/12/2022
2022	3543	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL ALEJANDRO	MARTINEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 7.500.000,00	10/10/2022	11/10/2022	23/12/2022
2022	3544	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO JULIAN	ALMEYDA MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.250.000,00	10/10/2022	11/10/2022	23/12/2022
2022	3545	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EMERSON MIGUEL	VELANDIA HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 5.000.000,00	10/10/2022	11/10/2022	23/12/2022
2022	3552	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ENRIQUE	GOMEZ VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE	\$ 11.250.000,00	11/10/2022	12/10/2022	26/12/2022

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	3564	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS JAVIER	RODRIGUEZ JEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 10.350.000,00	14/10/2022	18/10/2022	23/12/2022
2022	3566	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHARO LIZET	MANTILLA JARAMILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 4.200.000,00	14/10/2022	18/10/2022	23/12/2022
2022	3577	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	ROJAS TAVERA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.500.000,00	21/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
2022	3578	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ANDRES	MARTINEZ VILLADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 8.050.000,00	21/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
2022	3583	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FRANCISCO	ESCOBAR GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PUBLICO	\$ 11.666.666,67	21/10/2022	24/10/2022	28/12/2022
2022	3585	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA PATRICIA	BERMUDEZ TUTAZAUR A	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ABOGADA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 6.600.000,00	21/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
2022	3611	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ALBERTO	PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 8.550.000,00	31/10/2022	01/11/2022	23/12/2022
2022	3612	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER OSWALDO	LEAL PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 8.550.000,00	31/10/2022	01/11/2022	23/12/2022
2022	3621	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELSON	TOBO DAVILA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO; ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.	\$ 7.800.000,00	03/11/2022	04/11/2022	23/12/2022

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	3706	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WEYMAR STICK	OBANDO VARGAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 2.096.666,66	29/11/2022	01/12/2022	23/12/2022
2022	3707	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIBARDO	RUEDA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 2.466.666,66	29/11/2022	01/12/2022	23/12/2022
2022	3708	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELIBERTO	SANDOVAL VERGEL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.836.666,66	29/11/2022	30/11/2022	23/12/2022
2022	3709	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICENTE	VARGAS LOZANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 4.933.333,33	29/11/2022	30/11/2022	23/12/2022
2022	3723	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN BAUTISTA	MEDINA MONTOYA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.	\$ 1.226.666,67	05/12/2022	07/12/2022	28/12/2022
